資料1-1

汚染水対策スケジュール（1/2）

東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野
2025/5/29現在

分野名	括り	廃炉中長期実行プラン2025目標工程	対象設備・作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		4月 6	13	20	27	5月 4	11	18	25	6月 上	中	下	7月 上	中	下	8月 上	中	下	9月 上	中	下	10月 上	中	下	11月以降	備　考
汚染水対策分野		●建屋滞留水の処理	建屋内滞留水	【1～4号機　滞留水移送装置】 （実績） ・1～4号機滞留水移送装置運転 （予定） ・1～4号機滞留水移送装置運転	現場作業	1～4号機滞留水移送装置設置　運転																						（継続運転）	プロセス主建屋・高温焼却炉建屋滞留水移送装置の設置に係る実施計画変更（2025年2月12日申請）
				【α核種除去設備検討】	設計・工事					詳細設計・工事																		（2027年度 工事完了予定）	α核種除去設備の設置に係る実施計画変更（2024年6月27日申請）
				【1～4号機　T/B床面スラッジ等の回収方法検討】	設計・検討					設計検討																			
				【滞留水一時貯留設備~~設計~~】	設計・工事					詳細設計・工事																		（2026年度 工事完了予定）	建屋滞留水一時貯留設備の設置に係る実施計画変更（2025年1月21日認可）
				【プロセス主建屋・高温焼却建屋ゼオライト土嚢の検討】	容器封入集積作業					容器封入作業　詳細設計・工事																		（2025年度 容器封入作業着手予定）	容器封入作業 実規模モックアップ（2023年9月～） 容器封入作業　実施計画変更（2023年3月31日申請）
										集積作業　詳細設計・工事																		（2025年3月 集積作業着手）	~~集積作業 実規模モックアップ（2022年10月～）~~ 集積作業開始（2025年3月26日）
			浄化設備	【既設多核種除去設備】 【高性能多核種除去設備】 【増設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業					処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）																		（継続運転）	処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転 または処理停止 増設多核種除去設備 前処理設備改造に係る実施計画変更申請（2022年4月28日認可） 使用前検査終了証受領　2024年5月31日 濃縮廃液の試験的先行処理実施中 前処理設備改造後のHOT試験を実施中
				【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業	処理運転																						（継続運転）	
				【地下水バイパス設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場作業	運転																						（継続運転）	揚水井B点検停止（2025年~~6月7月初~~復旧予定） 3月下旬よりスクリーン製作開始（製作期間が計画より1ヶ月程度要する）
				【セシウム吸着装置】 【第二セシウム吸着装置】 【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業	処理運転																						（継続運転）	
				【RO-3】 【建屋内RO 循環設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場作業	運転																						（継続運転）	
			陸側遮水壁	（実績） ・維持管理運転 （予定） ・維持管理運転	現場作業	維持管理運転																						（継続運転）	
			フェーシング（陸側遮水壁内エリア）	【凍土壁内フェーシング（全675m^2）】 ・2号機建屋西側	現場作業					2号機建屋																			
			1-4号機建屋周辺トレンチ調査	（実績・予定） ・5箇所の調査実施（2025年度） ・2025年5月　調査開始	現場作業																								2024年4月24日調査開始 2024年12月19日調査完了（1箇所は、対象トレンチが発見できなかったため、2025年度に再調査予定）
			建屋間ギャップ護部止水対策	゛（実績・予定） ・3号機：6箇所(2025年度）゛・ ・	現場作業																						【3号機】 2026年3月：完了予定	2024年7月16日準備工事開始 （2025年度：6箇所/6箇所完了予定）

東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野
2025/5/29現在

汚染水対策スケジュール（2/2）

分野名	括り	廃炉中長期実行プラン2025目標工程	対象設備・作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		4月				5月					6月			7月			8月			9月			10月			11月以降	備　考
						6	13	20	27		4	11	18	25	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
汚染水対策分野		●タンク関連	H４エリアＮｏ．５タンクからの漏えい対策	（実績・予定） ・汚染の拡散状況把握	現場作業	モニタリング																							（継続実施）	
			タンク解体	（予定） ・Ｅエリアフランジタンク解体工事 ：49基解体予定（2025年12月頃） ・Ｅエリアフランジタンク（Ｄ1） 内の残水回収（スラッジ含む） （実績）解体基数　48基／49基	現場作業	Ｅエリアフランジタンク解体工事 Ｅエリアフランジタンク（Ｄ1）内の残水回収										（2025年8月回収完了予定） （これまでのスラッジ回収実績および今後の作業予定から作業工程を見直し回収完了時期を4月から6月に変更）											（2025年度タンク解体完了予定*） *Ｄ1タンク以外は解体完了済み				2018年9月10日　Ｅエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について （実施計画変更認可） 2024年7月17日：Ｄ2タンク解体完了 2025年1月9日：ＥエリアD1タンク内のスラッジ回収作業開始 2025年3月21日：タンク内でのスラッジ回収作業開始 2026年2月：Ｅエリアフランジタンク解体完了予定
				（予定） ・Ｊ8Ｊ9タンク解体工事	現場作業	タンク解体作業 （4/10）4基目解体完了		（4/21）5基目解体完了				（5/14）6基目解体完了																			2024年8月1日：実施計画変更申請実施 2025年1月22日：補正申請実施 2025年1月27日からタンク付属品の撤去開始 2025年2月3日：実施計画認可 2025年2月14日：解体作業開始
				（予定） ・横置きタンク解体工事	現場作業	2024年11月6日　除染解体試験開始																									横置きタンクの解体に係る実施計画変更（2024年5月17日認可） 2024年10月10日未使用タンクの搬入実施 2024年11月：未使用タンクから除染解体試験開始 10基/28基　未使用タンク解体完了 2月3日に発生した火災トラブルにより現場作業中断中。（再開時期未定） 6月　火災発生原因と対策の方向性について公表予定。
		●自然災害対策	津波対策	○サブドレン集水設備高台機能移転 （実績・予定）ろ過水タンク西側整備工事実施（完了） 地盤改良（完了） 集水設備設置（１０基）（完了） 移送設備設置	現場作業	ろ過水タンク西側整備（ろ過水配管リルート工事完了），地盤改良工事（地盤改良完了），集水設備設置（１０基）5月～着手																（2025年上期工事完了予定）									2023年10月20日　サブドレン集水設備及び地下水ドレン設備の津波対策に伴うTP.33.5m盤への移設について（実施計画変更申請）→　2024年11月1日　変更申請認可 2025年3月１７日～１９日　使用前検査一部受検完了（高台集水タンク）

資料1-2

水処理設備の運転状況，運転計画

（2025年5月23日～2025年6月19日）

2025年6月5日
東京電力ホールディングス株式会社

既設多核種除去設備

	23(金)	24(土)	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	30(金)	31(土)	1(日)	2(月)	3(火)	4(水)	5(木)	6(金)	7(土)	8(日)	9(月)	10(火)	11(水)	12(木)	13(金)	14(土)	15(日)	16(月)	17(火)	18(水)	19(木)
A	点検停止																											
B	点検停止																											
C	点検停止																											

増設多核種除去設備

	23(金)	24(土)	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	30(金)	31(土)	1(日)	2(月)	3(火)	4(水)	5(木)	6(金)	7(土)	8(日)	9(月)	10(火)	11(水)	12(木)	13(金)	14(土)	15(日)	16(月)	17(火)	18(水)	19(木)
A		計画停止									点検停止				計画停止										点検停止			
B	点検停止																											
C	点検停止	計画停止																										

高性能多核種除去設備

	23(金)	24(土)	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	30(金)	31(土)	1(日)	2(月)	3(火)	4(水)	5(木)	6(金)	7(土)	8(日)	9(月)	10(火)	11(水)	12(木)	13(金)	14(土)	15(日)	16(月)	17(火)	18(水)	19(木)
A	計画停止																											

セシウム吸着装置(KURION)，第二セシウム吸着装置(SARRY)，第三セシウム吸着装置（SARRY2）

	23(金)	24(土)	25(日)	26(月)	27(火)	28(水)	29(木)	30(金)	31(土)	1(日)	2(月)	3(火)	4(水)	5(木)	6(金)	7(土)	8(日)	9(月)	10(火)	11(水)	12(木)	13(金)	14(土)	15(日)	16(月)	17(火)	18(水)	19(木)
SARRY	点検停止																											
SARRY2														計画停止														
KURION	計画停止																											

※ 現場状況を踏まえて運転するため，計画を変更する場合があります。

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社 ©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

資料2

各エリア別タンク一覧

1～4号機用汚染水貯蔵タンク

タンク基数、水位、貯蔵量、実容量集約日　2025年5月22日

堰エリア	基数	1基あたり容量(公称)〔m3〕	タンク型	貯蔵水	H水位(mm)	H容量/基=実容量/基(m3)	0%以下貯蔵量(m3)	0%以上貯蔵量(m3)	実容量(m3)	水位管理				放射能濃度(Bq/cc)							測定時期	概略使用開始時期
										水位(%)(最大値)	スロッシング考慮(%)	HANN(%)	HHANN(%)	Cs-134	Cs-137	Co-60	Mn-54	Sb-125	Ru-106	Sr-90		
B	10	1330	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設)	13674	1297	約20	12862	12975	97.0	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H30.12
	27	700	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(増設)	13272	682	約30	18332	18413	97.4	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H30.10
B南	7	1330	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(増設)	13674	1297	約10	9082	9082	97.7	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H30.10
D	19	1000	鋼製円筒型タンク(溶接)	Sr処理水等(C)	12936	1004	約210	9169	19078	52.6	95	88.7	90	1.4E+00	5.4E+00	8.2E-02	<1.9E-02	3.1E+00	<3.5E-01	4.4E+01	H27.3	H26.8
	12	1000	鋼製円筒型タンク(溶接)	RO処理水(淡水)	12936	1004	約140	6379	12049	84.1	95	88.7	90	タンクの分析は未実施								R1.11
E	1	1000	鋼製円筒型タンク(フランジ接合)	濃縮塩水	9880	1054	約100		1089	2.0	95	96.3	98.9	2.7E+00	8.6E+00	3.0E+00	1.4E+00	3.7E+01	1.3E+01	3.8E+04	H27.2	H24.8
G1	66	1356	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設)	10796	1322	約160	87118	87244	97.6	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								R1.11
G1南	8	1160	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(増設)	11920	1130	約20	9042	9042	97.6	99	97.6	98.9	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H30.4
	15	1330	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設)	13664	1296	約30	19391	19442	97.6	99	97.6	98.9	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H30.4
G3東	24	1000	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設)	9400	1069	約50	25600	25652	97.5	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H25.4
G3西	39	1000	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備 ※1, 2処理済水(既設・増設)	9400	1012	約90	35472	39466	91.7	100	92.5	93.8	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H25.10
G3北	6	1000	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備 ※2処理済水(既設)	9400	1069	約10	6393	6413	97.4	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								R2.3
G4北	6	1356	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設)	10794	1322	約10	3966	7931	97.7	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								R4.7
G4南	26	1356	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設)	10796	1322	約60	14166	34369	97.5	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								R2.3
G5	17	1356	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設)	10796	1322	約40	22423	22472	97.5	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								R5.4
G6	38	1330	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設)	13674	1297	約70	49015	49303	97.5	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H31.4
G7	10	700	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設)	13415	690	約10	6876	6898	97.4	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H26.12
H1	63	1220	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設・高性能)	10539	1190	約140	61948	74969	97.6	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H27.3
H1東	24	1220	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設)	10539	1190	約50	28480	28560	97.5	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H28.4
H2	44	2400	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設)	11330	2331	約180	102071	102569	97.5	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H28.10
H3	10	1356	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設)	10796	1322	約20	13205	13219	97.6	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H30.11
H4北	35	1200	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設)	10366	1169	約80	40720	40931	97.4	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H29.7
H4南	13	1060	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(増設)	13190	1034	約20	13410	13424	97.5	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H29.12
	38	1140	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設)	13010	1112	約70	42126	42249	97.5	100	97.7	98.9	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H30.4
H5	32	1200	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(増設)	10368	1169	約70	37431	37423	97.9	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H30.9
H6(Ⅰ)	11	1200	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設)	10368	1169	約20	12858	12864	97.7	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H30.8
H6(Ⅱ)	24	1356	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設)	10796	1322	約60	31602	31725	97.5	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H30.12
H8北	2	1000	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備 ※2処理済水	9477	1069	約0	2116	2138	96.7	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								R5.6
	3	1000	鋼製円筒型タンク(溶接)	Sr処理水等(C)	9477	1069	約10	1214	3207	37.0	100	97.7	99	1.3E-01	5.7E-01	2.7E-01	3.6E-02	6.4E+00	-	2.2E+02	H27.3	H25.4
H8南	9	1000	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備 ※2処理済水	9477	1069	約20	9565	9620	97.4	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								R4.7
	2	1000	鋼製円筒型タンク(溶接)	Sr処理水等(R)	9477	1069	約0	19	2138	1.7	100	97.7	99	<5.1E-02	1.2E-01	2.1E-01	2.0E-02	3.8E+00	2.9E-01	9.1E+01	H27.3	H25.4
J1	98	1000	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備 ※1, 2処理済水(既設・増設)	9477	1069	約220	98936	104746	97.6	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H26.1
	2	1000	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(高性能検証試験装置)	9477	1069	約0	1045	2138	95.5	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								
J2	42	2400	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設)	12151	2500	約170	103626	104999	96.6	99	97.2	98.5	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H26.9
J3	22	2400	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設・高性能)	12101	2490	約90	54375	54773	96.4	99	96.8	98.1	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H26.10
J4	30	2900	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設・高性能)	12604	2829	約130	84786	84882	97.9	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H26.10
	5	1160	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設)	11926	1131	約10	2699	5657	77.7	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H28.2
J5	35	1235	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設)	12001	1137	約70	39668	39789	92.0	94	92.2	93.5	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H26.8
J6	38	1200	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設)	10366	1169	約90	44406	44431	97.7	99	97.6	98.9	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H26.12
J7	42	1200	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設・高性能)	10366	1169	約100	48961	49108	97.5	99	97.6	98.9	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H27.9
J8	9	700	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設)	10747	682	約10	6128	6138	98.0	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H28.4
J9	0	700	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設)	10747	682	約0	0	0	0.0	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H28.11
K1北	12	1200	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(高性能)	10366	1169	約30	14017	14031	97.5	99	97.6	98.9	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H27.1
K1南	10	1160	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備 ※2処理済水(既設・増設)	11926	1131	約20	11295	11314	97.6	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								R3.7
K2	28	1057	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備 ※2処理済水(既設)	12780	1032	約40	28782	28888	97.6	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H28.7
K3	12	700	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(増設)	13280	683	約10	336	8195	4.0	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H28.4
K4	35	1000	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(既設・増設)	12410	972	約50	14721	34024	89.7	100	97.7	99	添付「タンク群毎の放射能濃度実測値」参照 ※3								H28.8
多核種除去設備	4	1100	鋼製円筒型タンク(フランジ接合)	多核種除去設備処理済水(既設)	9750	1103	約0	5	4411	0.2	100	97.5	99	— ※4								H25.3
高性能多核種除去設備	3	1235	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(高性能)	12630	1199	約0	1343	3598	76.6	100	98.4	99.6									H26.10
増設多核種除去設備	3	1235	鋼製円筒型タンク(溶接)	多核種除去設備処理済水(増設)	12630	1199	約0	1364	3598	49.8	100	98.4	99.6									H26.9

D	10	1000	鋼製円筒型タンク(溶接)	濃縮廃液	12936	1002	約120	9118	10041	80.3	95	88.7	90	タンクの分析は未実施								H26.8
H2	3	100	鋼製横置きタンク(溶接)	濃縮廃液	—	—	—	263	281	89.1	—	93	96.5	タンクの分析は未実施								H23.8

赤字はアウトオブサービス済の基数

※実容量には、タンク底部から水位計0%の水量(DS分)を含まない。

下線部は今回の変更箇所

※1　濃縮塩水/Sr処理水等を貯留した実績あり(G3西及びJ1の一部)

※2　Sr処理水等を貯蔵した実績のあるタンクを再利用したものを含む　再利用した基数　G3西:30、G3北:6、H8北:2、H8南:9、J1:8、K1南:10、K2:26

※3　多核種除去設備処理済水(ALPS処理水等)の放射能濃度について、当社「処理水ポータルサイト」に掲載のデータを参照(3ヶ月毎にデータ更新)
処理水ポータルサイトのURLは以下のとおりです。4ページ中段にある『貯蔵タンクエリア毎の放射能濃度を詳しくみる』をクリックすると、分析結果が表示されます。
https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/watertreatment/

※4　多核種除去設備、高性能多核種除去設備、増設多核種除去設備のサンプルタンクは貯留用タンクではなく水の入れ替わりがあることから、分析対象外とする。

無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社　©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

汚染水等構内溜まり水の状況（2025.5.22時点）

リスク総点検より抜粋・改訂

No.	箇所	対象	場所	量(m^3)	放射性物質濃度[Bq/L]		備考
1-2	2号機R／B	2号機R／B	建屋エリアに存在する建屋	降雨量により変動	【上屋】 Cs-134： Cs-137： 全β： Sr-90： H-3：	 200～340 650～1100 920～1900 10～20 ND（<100） （2015.1.16）	
2	5,6号機貯留タンク（フランジタンク）	・5,6号機貯留タンク（フランジタンク）	6号機北側	0 （2024.3.21時点）	Cs-134： Cs-137：	2.9E0 9.7E1 （2022.7.12）	5・6号建屋滞留水・RO濃縮水を貯留 2024年3月より運用停止
3	5,6号機貯留タンク(溶接タンク)	・5,6号機貯留タンク(溶接タンク)	6号機北側	約7,100 （2025.3.24時点）	Cs-134： Cs-137：	7.7E0 4.3E1 （2016.10.3）	5・6号建屋滞留水・RO濃縮水を貯留
4-2	吸着塔一時保管施設	水処理二次廃棄物 （SARRY、KURION、ALPS処理カラム、モバイル式処理装置）	吸着塔一時保管施設（第一施設、第四施設）	1程度（1基あたり）	Cs-137： Sr-90：	2.0E3～1.6E7 5.3E3～4.3E7 （2017.2～2017.3）	
7	濃縮水タンク （蒸発濃縮装置濃廃水）	蒸発濃縮装置濃縮水用ノッチタンク （スラリー/濃縮水）	タンクエリア （Cエリア）	約65※1 （2019.2.1時点）	【蒸発濃縮装置濃廃水】 Cs-134： Cs-137： 全β：	 1.7E4 2.5E4 4.7E8 （2011.12.20）	蒸発濃縮装置濃縮水を貯留 ※1：全5タンクの水量を実測して算出
9	5，6号機逆洗弁ピット及び吐出弁ピット	・6号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピット	6号機スクリーン近傍	約850	Cs-134： Cs-137：	ND 1.8E0 （2022.2.1）	
		・5号機逆洗弁ピット	5号タービン建屋海側	0 （2024.12.3時点）	Cs-134： Cs-137：	ND 1.1E1 （2023.9.12）	5号機復水器水室の水抜きに合わせ、5号機逆洗弁ピットの水抜きを実施。
		・6号機逆洗弁ピット	6号タービン建屋海側	約1,500	Cs-134： Cs-137：	1.5E0 1.1E1 （2016.10.3）	
10	1～4号機T／B屋根	・1号機T／B	建屋エリアに存在する建屋	降雨量により変動	【1号機T/B上屋】 Cs-134： Cs-137： 全β：	9.1E0 6.4E2 （2023.11.29） 4.4E1 （2020.7.29）	**ND** **2.4E2** **（2025.4.17）** －
		・2号機T／B	建屋エリアに存在する建屋	降雨量により変動	【2号機T/B上屋】 Cs-134： Cs-137： 全β：	ND 2.5E2 （2023.11.29） 8.9E0 （2020.7.29）	**ND** **3.5E2** **（2025.4.17）** －
15	地下貯水槽	地下貯水槽No．1	タンクエリア	－	【RO濃縮水貯水実績あり】 全β：1.3E6 （2018.9.12） （参考：漏えい検知孔水） 全β： H-3：	 2.7E4 （2025.4.8） ND （2019.9.4）	水位計の計測限界水深未満（一部残水あり） （2018.9.26時点）
16	地下貯水槽	地下貯水槽No．2	タンクエリア	－	【RO濃縮水貯水実績あり】 全β：3.1E6 （2018.9.12） （参考：漏えい検知孔水） 全β： H-3：	 7.3E4 （2025.4.9） ND （2019.9.4）	水位計の計測限界水深未満（一部残水あり） （2018.9.26時点）
17	地下貯水槽	地下貯水槽No．3	タンクエリア	－	【RO濃縮水貯水実績あり】 全β：3.2E6 （2018.9.11） （参考：漏えい検知孔水） 全β： H-3：	 4.1E4 （2025.4.11） ND （2019.9.5）	水位計の計測限界水深未満（一部残水あり） （2018.9.26時点）
18	地下貯水槽	地下貯水槽No．4	タンクエリア	－	【タンク堰内雨水貯水実績あり】 全β：2.8E4 （2018.9.12）		水位計の計測限界水深未満（一部残水あり） （2018.9.26時点）
20	地下貯水槽	地下貯水槽No．6	タンクエリア	－	【RO濃縮水貯水実績あり】 全β：7.8E6 （2018.9.11） （参考：漏えい検知孔水） 全β：4.5E1 （2019.9.5） H-3：ND （2019.9.5）		水位計の計測限界水深未満（一部残水あり） （2018.9.26時点）
21	地下貯水槽	地下貯水槽No．7	タンクエリア	－	【タンク堰内雨水貯水実績あり】 全β：1.5E2 （2018.9.12）		水位計の計測限界水深未満（一部残水あり） （2018.9.26時点）

汚染水等構内溜まり水の状況（2025.5.22時点）

リスク総点検より抜粋・改訂

No.	箇所	対象	場所	量(m^3)	放射性物質濃度[Bq/L]		備考
22	1-4号建屋接続トレンチ	・1号機コントロールケーブルダクト※2 ・集中環境施設廃棄物系共通配管ダクト（2号機廃棄物系共通配管ダクト） ・1号機薬品タンク連絡ダクト　等	1～4号機周辺	約2～140 (2024.3)	Cs-134： Cs-137： 全β： H-3：	ND～1.2E2 6.3E1～5.1E3 6.6E1～6.7E3 ND～2.8E2 (2024.3)	量及び放射性物質濃度の内訳は添付資料(1)「2023年度トレンチ等内溜まり水調査結果一覧」を参照 ※2：調査・対策を目的に雨水処理設備へ溜まり水を移送し処理後散水を予定・実施

汚染水等構内溜まり水の状況（2025.5.22時点）

リスク総点検より抜粋・改訂

No.	箇所	対象	場所	量(m^3)	放射性物質濃度[Bq/L]			備考
23	2～4号機DG連絡ダクト	・2～4号機DG連絡ダクト	2～4号機山側	約1,600 (2024.3)	Cs-134: Cs-137: 全β: H-3:	ND 7.0E1 9.6E1 ND (2024.3)		量及び放射性物質濃度の内訳は添付資料(1)「2023年度トレンチ等内溜まり水調査結果一覧」を参照
24-1	1号機海水配管トレンチ	・1号機海水配管トレンチ	1号機タービン建屋海側	約380 (2024.3)	Cs-134: Cs-137: 全β:	ND 4.1E1 6.8E1 (2024.3)		量及び放射性物質濃度の内訳は添付資料(1)「2023年度トレンチ等内溜まり水調査結果一覧」を参照
26	3号機起動用変圧器ケーブルダクト	・3号機起動用変圧器ケーブルダクト	3号機山側	約890 (2024.3)	Cs-134: Cs-137: 全β: H-3:	4.8E1 4.0E2 4.4E2 ND (2017.10)		量及び放射性物質濃度の内訳は添付資料(1)「2023年度トレンチ等内溜まり水調査結果一覧」を参照
28	1-4号建屋未接続トレンチ	・2号機変圧器防災用トレンチ※2 ・消火配管トレンチ（3号機東側） ・消火配管トレンチ（4号機東側）※2 ・1号機主変圧器ケーブルダクト※2 ・1号機廃液サージタンク連絡ダクト ・1号機オフガス配管ダクト ・1号機起動用変圧器ケーブルダクト※2 ・No4，5軽油配管トレンチ※2 ・4号機海水配管（SW）埋設ダクト※2等	1-4号機周辺	約6～830 (2022.1)	Cs-134: Cs-137: 全β: H-3:	ND～1.0E1 1.1E1～2.5E2 1.9E1～2.5E2 ND (2022.1)		量及び放射性物質濃度の内訳は添付資料(2)「2021年度トレンチ等内溜まり水調査結果一覧」を参照 ※2：調査・対策を目的に雨水処理設備へ溜まり水を移送し処理後散水を予定・実施
29	1～4号機サブドレンピット No.15,16(未復旧ピット)	・サブドレンピットNo.15,16	1～4号機周辺「未復旧」	約20	【No.16】 Cs-134: Cs-137: 全β: H-3:	5.3E3 4.3E5 4.9E5 1.2E4 (2025.1.11)		
30	その他1～4号機サブドレン（ディープウェル含む）（未復旧ピット）	・1号機～4号機サブドレン	1～4号機周辺「未復旧」	約15/ピット	【No.47,48】 Cs-134：ND～3.9E1 Cs-137：4.8E1～9.6E1 全β：7.9E1～2.8E2 H-3：ND (2014.11.10)			
32	1号機放水路（出口を閉塞済）	・1号機放水路（出口を閉塞済）	1～4号タービン建屋海側	約5,220 (2022.1)	【放水路上流側立坑】 Cs-134: Cs-137: 全β : H-3 :	3.6E1 2.9E3 3.8E3 ND (2025.4.14)	**9.5E1** **6.8E3** **7.8E3** **ND** **(2025.5.19)**	
33	2号機放水路（出口を閉塞済）	・2号機放水路（出口を閉塞済）	2－4号機タービン建屋海側	約5,350 (2022.1)	【放水路上流側立坑】 Cs-134: Cs-137: 全β : H-3 :	1.4E1 1.1E3 1.5E3 ND (2025.4.14)	**9.4E0** **7.4E2** **1.2E3** **ND** **(2025.5.19)**	
34	3号機放水路（出口を閉塞済）	・3号機放水路（出口を閉塞済）	3－4号機タービン建屋海側	約3,360 (2022.1)	Cs-134: Cs-137: 全β : H-3 :	ND 3.4E2 1.3E3 ND (2025.3.12)	**ND** **3.9E2** **1.2E3** **ND** **(2025.4.9)**	
35	キャスク保管建屋	・キャスク保管建屋	物揚場　西側	約4,500	Cs-134: Cs-137: I-131: Co-60: 全γ放射能: 全β放射能:	7.2E0 2.3E1 ND ND 3.1E1 － (2014.5.23)		
36	5号CSTタンク（溶接タンク）	・5号CSTタンク（溶接タンク）	屋外（建屋エリア）	約1230 (2025.3.12)	Cs-134: Cs-137: Co-60:	ND ND ND (2025.3.12)	**ND** **ND** **ND** **(2025.4.14)**	プラント保有水を貯留
37	6号CSTタンク（溶接タンク）	・6号CSTタンク（溶接タンク）	屋外（建屋エリア）	約1680 (2025.3.12)	Cs-134: Cs-137: Co-60:	ND ND ND (2025.3.17)	**ND** **ND** **ND** **(2025.4.18)**	プラント保有水を貯留
38	5/6号他　トレンチ	・5号機海水配管トレンチ ・5・6号機ストームドレン配管トレンチ ・5号機重油配管トレンチ（東側） ・5号機放射性流体用配管ダクト ・5号機主変圧器ケーブルダクト　等	5～6号機周辺	約1～1,870 (2022.1)	Cs-134: Cs-137:	ND～1.7E0 ND～5.1E1 (2022.1)		量及び放射性物質濃度の内訳は添付資料(2)「2021年度トレンチ等内溜まり水調査結果一覧」を参照
40	キャスク保管建屋サブドレン	・キャスク保管建屋サブドレン	物揚場　西側	約15/ピット	Cs-134：1.0E+1 Cs-137：1.4E+1 Co-60：<6.0E-01 全γ放射能：2.4E+1 (2012.1.18)			
42	集中ラド周りサブドレン	・集中ラド周りサブドレン	主プロセス建屋等各建屋周辺	約15/ピット	Cs-134: Cs-137:	ND ND～2.9E1 (2025.4.16)	**ND** **ND～1.5E1** **(2025.5.21)**	
44	純水タンクNo.1	・純水タンク	屋外（建屋エリア）	約850	Cs-134: Cs-137: 全β: H-3:	2.1 7.2 12.2 ND (2015.5.29)		震災後、坂下ダム補給水を貯留

汚染水等構内溜まり水の状況（2025.5.22時点）

リスク総点検より抜粋・改訂

No.	箇所	対象	場所	量(m^3)	放射性物質濃度[Bq/L]			備考
45	5/6号機建屋滞留水	・5/6号機建屋滞留水	5～6号機	約3,900 （2025.3.24時点）	【5号機】 Cs-134： Cs-137： 全β： H-3：	ND 8.4E-1 ND ND （2025.3.14）	**ND** **ND** **ND** **ND** **（2025.4.15）**	
					【6号機】 Cs-134： Cs-137： 全β： H-3：	ND 4.8E0 ND 1.2E2 （2025.3.14）	**ND** **4.4E0** **ND** **ND** **（2025.4.16）**	
46	排気筒ドレンサンプピット	・1/2号排気筒ドレンサンプピット	1～4号機周辺	約0.3※ ※適宜溜まり水の移送を実施	Cs-134： Cs-137： 全β：	1.9E5 1.6E7 1.5E7 （2024.12.25）	**1.6E5** **1.5E7** **1.5E7** **（2025.3.26）**	
		・3/4号排気筒ドレンサンプピット	1～4号機周辺	約2	Cs-134： Cs-137： 全β：	2.0E1 1.1E3 1.4E3 （2025.1.23）	**8.7E0** **7.2E2** **9.8E2** **（2025.4.21）**	
		・5/6号排気筒ドレンサンプピット	5/6号機周辺	約7.6 （2020.3.12）	Cs-134： Cs-137： 全β：	ND 1.6E1 2.2E1 （2024.3.19）	**ND** **1.4E1** **1.7E1** **（2025.3.31）**	
		・集中RW排気筒ドレンサンプピット	1～4号機周辺	約10	Cs-134： Cs-137： 全β：	ND 2.6E2 3.1E2 （2025.2.7）		
47	固体廃棄物貯蔵庫（6～8号棟）	固体廃棄物貯蔵庫（6～8号棟）	固体廃棄物貯蔵庫（6～8号棟）	約200	Cs-134：ND Cs-137：5.3E+1 全β：4.8E+1 （2017.11.10）			

資料4

建屋内における残水等の状況について

東京電力ホールディングス株式会社
2025/6/6

No.	号機	建屋	対象エリア	区分	区分の判断日※1	運用目標値／基準値(mm)	測定頻度	今回 確認日	今回 水位	今回 1回前との水位差(mm)	1回前 確認日	1回前 水位	1回前 2回前との水位差(mm)	2回前 確認日	2回前 水位	2回前 3回前との水位差(mm)	最終排水実績	排水計画	床面(mm)	水位計の有無	水位調整不可能予定時期	備考
1	1号機	T/B	電気マンホールNo.1	排水完了エリア	2017/7/5	T.P. 3,023	1回/月	2025/5/7	測定下限値以下	–	2025/4/7	測定下限値以下	–	2025/3/3	測定下限値以下	–	2019/10/28	–	T.P. 1,743	無	完了済	
			電気マンホールNo.2	排水完了エリア	2017/7/5	T.P. 2,293	1回/月	2025/5/7	測定下限値以下	–	2025/4/7	測定下限値以下	–	2025/3/3	測定下限値以下	–	2024/9/27	–	T.P. 1,743	無	完了済	
2			主油タンク室	排水完了エリア	2017/7/5	T.P. 3,463	1回/月	2025/5/7	測定下限値以下	–	2025/4/7	測定下限値以下	–	2025/3/3	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 3,443	無	完了済	
3			復水脱塩装置樹脂貯蔵タンク室	排水完了エリア	2017/7/27	T.P. 2,063	1回/3ヶ月	2025/4/7	測定下限値以下	–	2025/3/3	測定下限値以下	–	2025/1/6	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 2,043	無	完了済	
4			ハウスボイラ室	排水完了エリア	2017/7/11	T.P. 2,250	1回/月	2025/5/7	測定下限値以下	–	2025/4/7	測定下限値以下	–	2025/3/3	測定下限値以下	–	2025/1/7	–	T.P. 943	有(露出)	完了済	
5			ディーゼル発電機(B)室	排水完了エリア	2017/7/19	T.P. 1,926	1回/月	2025/5/7	測定下限値以下	–	2025/4/7	測定下限値以下	–	2025/3/3	測定下限値以下	–	2023/12/12	–	T.P. 543	有(露出)	完了済	
6			床ドレンサンプ	床面以下に貯留する残水	2018/7/24	–	1回/日	2025/5/7	T.P. -748	–	2025/4/7	T.P. -137	–	2025/3/3	T.P. -886	–	–	–	–	有	完了済	
7			機器ドレンサンプ	床面以下に貯留する残水	2018/7/24	–	1回/日	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	–	–	無	完了済	
8			復水ポンプ配管トレンチ	床面以下に貯留する残水	2018/7/24	–	1回/日	2025/5/7	T.P. 0	–	2025/4/7	T.P. -124	–	2025/3/3	T.P. -191	–	–	–	T.P. -857	有	完了済	水位は仮設水位計にて計測
9			復水ポンプピット(A)	床面以下に貯留する残水	2018/7/24	–	1回/日	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	–	–	無	完了済	
			復水ポンプピット(B)	床面以下に貯留する残水	2018/7/24	–	1回/日	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	–	–	無	完了済	
			復水ポンプピット(C)	床面以下に貯留する残水	2018/7/24	–	1回/日	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	–	–	無	完了済	
10			給水加熱器ドレンポンプピット(A)	床面以下に貯留する残水	2018/7/24	–	1回/日	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	–	–	無	完了済	
			給水加熱器ドレンポンプピット(B)	床面以下に貯留する残水	2018/7/24	–	1回/日	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	–	–	無	完了済	
11		Rw/B	LDT室	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/7	測定下限値以下	–	2025/4/7	測定下限値以下	–	2025/3/3	測定下限値以下	–	–	–	T.P. -36	有(露出)	完了済	
12			FSST室	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/7	T.P.34	0	2025/4/21	T.P.14	0	2025/4/14	T.P.14	0	2025/1/21	–	T.P. -36	有(露出)	完了済	
13			OGST室	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/7	測定下限値以下	–	2025/4/7	測定下限値以下	–	2025/3/3	測定下限値以下	–	–	–	T.P. -36	有(露出)	完了済	
14			床ドレンサンプ(A)	床面以下に貯留する残水	2019/4/22	–	1回/日	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	–	–	無	完了済	
15			床ドレンサンプ(B)	床面以下に貯留する残水	2019/4/22	–	1回/日	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	–	–	無	完了済	
16			高電導度廃液サンプ	床面以下に貯留する残水	2019/4/22	–	1回/日	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	測定困難※3	–	–	–	–	無	完了済	
17	2号機	T/B	低圧復水ポンプエリア	建屋貯留水	–	–	–	–	測定困難※4	–	–	測定困難※4	–	–	測定困難※4	–	–	–	T.P. -1,752	無	–	復水器エリアと連通性有※2 (連通高さ:T.P.-1527mm)
18			C/B(バッテリー室)	排水完了エリア	2018/1/31	T.P. 1,599	1回/月	2025/5/8	測定下限値以下	–	2025/4/8	測定下限値以下	–	2025/3/4	測定下限値以下	–	2018/1/26	–	T.P. 448	無	完了済	
19			C/B(電気品室)	排水完了エリア	2018/1/18	T.P. 1,644	1回/月	2025/5/8	測定下限値以下	–	2025/4/8	測定下限値以下	–	2025/3/4	測定下限値以下	–	2018/1/15	–	T.P. 448	有(露出)	完了済	
20			バッチ油タンク室	排水完了エリア	2018/3/26	T.P. 1,668	1回/月	2025/5/8	測定下限値以下	–	2025/4/8	測定下限値以下	–	2025/3/4	測定下限値以下	–	2024/12/20	–	T.P. 448	有(露出)	完了済	
21			スイッチギア室	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/8	測定下限値以下	–	2025/4/8	測定下限値以下	–	2025/3/4	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 448	有(露出)	完了済	
22			南西エリア	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/8	測定下限値以下	–	2025/4/8	測定下限値以下	–	2025/3/4	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 448	有(露出)	完了済	
23			CD室	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/8	測定下限値以下	–	2025/4/8	測定下限値以下	–	2025/3/4	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 448	有(露出)	完了済	
24			消火ポンプ室(水位計設置個所)	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/8	測定下限値以下	–	2025/4/8	測定下限値以下	–	2025/3/4	測定下限値以下	–	2023/7/25	–	T.P. 448	有(露出)	完了済	
			消火ポンプ室(ポンプ設置個所)	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/8	測定下限値以下	–	2025/4/8	測定下限値以下	–	2025/3/4	測定下限値以下	–	2023/10/11	–	T.P. 448	無	完了済	
25			ディーゼル発電機(A)室	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/8	測定下限値以下	–	2025/4/8	測定下限値以下	–	2025/3/4	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 448	有(露出)	完了済	
26			電気油圧式制御装置室 ※5	建屋貯留水	–	–	–	2018/1/31	測定下限値以下	–	2018/1/31	測定下限値以下	–	43131	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 448	無	–	復水器エリアと連通性有※2
27	3号機	T/B	T/B地下階北東廊下 ※5	建屋貯留水	–	–	–	2017/12/25	測定下限値以下	–	2017/12/25	測定下限値以下	–	43094	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 463	無	–	復水器エリアと連通性有※2
28			南西エリア	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/9	測定下限値以下	–	2025/4/9	測定下限値以下	–	2025/3/5	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 463	有(露出)	完了済	
29			CD室	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/9	測定下限値以下	–	2025/4/9	測定下限値以下	–	2025/3/5	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 463	有(露出)	完了済	
30			ディーゼル発電機(A)室	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/9	測定下限値以下	–	2025/4/9	測定下限値以下	–	2025/3/5	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 463	有(露出)	完了済	
31			ディーゼル発電機(B)室	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/9	測定下限値以下	–	2025/4/9	測定下限値以下	–	2025/3/5	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 463	有(露出)	完了済	
32			電気油圧式制御装置室	排水完了エリア	2018/2/2	T.P. 1,725	1回/月	2025/5/9	測定下限値以下	–	2025/4/9	測定下限値以下	–	2025/3/5	測定下限値以下	–	2019/6/14	–	T.P. 463	無	完了済	
33			消火ポンプ室	排水完了エリア	2018/3/20	T.P. 1,644	1回/月	2025/5/9	測定下限値以下	–	2025/4/9	測定下限値以下	–	2025/3/5	測定下限値以下	–	2023/9/21	–	T.P. 463	有(露出)	完了済	
34			バッチ油タンク室	排水完了エリア	2018/3/20	T.P. 1,665	1回/月	2025/5/9	測定下限値以下	–	2025/4/9	測定下限値以下	–	2025/3/5	測定下限値以下	–	2020/10/6	–	T.P. 463	有(露出)	完了済	
35			C/Bエリア	建屋貯留水	–	–	1回/日	2025/4/9	測定下限値以下	–	2025/3/5	測定下限値以下	–	2025/2/5	測定下限値以下	–	2020/10/2	–	T.P. -1,737	有	完了済	継続した水位上昇を確認。 継続して排水する措置を実施済み。
36	4号機	T/B	C/B(バッテリー室)	排水完了エリア	2018/2/15	T.P. 1,683	1回/月	2025/5/12	測定下限値以下	–	2025/4/10	測定下限値以下	–	2025/3/6	測定下限値以下	–	2018/1/24	–	T.P. 461	有(露出)	完了済	
37			C/B(電気品室)	排水完了エリア	2018/2/15	T.P. 1,636	1回/月	2025/5/12	測定下限値以下	–	2025/4/10	測定下限値以下	–	2025/3/6	測定下限値以下	–	2018/10/23	–	T.P. 461	有(露出)	完了済	
38			バッチ油タンク室	排水完了エリア	2018/3/23	T.P. 1,622	1回/月	2025/5/12	測定下限値以下	–	2025/4/10	測定下限値以下	–	2025/3/6	測定下限値以下	–	2020/10/14	–	T.P. 461	有(露出)	完了済	
39			M/Cエリア	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/12	測定下限値以下	–	2025/4/10	測定下限値以下	–	2025/3/6	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 461	有(露出)	完了済	
40			南西エリア	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/12	測定下限値以下	–	2025/4/10	測定下限値以下	–	2025/3/6	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 461	有(露出)	完了済	
41			ディーゼル発電機(A)室	排水完了エリア	2020/2/7	T.P. 1,400	1回/月	2025/5/12	測定下限値以下	–	2025/4/10	測定下限値以下	–	2025/3/6	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 461	有(露出)	完了済	
42			電気油圧式制御装置室 ※5	建屋貯留水	–	–	–	2018/1/12	測定下限値以下	–	2018/1/12	測定下限値以下	–	2018/1/12	測定下限値以下	–	–	–	T.P. 461	無	–	復水器エリアと連通性有※2

※1:現状の滞留水水位より床面が低く、将来的な水位低下によって孤立すると想定されるエリアについては、運転上の制限(建屋滞留水<サブドレン水位)を満足する時期で調査を行い、区分分けするように計画する。
※2:2018/3/8,2018/4/24 面談資料参照。
※3:1号機タービン建屋は、現在、床ドレンサンプ内で水位管理を行っているため、T.P.443として管理(2018/4/6面談資料参照)
※4:連通のある復水器エリアは、連通高さ(T.P.-1527mm)以下にある床ドレンサンプで水位を制御しているため、連通高さを超えてから水位を記載する。
※5:床面露出。中間地下階のため、再冠水の可能性は低い。
※6:床面露出。床面(T.P.-1737mm)以下にあるストームドレンサンプで水位を制御しているため、床面高さを超えてから水位を記載する。

2025/5/12 5:00 時点の各建屋水位

	1号機			2号機			3号機			4号機		
建屋	R/B	Rw/B	T/B※6	R/B	Rw/B	T/B	R/B	Rw/B	T/B	R/B	Rw/B	T/B
滞留水の水位	T.P. -2,221	除去完了	除去完了	T.P. -2,799	除去完了	除去完了	T.P. -2,849	除去完了	除去完了	除去完了	除去完了	除去完了
周辺サプトレン設定値	T.P. -650	T.P. -650	T.P. -650	T.P. -650	T.P. -650	T.P. -650	T.P. -650	T.P. -650	T.P. -650	T.P. -650	T.P. -650	T.P. -650

※6:1号機T/Bの最下階の床レベルはT.P.443mm

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社


各建屋地下エリアの滞留水貯留状況


最終更新：2020/2/8
東京電力ホールディングス株式会社

水位安定エリア等については線量測定が実施出来た場合、測定結果を記載している。
※1：1階床面より3m程度挿入した箇所で測定
※2：作業エリアである1階床面で測定
※3：孤立すると予想したエリアだが連通が確認されたため、建屋に貯留する滞留水のままと判断したエリア

※

- ：排水完了エリア
- ：露出したエリア※3
- ：孤立予定箇所
- ：床面以下に貯留する残水

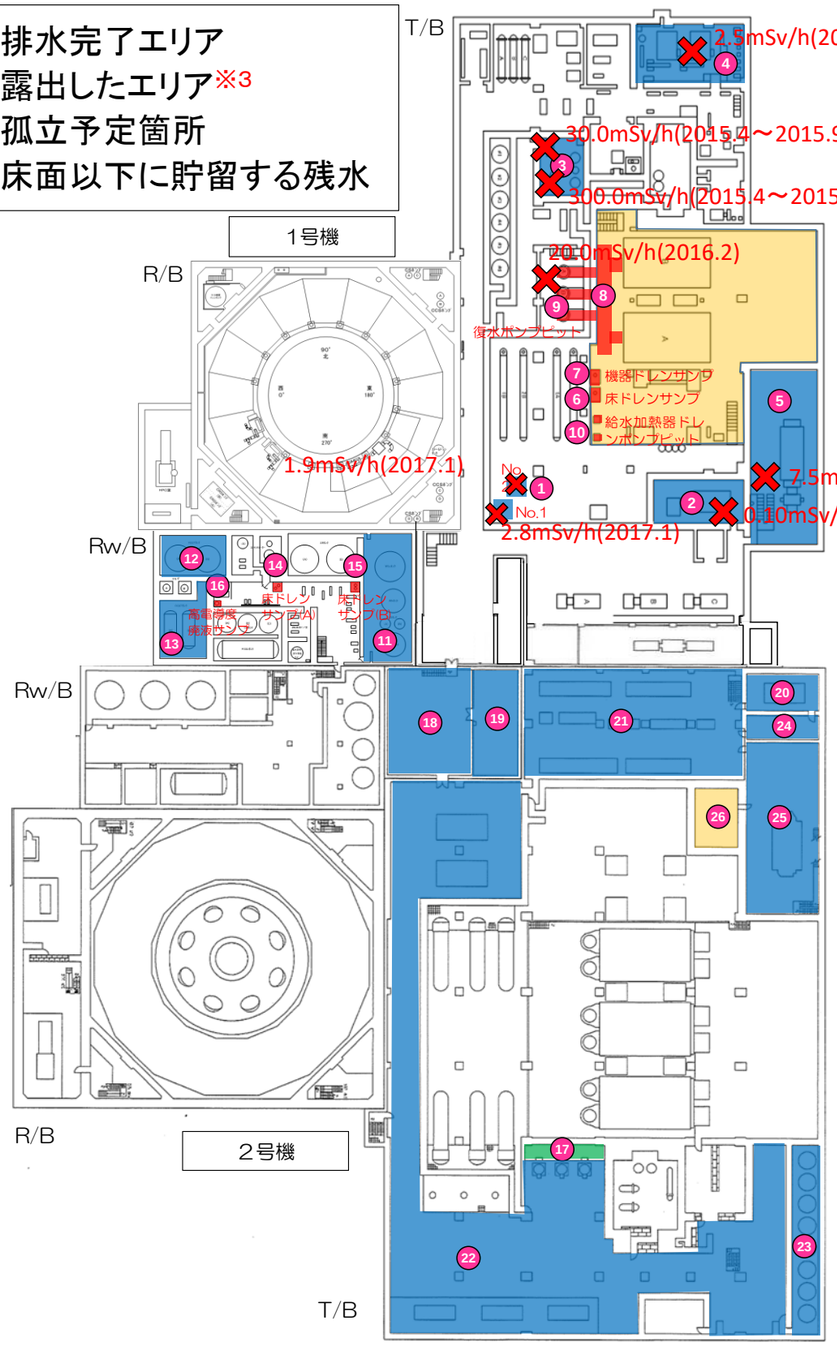

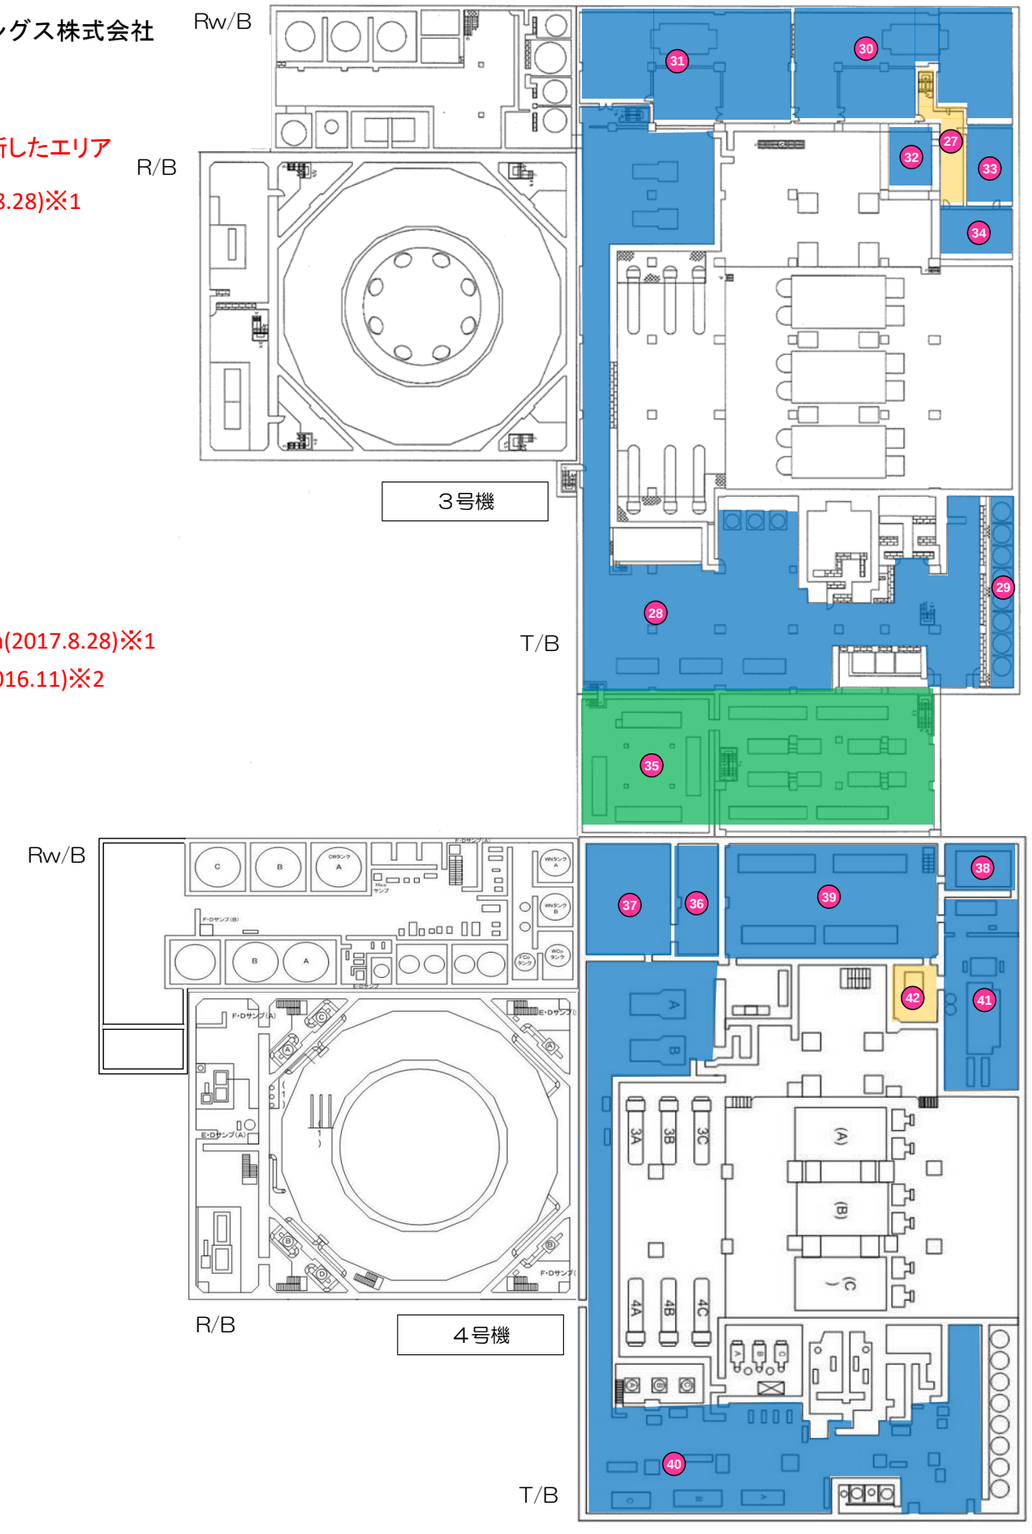

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.
無断複製・転載禁止　東京電力ホールディングス株式会社

資料5

東京電力ホールディングス株式会社
2025年6月6日

福島第一原子力発電所における固体廃棄物について

実施計画記載箇所	大分類	小分類	保管場所	保管形態	保管量※1,2,3	保管容量※1,2,3	管理方法		主要核種
							実施内容	頻度	
Ⅲ 第1編 39条 第2編 87条の2	瓦礫類	・地震、津波、水素爆発により飛散した瓦礫 ・フォールアウトにより汚染した設備・資機材で廃棄する物（建屋、制御盤、廃車両等） ・設備の点検・工事により発生する交換品等（ポンプ、バルブ、配管、フランジタンク等） ・設備運転に伴い発生する消耗品等（空調フィルタ等） ・工事等のため構内に持ち込んだ消耗品（梱包材、型枠、セメント用空袋等） ・回収した土壌	屋外	・屋外集積（～0.1mSv/h）	325,100 m³ [微減 m³]	397,900 m³ ※4	・人が容易に立ち入れないよう区画	－	Cs-137 Cs-134 等※6
				・シート養生（0.1～1mSv/h）	26,000 m³ [-500 m³]	55,300 m³	・巡視にて以下を確認 ①容器の点等、落下が無いこと ②養生シートに破れが無いこと ③その他異常が無いこと ・空間線量率を測定し表示 ・覆土式一時保管施設について、槽内の溜まり水の有無を確認	週1回	
				・覆土式一時保管施設、容器収納（1mSv/h～30mSv/h）	16,400 m³ [0 m³]	17,200 m³			
			固体廃棄物貯蔵庫	・容器収納	40,600 m³ [+1,700 m³]	83,300 m³ (132,700 m³)			
			瓦礫類の合計		408,100 m³ [+1,200 m³]	553,700 m³ ※4 (603,100 m³)			
	使用済保護衣等	・タイベック、下着類、ゴム手袋 ・その他保護衣、保護具	屋外	・容器収納	10,600 m³ [-400 m³]	25,300 m³ ※4			
	伐採木	・枝葉根	屋外	・伐採木一時保管槽	37,300 m³ [0 m³]	41,600 m³	・伐採木一時保管槽における温度監視 ・伐採木の屋外集積にて以下を確認 ①煙、水蒸気、空気の揺らぎが無いこと ②濁り水（黒・茶色）が無いこと	週1回 (6～9月週3回)	
				・屋外集積	1,500 m³ [0 m³]	6,000 m³			
		・幹根			31,300 m³ [微減 m³]	128,000 m³	・保管量の確認 ・保管容量が確保されていることを確認	月1回	
		－	伐採木の合計		70,200 m³ [微減 m³]	175,600 m³	・空気中の放射性物質濃度を測定	6ヶ月に1回※5	
Ⅲ 第1編 40条 第2編 87条の3	水処理二次廃棄物	・凝集沈殿物	廃ｽﾗｯｼﾞ貯蔵施設	・造粒固化体貯槽【除染装置】	471 m³ [0 m³]	700 m³	・免震重要棟にて液位を監視し、漏えいの有無を監視	常時	Cs-137 Cs-134 Sr-90 等
		・吸着材（前置フィルタ含む）	使用済ｾｼｳﾑ吸着塔一時保管施設	・HIC【多核種除去設備、増設多核種除去設備】（最大約13mSv/h）	4,476 本 [+9 本]	4,768 本	・人が容易に立ち入れないよう区画 ・空間線量率を測定し表示 ・巡視を行い、コンクリート製ボックスカルバート等に異常が無いことを確認	－	
				・HIC【多核種除去設備、増設多核種除去設備】（最大約23mSv/h）					
				・吸着塔【第二セシウム吸着装置、第三セシウム吸着装置、高性能多核種除去設備、RO濃縮水処理設備、サブドレン他浄化装置】（最大約1.2mSv/h）	425 本 [0 本]	584 本			
				・処理カラム【多核種除去設備】（最大約0.2mSv/h）					
				・吸着塔【セシウム吸着装置、モバイル式処理装置、モバイル型Sr除去装置、第二モバイル型Sr除去装置、サブドレン他浄化装置、放水路浄化装置、浄化ユニット、高性能多核種除去設備検証試験装置】（最大約250mSv/h）	993 本 [0 本]	1,532 本	・貯蔵量の確認 ・貯蔵容量が確保されていることを確認	週1回	
				・容器収納【モバイル型Ｓｒ除去装置】（最大約0.5mSv/h）					
		・フィルタ	屋外	・容器収納【高性能多核種除去設備、RO濃縮水処理設備】（最大約0.5mSv/h）	瓦礫類に含む		瓦礫類と同様		
			固体廃棄物貯蔵庫	・容器収納【サブドレン他浄化装置】					
				・容器収納【雨水処理設備等】（1mSv/h未満）					
		・RO装置のフィルタ類	屋外	・容器収納【SFP塩分除去装置】（最大十数mSv/h）					
		・樹脂	固体廃棄物貯蔵庫	・容器収納【雨水処理設備等】（最大2mSv/h）					

福島第一原子力発電所における固体廃棄物について

東京電力ホールディングス株式会社
2025年6月6日

実施計画記載箇所	大分類	小分類	保管場所	保管形態	保管量※1,2,3	保管容量※1,2,3	管理方法		主要核種
							実施内容	頻度	
Ⅲ 第1編 38条 第2編 87条	放射性固体廃棄物等	・震災前に発生した放射性固体廃棄物	固体廃棄物貯蔵庫	・ドラム缶収納	ドラム缶 175,661 本	約　ドラム缶 318,500 本 相当	・巡視による保管状況の確認 ・保管量の確認	月1回	Co-60等
				・その他	ドラム缶 10,155 本 相当				
		・震災後に発生した放射性固体廃棄物（焼却灰等）		・ドラム缶収納、ボックスコンテナ収納	ドラム缶 6,448 本 [+48 本] 相当				
		・制御棒	サイトバンカ	・水中保管	1,198 本 [0 本]	―	・巡視による保管状況の確認	月1回	
		・チャンネルボックス			9,818 本 [0 本]				
		・ヒューエルサポート			3 本 [0 本]				
		・中性子検出器			1,137 本 [0 本]				
		・その他（シュラウド切断片等）			195 m^3 [0 m^3]		・保管量の確認	3ヶ月に1回	
		―	サイトバンカの合計		12,156 本 [0 本]				
					195 m^3 [0 m^3]				
		・イオン交換樹脂	タンク等	・タンク等に貯蔵	2,404 m^3 [0 m^3]		・貯蔵量の確認	3ヶ月に1回	
		・造粒固化体			1,148 m^3 [0 m^3]		・貯蔵状況の確認	タンクにより異なる	
		―	タンク等の合計		3,552 m^3 [0 m^3]		・1～4号機廃棄物処理建屋等の水没や高線量の理由によりアクセスできないタンクについては上記の限りではない		
		・制御棒	使用済燃料プール	・水中保管	254 本 [0 本]		・使用済燃料共用プールの巡視	月1回	
		・チャンネルボックス			8,883 本 [0 本]				
		・ポイズンカーテン			173 本 [0 本]				
		・ヒューエルサポート			54 本 [0 本]		・使用済燃料共用プールの貯蔵量の確認	3ヶ月に1回	
		・中性子検出器			375 本 [0 本]				
		―	使用済燃料プールの合計		9,739 本 [0 本]				
―	瓦礫等	・回収した瓦礫等	屋外	・屋外集積、シート養生、容器収納、雨水等侵入防止養生	―	5,500 m^3 [-200 m^3]	・一時保管エリアで保管するための準備として、分別作業やコンテナへの収納作業を実施する場合に限り、仮設集積を設定 ・人が容易に立ち入れないよう区画 ・立ち入りを制限する標識を掲示 ・空間線量率を測定し表示	―	Cs-134 Cs-137 等
			建屋	・屋内集積、シート養生、容器収納、雨水等侵入防止養生		100 m^3 [微増 m^3]			
	水処理二次廃棄物	・樹脂、ゼオライト、RO膜等	―	・容器収納、容器収納の上 シート養生		微量 m^3 [微減 m^3]			Cs-137 Cs-134 Sr-90 等
	―		仮設集積の合計			5,700 m^3 [-200 m^3]			

福島第一原子力発電所における固体廃棄物について

東京電力ホールディングス株式会社
2025年6月6日

ガレキの保管量の現状※1, 2, 4, 7

保管形態	受入目安表面線量率 (mSv/h)	エリア名称	保管容量	保管量	前回比	保管容量合計	保管量合計	2025年度末 想定保管量
屋外集積 (～0.1mSv/h)	≦バックグラウンド線量率	EE1	8,600 m^3	1,900 m^3	0 m^3	397,900 m^3	325,100 m^3	359,900 m^3
		G	40,000 m^3	4,100 m^3	+2,800 m^3			
		H	43,000 m^3	0 m^3	0 m^3			
		M	45,000 m^3	0 m^3	0 m^3			
	≦0.001	AA	58,000 m^3	34,300 m^3	+300 m^3			
	≦0.005	A2	9,500 m^3	6,300 m^3	0 m^3			
		J	6,300 m^3	5,900 m^3	微減 m^3			
		DD	10,800 m^3	9,600 m^3	-100 m^3			
		EE2	6,300 m^3	0 m^3	0 m^3			
		l	7,200 m^3	0 m^3	0 m^3			
	≦0.01	A1	4,300 m^3	2,200 m^3	0 m^3			
		B	5,300 m^3	5,300 m^3	0 m^3			
		BB	44,800 m^3	41,400 m^3	-2,400 m^3			
		k	9,500 m^3	4,500 m^3	0 m^3			
	≦0.02	D	2,700 m^3	2,600 m^3	0 m^3			
	≦0.028	U	800 m^3	700 m^3	0 m^3			
	≦0.1	C	67,000 m^3	65,400 m^3	-200 m^3			
		F	7,100 m^3	6,500 m^3	-100 m^3			
		N	9,700 m^3	9,600 m^3	0 m^3			
		O	44,100 m^3	44,000 m^3	0 m^3			
		P1	62,700 m^3	52,700 m^3	-400 m^3			
		V	6,000 m^3	6,000 m^3	0 m^3			
		CC	18,800 m^3	16,200 m^3	0 m^3			
		d	1,900 m^3	1,600 m^3	0 m^3			
		e	6,700 m^3	4,300 m^3	0 m^3			
シート養生 (0.1～1mSv/h)	≦1	E1	16,000 m^3	5,700 m^3	-900 m^3	55,300 m^3	26,000 m^3	82,000 m^3
		P2	6,700 m^3	4,500 m^3	-100 m^3			
		W	11,600 m^3	2,700 m^3	+900 m^3			
		X	16,600 m^3	12,100 m^3	-500 m^3			
		m	4,400 m^3	1,100 m^3	+100 m^3			
覆土式一時保管施設、容器収納 (1mSv/h～30mSv/h)	≦2	E2	1,200 m^3	400 m^3	0 m^3	17,200 m^3	16,400 m^3	27,400 m^3
	≦30	L	16,000 m^3	16,000 m^3	0 m^3			

※1　各数値は以下の時点のデータを示している。
瓦礫類、使用済保護衣等、伐採木の保管量及び保管容量　：　2025年4月30日 現在
水処理二次廃棄物の保管量及び保管容量　：　2025年5月1日 現在
固体廃棄物貯蔵庫保管の放射性固体廃棄物の保管量及び保管容量　：　2025年4月30日 現在
固体廃棄物貯蔵庫保管以外の放射性固体廃棄物の保管量及び保管容量　：　2024年12月末 現在
仮設集積の保管容量　：　2025年4月30日 現在
瓦礫類の（　　）で記載している保管容量及び瓦礫類の想定保管量の予測値　：　2025年3月28日 認可の実施計画

※2　一部の値について端数処理で100m^3未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。また、50m^3未満の保管量を微量、50m^3未満の増減を微増・微減と示している。

※3　[　　]は、当該の報告と前回の報告との差を示している。

※4　エリアAA、エリアk、エリア1は、使用済保護衣等の保管も行うが、主に瓦礫類を保管するため、使用済保護衣等の保管容量からは除いている。
エリアG、エリアH、エリアMは、瓦礫類及び使用済保護衣等の保管も行うが、主に伐採木を保管するため、瓦礫類の合計の保管容量と使用済保護衣等の保管容量からは除いている。
なお、上記エリアの合算した保管量が保管容量を超えていないことを確認している。


※5　屋外集積及びシート養生の瓦礫類、使用済保護衣等、並びに屋外集積の伐採木は、3ヶ月に1回。

※6　廃棄物の処理・処分に必要となる、廃棄物の性状把握のため、汚染水、瓦礫類、伐採木及び立木について、放射能濃度分析を実施しており、今後も継続する。
分析した試料の中には、C-14（半減期：約5.7×10^3年）、Ni-63（半減期：約1.0×10^2年）、Se-79（半減期：約1.1×10^6年）、Tc-99（半減期：約2.1×10^5年）、I-129（半減期：約1.6×10^7年）等が検出されているものがある。

※7　各受入目安表面線量率において、固体廃棄物貯蔵庫の保管量は除いて記載。

福島第一原子力発電所　固体廃棄物等保管エリアの構内配置図

東京電力ホールディングス株式会社
2025年6月6日

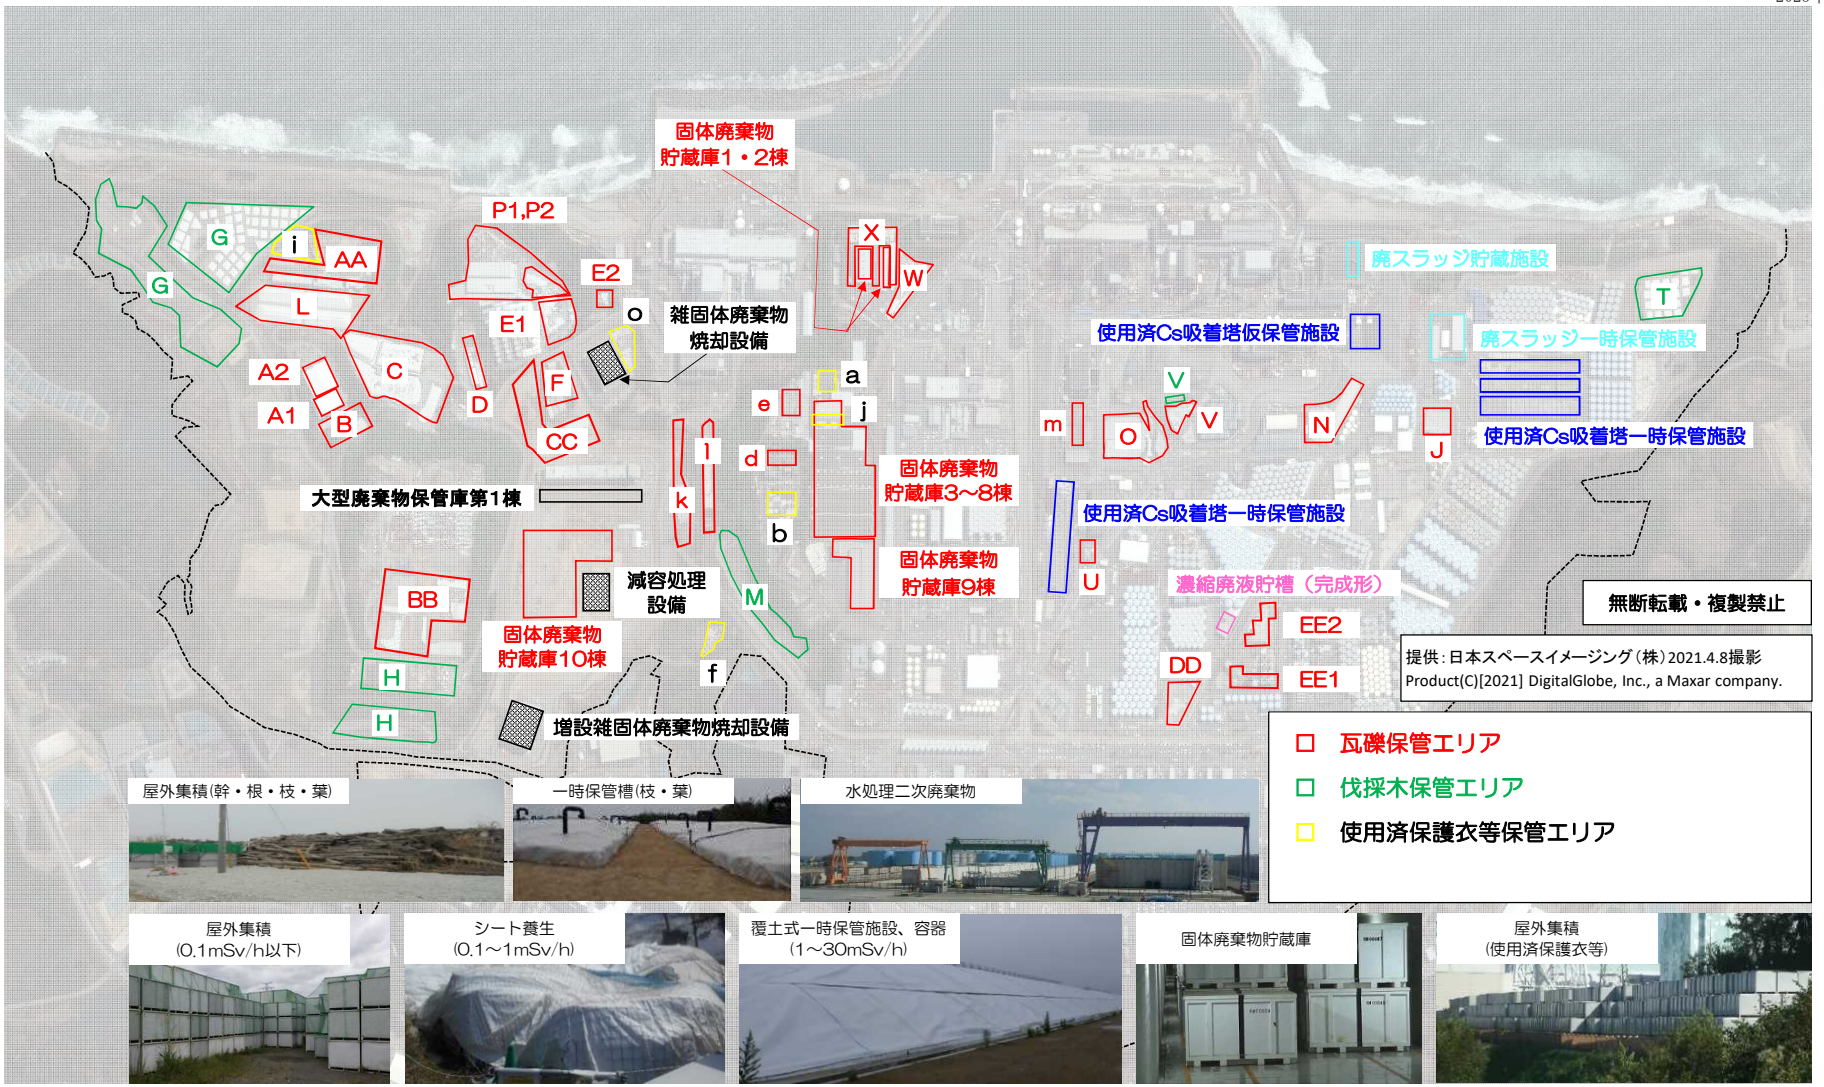

放射性廃棄物処理・処分　スケジュール

分野名	廃炉中長期実行プラン2025 目標工程	括り	作業内容		これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月以降	備　考
							27	4 / 11 / 18 / 25	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	
固体廃棄物の保管管理、処理・処分計画	●ガレキ等の屋外一時保管解消（2028年度内）	保管管理計画	1．保管適正化の推進	一時保管エリアの変更	（実　績／予　定）	検討・設計									
				雑固体廃棄物焼却設備	（実　績） ・処理運転（A・B系） （予　定） ・処理運転（A・B系） ・機電設備点検（A・B・共通系）	現場作業	【A系】 【B系】 【共通系】	処理運転 処理運転	機電設備点検 機電設備点検 機電設備点検						・6月上旬よりA系の機電設備点検を予定 ・6月下旬よりB系の機電設備点検を予定 ・6月下旬より共通系の機電設備点検を予定
				増設雑固体廃棄物焼却設備	（実　績） ・機械・電気・計装設備点検 ・復旧工事 （予　定） ・機械・電気・計装設備点検 ・復旧工事	現場作業		機械・電気・計装設備点検 復旧工事						(2025年度完了予定)	・機械・電気・計装設備点検中 ・施設の復旧工事を3月より開始 建物復旧工事用の足場設置、各所清掃作業および廃棄物貯留ピットコンクリート健全性調査を実施中
				除染装置（AREVA）スラッジ	（実　績） ・スラッジ対処方法検討 ・建屋内線量低減 （予　定） ・スラッジ対処方法検討 ・建屋内線量低減	検討・設計 現場作業	スラッジ対処方法検討 建屋内線量低減					(2025年9月完了予定)		(2027年度完了予定)	・廃スラッジ回収施設の制震評価を実施中 ・プロセス主建屋内の線量低減を実施中
			2．保管適正化の推進のための設備設置	減容処理設備	（実　績） ・処理運転 （予　定） ・処理運転 ・機械設備点検	現場作業	処理運転			機械設備点検					・4月22日より処理運転再開 ・7月中旬より機械設備点検を予定
				固体廃棄物貯蔵庫第10棟	（実　績） ・建築工事（10-C棟） （予　定） ・なし（設置工事完了）	検討・設計 現場作業	建屋工事（10-C棟）								・2023年　3月29日に建屋工事着工 ・2024年　8月23日：10-A棟　運用開始 ・2024年　10月29日：10-B棟　運用開始 ・2025年　4月 25日10-C棟　竣工 5月15日 10-C棟　運用開始
				固体廃棄物貯蔵庫第11棟	（実　績／予　定） ・設計検討	検討・設計	設計検討							(2025年度完了予定)	・2021年2月13日の地震に関する影響評価を踏まえ、追加の耐震評価や設計を実施中
	●水処理二次廃棄物			大型廃棄物保管庫第一棟	（実　績） ・設計検討 ・建屋補強工事 （予　定） ・設計検討 ・建屋補強工事	検討・設計 現場作業	設計検討（吸着塔架台） 建屋補強工事（準備工事、地盤改良含む）							(2025年度完了予定) (2025年度完了予定)	・2/13の地震に関する影響評価を踏まえ、2023年度内部工事開始、2025年度耐震補強完了を目標とする ・2024年3月25日　実施計画変更申請（建屋補強） ・2024年7月19日　実施計画変更認可（建屋補強）
				大型廃棄物保管庫第二棟	（実　績） ・設計検討 （予　定） ・設計検討	検討・設計 現場作業	設計検討（建屋、機電）							(2027年度完了予定)	・設計実施中、2027年度実施計画申請・着工、2031～2032年度運用開始を目標とする
				スラリー安定化処理設備	（実　績） ・安定化処理設備の設計方針検討 （予　定） ・安定化処理設備の詳細設計検討 ・現地工事	検討・設計 現場作業	安定化処理設備の設計検討						現地工事	(2026年度完了予定) (2029年3月完了予定)	・2022年9月12日 第102回監視・評価検討会において示された「審査上の論点」を踏まえ、設計見直しを実施 ・HIC解体エリアを追加した設置候補地見直し後の耐震設計を含む詳細設計を実施しており、耐震設計の状況を踏まえ、機器配置の見直しが生じたことや建屋規模を踏まえた工事期間の反映実施。

福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の貯蔵及び処理の状況について（第 702 報）

2025 年 5 月 30 日
東京電力ホールディングス株式会社

１．はじめに

本書は、2011 年 6 月 9 日付「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備等の設置について（指示）」（平成 23・06・08 原院第 6 号）にて、指示があった以下の内容について報告するものである。

【指示内容】

汚染水の処理設備の稼働後速やかに、同発電所内の汚染水の貯蔵及び処理の状況並びに当該状況を踏まえた今後の見通し※について当院に報告すること。また、その後、集中廃棄物処理建屋内の汚染水の処理が終了するまで、一週間に一度当院に対して、同様の報告を実施すること。

２．建屋内滞留水の貯蔵及び処理の状況（実績）

2025 年 5 月 22 日の各建屋内（1～4 号機（復水器、トレンチを含む））における貯蔵量及び滞留水貯蔵施設における貯蔵量、処理量等は添付資料-1 の通り。

３．貯蔵及び処理の今後の見通し

１～４号機の建屋内滞留水については、滞留水貯蔵施設の貯蔵量、放射能処理装置等の稼働状況を踏まえ、滞留水貯蔵施設であるプロセス主建屋又は高温焼却炉建屋に計画的に移送する。

また、移送された建屋内滞留水については、滞留水貯蔵施設の貯蔵量及び移送の状況を踏まえ、放射能処理装置で計画的に処理する。具体的には、地下水の流入量を抑制し、建屋内滞留水の発生量を減少させるという観点から、建屋内滞留水水位は建屋近傍のサブドレン水位と所定の水位差を確保しつつ、循環注水を行っている１～３号機原子炉建屋については、滞留水貯蔵施設の貯蔵容量や建屋内滞留水の処理状況等を踏まえた移送を計画する。それ以外の建屋最下階の床面が露出した建屋については、床面露出状態を維持できるよう移送を計画する。

滞留水貯蔵施設の滞留水については、中低レベル用処理水受タンクの設置状況や放射能処理装置の稼働率、メンテナンス期間を踏まえて、計画的に処理する。また、放射能処理装置で処理した水は、中低レベル用処理水受タンクで貯蔵する。

現在、建屋内滞留水の移送や貯蔵、放射能処理装置での処理等は計画的に実施できており、引き続き、その状況が維持できることから、今後も、高レベル滞留水の貯蔵・処理等が安定的に行える見込みである。

※：2023 年 10 月 20 日「福島第一原子力発電所における循環注水冷却・滞留水等に係る定例会」における指摘事項（同日付原子力規制庁面談議事要旨より抜粋）


2011 年 6 月 9 日付「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備等の設置について（指示)」（平成 23・06・08 原院第 6 号）に基づき提出されている報告文書「福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の貯蔵及び処理の状況について」について、当該文書のうち、汚染水の貯蔵・処理状況を踏まえた今後の見通しに係る部分（(1)短期見通し、(2)中期見通し）については、同発電所内の汚染水の処理の進捗等を踏まえ、継続して安定的な貯蔵・処理を行うことができ、滞留水貯蔵施設等における水位変動が通常の範囲に収まることが確実な場合はその旨を報告することで足りること（定量的な評価は不要)。

一方で、計画的な作業や異常の発生等に伴い、滞留水貯蔵施設等における水位変動が通常と異なることが見込まれる場合は、定量的な評価を付した形式で報告すること。

以　上

高レベル滞留水の貯蔵及び処理の状況 【2025/5/22現在】

	区　分
／	高レベル水/廃棄物、濃縮廃液
／	処理水（濃縮塩水）/配管撤去
	Sr処理水等
／	RO処理水（淡水）/配管撤去
	多核種除去設備等処理済水
	ろ過水

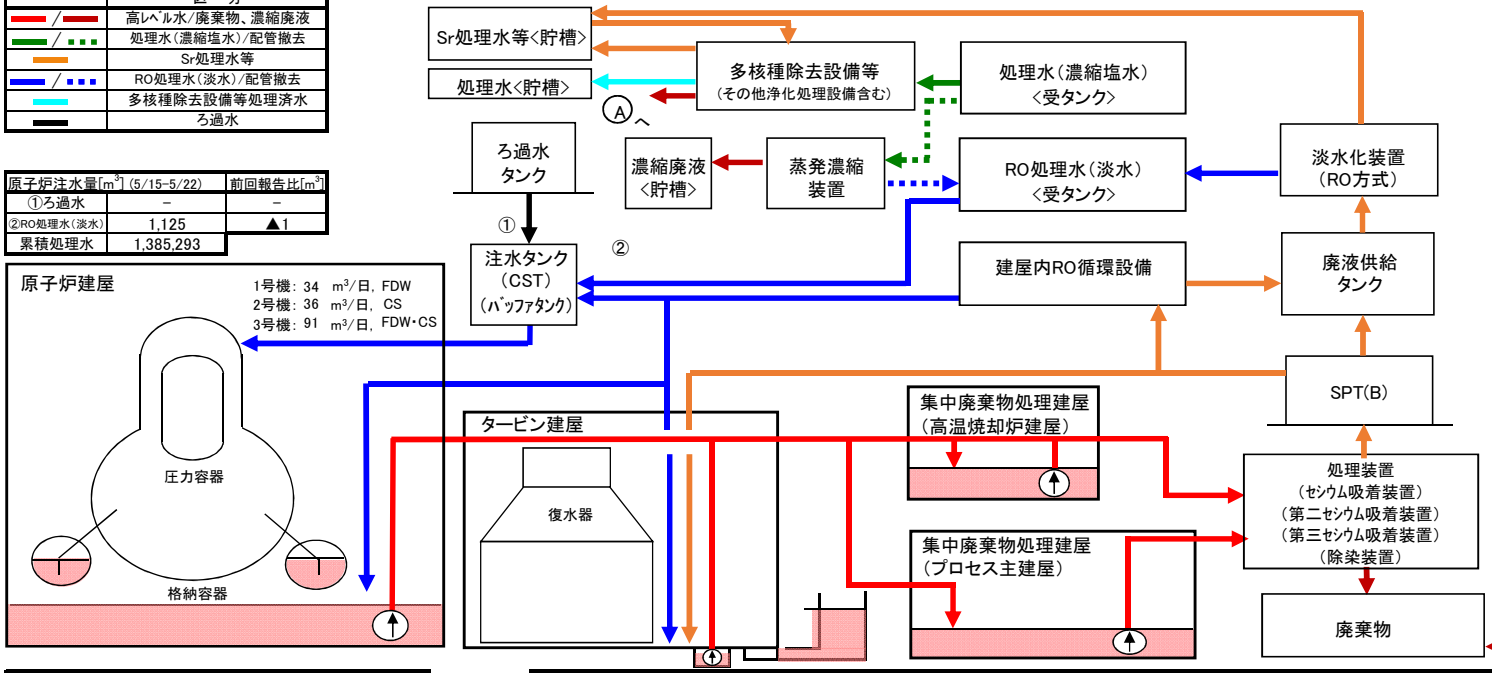

原子炉注水量[m³]（5/15-5/22）		前回報告比[m³]
①ろ過水	－	－
②RO処理水（淡水）	1,125	▲1
累積処理水	1,385,293	

水種別の貯蔵量[m³] ※1,2		前回報告比[m³]	貯蔵容量[m³]※3,4
濃縮塩水	0	－	－
RO処理水（淡水）	6,379	▲9	12,000
濃縮廃液	9,381	＋3	10,300
処 理 水 ※12,16	1,180,082	＋1,246	1,254,200
サンプル水 ※14,16	2,712	▲95	11,600
処理水（再利用）※15,16	92,935	▲251	97,200
Sr処理水等 ※10	10,402	▲513	24,400

残水量[m³] ※5		前回報告比[m³]	貯蔵容量[m³]※3,4
濃縮塩水	約100	変化なし	約1,000
処 理 水 ※13,16	0	変化なし	0
Sr処理水等 ※11	0	変化なし	0

貯蔵量[m³]		前回報告比[m³]	貯蔵容量[m³]※3
廃液供給ﾀﾝｸ	763 ※19	▲70	1,200
SPT(A)	408 ※18	変化なし	3,100
SPT(B)	1,576	＋615	3,100
1号CST	622	＋2	1,600
2号CST	1,839	▲17	2,200
3号CST	1,895	▲3	2,200
バッファタンク	635	＋1	700

	塩素濃度[ppm]
淡水化装置処理前 / 後	152/1（2024/9/3採取）
建屋内RO循環設備処理前 / 後	134/<1（2025/4/25採取）
蒸発濃縮処理前 / 後	－

試料採取箇所	試料濃度[Bq/L]※6
プロセス主建屋	3.3E＋07（2025/4/1採取）
ｾｼｳﾑ吸着装置出口	3.8E＋03（2019/3/22採取）
除染装置出口	－
高温焼却炉建屋	8.6E＋06（2024/7/2採取）
第二ｾｼｳﾑ吸着装置出口	8.1E＋03（2024/2/1採取）
第三ｾｼｳﾑ吸着装置出口	2.6E＋03（2025/4/1採取）

施設	貯蔵量[m³]	前回報告比[m³]	T/B建屋内水位※8
1号機	約880	▲30	－
2号機	約1,160	＋20	－
3号機	約1,270	変化なし	－
4号機	約10	変化なし	－
合　計	約3,320		

貯蔵施設	貯蔵量[m³]	前回報告比[m³]	水位 ※8	処理量[m³]（5/15-5/22）	累積処理量[m³]	廃棄物発生量		前回報告比	保管容量
プロセス主建屋	約9,440	▲260	T.P.904	約2,140 ※7	約2,828,740 ※7	廃スラッジ[m³]	471 ※17	変化なし	700 ※3
高温焼却炉建屋	約1,870	＋20	T.P.－703			使用済ﾍﾞｯｾﾙ[本]	5,899 ※9	＋1	6,884
合　計	約11,310								

【前回報告時(2025/5/15)～現在(2025/5/22)の主なイベント】
・1～4号機から建屋(1～4号機、集中廃棄物処理建屋)及び処理装置への移送を適宜実施
・その他工事等による建屋(1～4号機、集中廃棄物処理建屋)への移送を適宜実施
・セシウム吸着装置の運転を停止中
・第二セシウム吸着装置の運転を停止中
・5/21 第三セシウム吸着装置の運転を停止（稼働率：51%）

※1　水移送中の水位は静定しないため参考値扱い
※2　貯蔵量に下記の「タンク底部～水位計0%の水量（DS）」を含んでいない
　　RO処理水（淡水）：約0.01万m³、濃縮廃液：約0.01万m³、処理水：約0.22万m³、
　　処理水(再利用)：約0.02万m³、Sr処理水等：約0.02万m³
※3　運用上の上限値
※4　「タンク底部～水位計0%の水量（DS）」は含んでいないが、貯蔵量のDS以上の貯蔵容量がある
※5　表記載の残水量には、「タンク底部～水位計0%の水量（DS）」を含んでいる
　　濃縮塩水の残水量は多核種除去設備等の処理量より算出
※6　表記はCs-137のデータ
※7　セシウム吸着装置、第二セシウム吸着装置、第三セシウム吸着装置の合計処理量
　　処理量の内訳：　セシウム吸着装置　0 m³
　　第二セシウム吸着装置　0 m³
　　第三セシウム吸着装置　2,140 m³
　　累積処理量の内訳：セシウム吸着装置　394,720 m³
　　第二セシウム吸着装置　2,099,160 m³
　　第三セシウム吸着装置　334,860 m³
※8　午前5時時点のデータ
※9　使用済ベッセル内訳：セシウム吸着装置使用済ベッセル　779 本
　　第二セシウム吸着装置使用済ベッセル　265 本
　　第三セシウム吸着装置使用済ベッセル　25 本
　　その他：保管容器　4,481 基
　　処理カラム　17 塔
　　使用済ベッセル　267 本
　　フィルタ類　65 本

※10　溶接タンクに貯蔵されているSr処理水等（ALPS処理前水）の貯蔵量
※11　フランジ型タンクに貯蔵されているSr処理水等（ALPS処理前水）の残水量
※12　溶接タンクに貯蔵されている「ALPS処理水」及び「処理途上水」の貯蔵量
※13　フランジ型タンクに貯蔵されている「処理途上水」の残水量
※14　既設多核種除去設備サンプルタンク（フランジ型タンク）、
　　増設多核種除去設備一時貯留タンク（溶接タンク）及び、
　　高性能多核種除去設備一時貯留タンク（溶接タンク）に
　　貯蔵されている「処理途上水」の貯蔵量
※15　Sr処理水等（ALPS処理前水）を貯蔵していた溶接タンクを
　　「処理途上水」貯蔵用に再利用。
　　これらに貯蔵されている「処理途上水」の貯蔵量
　　（2019年以降に再利用する溶接タンク）
※16　処理水、サンプル水、処理水（再利用）、処理水（残水）各欄の
　　貯蔵量を合計したものが「ALPS処理水等」の貯蔵量となる
　　（処理水海洋放出による変動を含む）
※17　廃スラッジと上澄み水の合計値
　　（午前10時時点のデータ）
※18　SPT(A)からPMB/HTIへの移送を適時実施中
※19　処理水（貯槽）から廃液供給タンクへの移送を適時実施中

2025年5月30日
東京電力ホールディングス(株)

集計期間:2025/5/15 5:00～2025/5/22 5:00

【参考】使用済みベッセルの内訳について

【セシウム吸着装置使用済ベッセル】	**779 本（ 0 本）**
【第二セシウム吸着装置使用済ベッセル】	**265 本（ 0 本）**
【第三セシウム吸着装置使用済ベッセル】	**25 本（ 0 本）**
【保管容器】	**4,481 基（ 1 基）**
【処理カラム】	**17 塔（ 0 塔）**
【使用済ベッセル】	**267 本（ 0 本）**
高性能多核種除去設備:	90 本（ 0 本）
高性能多核種除去設備検証試験装置:	6 本（ 0 本）
モバイル型Sr除去装置:	34 本（ 0 本）
第二モバイル型Sr除去装置:	25 本（ 0 本）
RO濃縮水処理設備:	21 本（ 0 本）
モバイル式処理設備	
使用済み燃料プール浄化:	11 本（ 0 本）
海水配管トレンチ水浄化:	10 本（ 0 本）
サブドレン他浄化設備:	55 本（ 0 本）
放水路浄化設備:	3 本（ 0 本）
浄化ユニット:	12 本（ 0 本）
【フィルタ類】	**65 本（ 0 本）**
モバイル型Sr除去装置:	65 本（ 0 本）

※1:( )内は集計期間の増加量

【参考】多核種除去設備の運転実績について　　集計期間:2025/5/15 5:00～2025/5/22 5:00

系統		処理量[m3]	廃棄物発生量[本]				
			保管容器			処理カラム	吸着塔
			メディア	その他			
既設多核種除去設備	A系	停止中	0	0	0	0	－
	B系	停止中			0	0	
	C系	停止中			0	0	
増設多核種除去設備	A系	1,054	0	0	0	0	－
	B系	停止中			1	0	
	C系	停止中			0	0	
高性能多核種除去設備		停止中	－	－		－	0
合計※1		1,054	0	1		0	0

※1:処理量は全て出口積算流量計から算出しており、薬液注入量を含む
※2:処理量(1,054m3)の内訳はRO濃縮塩水処理量 0m3、Sr処理水処理量 1,011m3、処理水処理量 0m3、薬液注入量他 43m3※3
※3:処理水を用いて粉体を溶かし生成している薬液量他(0m3)を含む

【参考】その他浄化処理設備(Sr処理水等)の「前回報告比」の内訳

区分	系統	貯蔵量の増加量[m3]※3	備考
増分	セシウム吸着装置等※1	498	建屋滞留水の処理による
減分	多核種除去設備等※2	−1,011	Sr処理水等<貯槽>の処理による減
合計		▲ 513	

※1:セシウム吸着装置、第二セシウム吸着装置及び第三セシウム吸着装置
※2:既設多核種除去設備、高性能多核種除去設備及び増設多核種除去設備
※3:水移送中の水位は静定しないため参考値扱い

【参考】建屋へのウェル/地下水ドレン及びその他移送量

集計期間:2025/5/15 0:00～2025/5/22 0:00

ウェル/地下水ドレン	
移送量[m3]	44

集計期間:2025/5/15 5:00～2025/5/22 5:00

その他[m3]	326

※G3-G群処理途上水のプロセス主建屋への移送量(282m3)を含む

福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の貯蔵及び処理の状況について（第 703 報）

2025 年 6 月 6 日
東京電力ホールディングス株式会社

１．はじめに

本書は、2011 年 6 月 9 日付「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備等の設置について（指示）」（平成 23・06・08 原院第 6 号）にて、指示があった以下の内容について報告するものである。

【指示内容】

汚染水の処理設備の稼働後速やかに、同発電所内の汚染水の貯蔵及び処理の状況並びに当該状況を踏まえた今後の見通し※について当院に報告すること。また、その後、集中廃棄物処理建屋内の汚染水の処理が終了するまで、一週間に一度当院に対して、同様の報告を実施すること。

２．建屋内滞留水の貯蔵及び処理の状況（実績）

2025 年 5 月 29 日の各建屋内（1～4 号機（復水器、トレンチを含む））における貯蔵量及び滞留水貯蔵施設における貯蔵量、処理量等は添付資料-1 の通り。

３．貯蔵及び処理の今後の見通し

１～４号機の建屋内滞留水については、滞留水貯蔵施設の貯蔵量、放射能処理装置等の稼働状況を踏まえ、滞留水貯蔵施設であるプロセス主建屋又は高温焼却炉建屋に計画的に移送する。

また、移送された建屋内滞留水については、滞留水貯蔵施設の貯蔵量及び移送の状況を踏まえ、放射能処理装置で計画的に処理する。具体的には、地下水の流入量を抑制し、建屋内滞留水の発生量を減少させるという観点から、建屋内滞留水水位は建屋近傍のサブドレン水位と所定の水位差を確保しつつ、循環注水を行っている１～３号機原子炉建屋については、滞留水貯蔵施設の貯蔵容量や建屋内滞留水の処理状況等を踏まえた移送を計画する。それ以外の建屋最下階の床面が露出した建屋については、床面露出状態を維持できるよう移送を計画する。

滞留水貯蔵施設の滞留水については、中低レベル用処理水受タンクの設置状況や放射能処理装置の稼働率、メンテナンス期間を踏まえて、計画的に処理する。また、放射能処理装置で処理した水は、中低レベル用処理水受タンクで貯蔵する。

現在、建屋内滞留水の移送や貯蔵、放射能処理装置での処理等は計画的に実施できており、引き続き、その状況が維持できることから、今後も、高レベル滞留水の貯蔵・処理等が安定的に行える見込みである。

※：2023 年 10 月 20 日「福島第一原子力発電所における循環注水冷却・滞留水等に係る定例会」における指摘事項（同日付原子力規制庁面談議事要旨より抜粋）

2011 年 6 月 9 日付「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備等の設置について（指示)」（平成 23・06・08 原院第 6 号）に基づき提出されている報告文書「福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の貯蔵及び処理の状況について」について、当該文書のうち、汚染水の貯蔵・処理状況を踏まえた今後の見通しに係る部分（(1)短期見通し、(2)中期見通し）については、同発電所内の汚染水の処理の進捗等を踏まえ、継続して安定的な貯蔵・処理を行うことができ、滞留水貯蔵施設等における水位変動が通常の範囲に収まることが確実な場合はその旨を報告することで足りること（定量的な評価は不要)。


一方で、計画的な作業や異常の発生等に伴い、滞留水貯蔵施設等における水位変動が通常と異なることが見込まれる場合は、定量的な評価を付した形式で報告すること。

以　上

高レベル滞留水の貯蔵及び処理の状況 【2025/5/29現在】

区　分
高レベル水/廃棄物、濃縮廃液
処理水(濃縮塩水)/配管撤去
Sr処理水等
RO処理水(淡水)/配管撤去
多核種除去設備等処理済水
ろ過水

原子炉注水量[m³] (5/22-5/29)		前回報告比[m³]
①ろ過水	－	－
②RO処理水(淡水)	1,115	▲10
累積処理水	1,386,408	

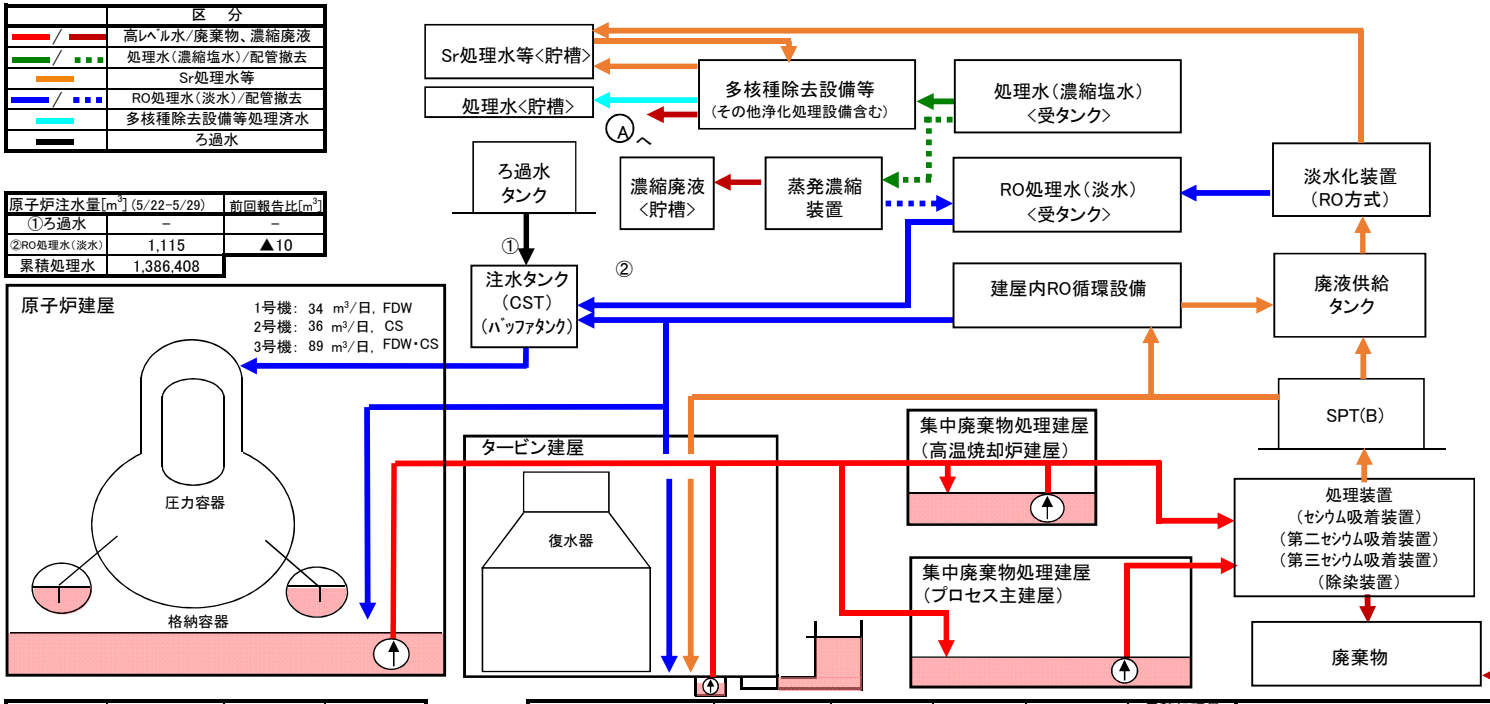

水種別の貯蔵量[m³] ※1,2		前回報告比[m³]	貯蔵容量[m³]※3,4
濃縮塩水	0	－	－
RO処理水(淡水)	7,189	＋810	12,000
濃縮廃液	9,380	▲1	10,300
処 理 水 ※12,16	1,180,869	＋787	1,254,200
サンプル水 ※14,16	2,543	▲169	11,600
処理水(再利用) ※15,16	92,926	▲9	97,200
Sr処理水等 ※10	10,667	＋265	24,400

残水量[m³] ※5		前回報告比[m³]	貯蔵容量[m³]※3,4
濃縮塩水	約100	変化なし	約1,000
処 理 水 ※13,16	0	変化なし	0
Sr処理水等 ※11	0	変化なし	0

貯蔵量[m³]		前回報告比[m³]	貯蔵容量[m³]※3
廃液供給ﾀﾝｸ	762 ※19	▲1	1,200
SPT(A)	408 ※18	変化なし	3,100
SPT(B)	1,048	▲528	3,100
1号CST	622	変化なし	1,600
2号CST	1,726	▲113	2,200
3号CST	1,895	変化なし	2,200
バッファタンク	635	変化なし	700

	塩素濃度[ppm]
淡水化装置処理前 / 後	152/1(2024/9/3採取)
建屋内RO循環設備処理前 / 後	134/<1 (2025/4/25採取)
蒸発濃縮処理前 / 後	－

試料採取箇所	試料濃度[Bq/L]※6
プロセス主建屋	3.3E＋07 (2025/4/1採取)
ｾｼｳﾑ吸着装置出口	3.8E＋03 (2019/3/22採取)
除染装置出口	－
高温焼却炉建屋	8.6E＋06 (2024/7/2採取)
第二ｾｼｳﾑ吸着装置出口	8.1E＋03(2024/2/1採取)
第三ｾｼｳﾑ吸着装置出口	2.6E＋03(2025/4/1採取)

施設	貯蔵量[m³]	前回報告比[m³]	T/B建屋内水位※8
1号機	約920	＋40	－
2号機	約1,140	▲20	－
3号機	約1,200	▲70	－
4号機	約10	変化なし	－
合　計	約3,270		

貯蔵施設	貯蔵量[m³]	前回報告比[m³]	水位 ※8	処理量[m³] (5/22-5/29)	累積処理量[m³]	廃棄物発生量		前回報告比	保管容量
プロセス主建屋	約8,980	▲460	T.P.769	約2,060 ※7	約2,830,800 ※7	廃スラッジ[m³]	471 ※17	変化なし	700 ※3
高温焼却炉建屋	約1,880	＋10	T.P.－689			使用済ﾍﾞｯｾﾙ[本]	5,901 ※9	＋2	6,884
合　計	約10,860								

【前回報告時(2025/5/22)～現在(2025/5/29)の主なイベント】
・1～4号機から建屋(1～4号機、集中廃棄物処理建屋)及び処理装置への移送を適宜実施
・その他工事等による建屋(1～4号機、集中廃棄物処理建屋)への移送を適宜実施
・セシウム吸着装置の運転を停止中
・第二セシウム吸着装置の運転を停止中
・5/22 第三セシウム吸着装置の運転を再開 (稼働率:49%)

※1 水移送中の水位は静定しないため参考値扱い
※2 貯蔵量に下記の「タンク底部～水位計0%の水量(DS)」を含んでいない
RO処理水(淡水):約0.01万m³、濃縮廃液:約0.01万m³、処理水:約0.22万m³、
処理水(再利用):約0.02万m³、Sr処理水等:約0.02万m³
※3 運用上の上限値
※4 「タンク底部～水位計0%の水量(DS)」は含んでいないが、貯蔵量のDS以上の貯蔵容量がある
※5 表記載の残水量には、「タンク底部～水位計0%の水量(DS)」を含んでいる
濃縮塩水の残水量は多核種除去設備等の処理量より算出
※6 表記はCs-137のデータ
※7 セシウム吸着装置、第二セシウム吸着装置、第三セシウム吸着装置の合計処理量
処理量の内訳: セシウム吸着装置 0 m³
第二セシウム吸着装置 0 m³
第三セシウム吸着装置 2,060 m³
累積処理量の内訳: セシウム吸着装置 394,720 m³
第二セシウム吸着装置 2,099,160 m³
第三セシウム吸着装置 336,920 m³
※8 午前5時時点のデータ
※9 使用済ベッセル内訳: セシウム吸着装置使用済ベッセル 779 本
第二セシウム吸着装置使用済ベッセル 265 本
第三セシウム吸着装置使用済ベッセル 26 本
その他:保管容器 4,482 基
処理カラム 17 塔
使用済ベッセル 267 本
フィルタ類 65 本

※10 溶接タンクに貯蔵されているSr処理水等(ALPS処理前水)の貯蔵量
※11 フランジ型タンクに貯蔵されているSr処理水等(ALPS処理前水)の残水量
※12 溶接タンクに貯蔵されている「ALPS処理水」及び「処理途上水」の貯蔵量
※13 フランジ型タンクに貯蔵されている「処理途上水」の残水量
※14 既設多核種除去設備サンプルタンク(フランジ型タンク)、
増設多核種除去設備一時貯留タンク(溶接タンク)及び、
高性能多核種除去設備一時貯留タンク(溶接タンク)に
貯蔵されている「処理途上水」の貯蔵量
※15 Sr処理水等(ALPS処理前水)を貯蔵していた溶接タンクを
「処理途上水」貯蔵用に再利用。
これらに貯蔵されている「処理途上水」の貯蔵量
(2019年以降に再利用する溶接タンク)
※16 処理水、サンプル水、処理水(再利用)、処理水(残水)各欄の
貯蔵量を合計したものが「ALPS処理水等」の貯蔵量となる
(処理水海洋放出による変動を含む)
※17 廃スラッジと上澄み水の合計値
(午前10時時点のデータ)
※18 SPT(A)からPMB/HTIへの移送を適時実施中
※19 処理水(貯槽)から廃液供給タンクへの移送を適時実施中

2025年6月6日
東京電力ホールディングス(株)

集計期間:2025/5/22 5:00～2025/5/29 5:00

【参考】使用済みベッセルの内訳について

【セシウム吸着装置使用済ベッセル】	**779 本（ 0 本）**
【第二セシウム吸着装置使用済ベッセル】	**265 本（ 0 本）**
【第三セシウム吸着装置使用済ベッセル】	**26 本（ 1 本）**
【保管容器】	**4,482 基（ 1 基）**
【処理カラム】	**17 塔（ 0 塔）**
【使用済ベッセル】	**267 本（ 0 本）**
高性能多核種除去設備:	90 本（ 0 本）
高性能多核種除去設備検証試験装置:	6 本（ 0 本）
モバイル型Sr除去装置:	34 本（ 0 本）
第二モバイル型Sr除去装置:	25 本（ 0 本）
RO濃縮水処理設備:	21 本（ 0 本）
モバイル式処理設備	
使用済み燃料プール浄化:	11 本（ 0 本）
海水配管トレンチ水浄化:	10 本（ 0 本）
サブドレン他浄化設備:	55 本（ 0 本）
放水路浄化設備:	3 本（ 0 本）
浄化ユニット:	12 本（ 0 本）
【フィルタ類】	**65 本（ 0 本）**
モバイル型Sr除去装置:	65 本（ 0 本）

※1:( )内は集計期間の増加量

【参考】多核種除去設備の運転実績について　　集計期間:2025/5/22 5:00～2025/5/29 5:00

系統		処理量[m3]	廃棄物発生量[本]				
			保管容器			処理カラム	吸着塔
			メディア	その他			
既設多核種除去設備	A系	停止中	0	0	0	0	－
	B系	停止中			0	0	
	C系	停止中			0	0	
増設多核種除去設備	A系	534	1	0	0	0	－
	B系	停止中			0	0	
	C系	停止中			0	0	
高性能多核種除去設備		停止中	－	－		－	0
合計※1		534	1	0		0	0

※1:処理量は全て出口積算流量計から算出しており、薬液注入量を含む

※2:処理量(534m3)の内訳はRO濃縮塩水処理量 0m3、Sr処理水処理量 517m3、処理水処理量 0m3、薬液注入量他 17m3※3

※3:処理水を用いて粉体を溶かし生成している薬液量他(0m3)を含む

【参考】その他浄化処理設備(Sr処理水等)の「前回報告比」の内訳

区分	系統	貯蔵量の増加量[m3]※3	備考
増分	セシウム吸着装置等※1	782	建屋滞留水の処理による
減分	多核種除去設備等※2	-517	Sr処理水等<貯槽>の処理による減
合計		265	

※1:セシウム吸着装置、第二セシウム吸着装置及び第三セシウム吸着装置

※2:既設多核種除去設備、高性能多核種除去設備及び増設多核種除去設備

※3:水移送中の水位は静定しないため参考値扱い

【参考】建屋へのウェル/地下水ドレン及びその他移送量

集計期間:2025/5/22 0:00～2025/5/29 0:00

ウェル/地下水ドレン	
移送量[m3]	44

集計期間:2025/5/22 5:00～2025/5/29 5:00

その他[m3]	20

資料7


雨水処理設備の一部解体・撤去について

2025年6月6日


東京電力ホールディングス株式会社

背景

- 長期使用による経年劣化に対し、原子炉冷却用として使用している淡水を安定的に供給できる設備として新設淡水化装置の設置を計画している。
- 新設淡水化装置は下図の位置への設置を計画しており、設備設置前に既存基礎の撤去が必要となるが、**基礎撤去範囲に雨水処理設備の一部が干渉しているため、撤去を計画**する。

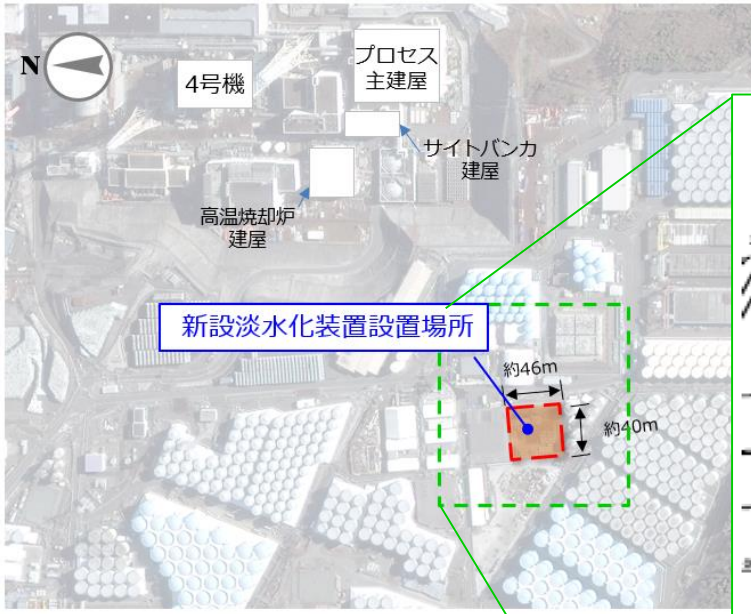


新設淡水化装置設置場所

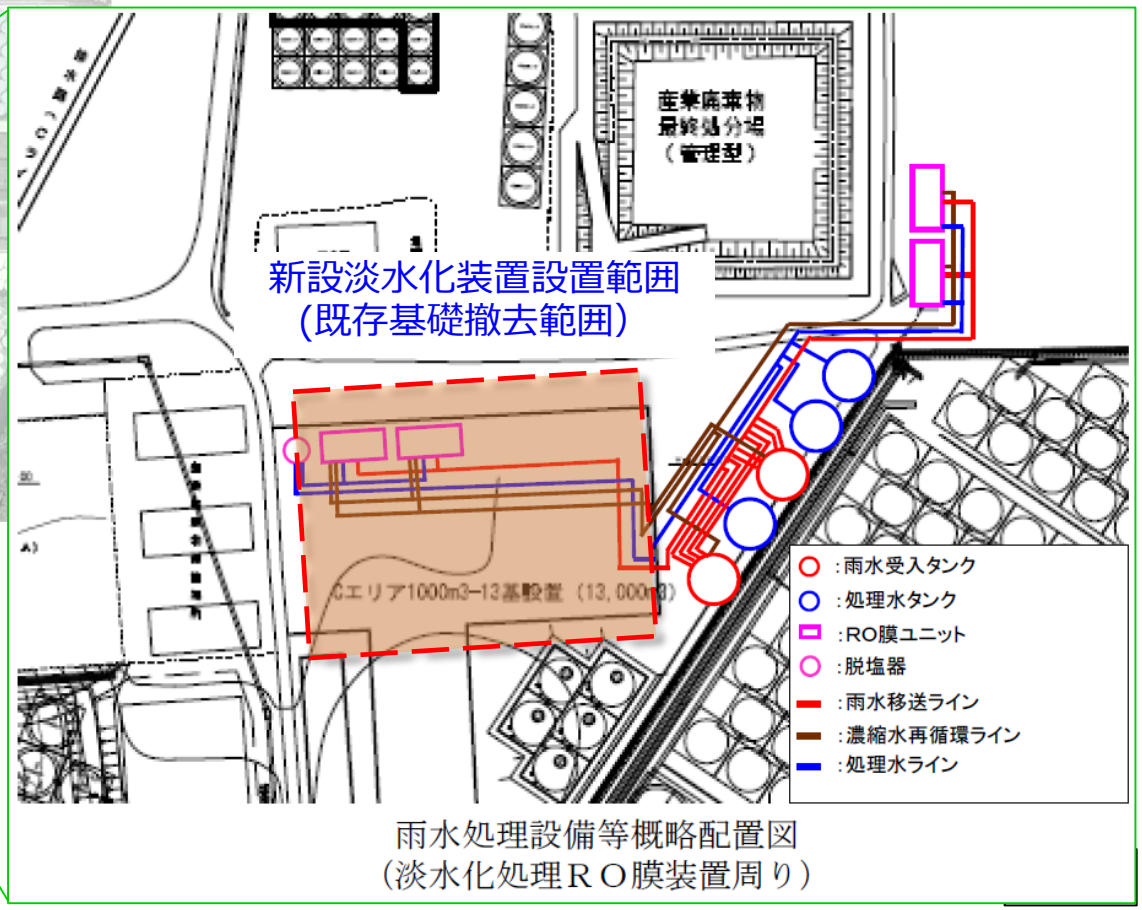

雨水処理設備等概略配置図
(淡水化処理ＲＯ膜装置周り)

雨水処理設備の全体系統図と撤去設備の位置づけ（1/2）


- 実施計画Ⅱ章　第2編-36（雨水処理設備等）としてモバイルRO膜装置と淡水化処理RO膜装置を記載しているが、**今回撤去する機器は淡水化処理RO膜装置の脱塩器、RO膜ユニット（赤枠内）**となる。
- また、当該設備を構成する他設備（RO膜ユニット、タンク）も不要になることから、併せて撤去とすることを計画。

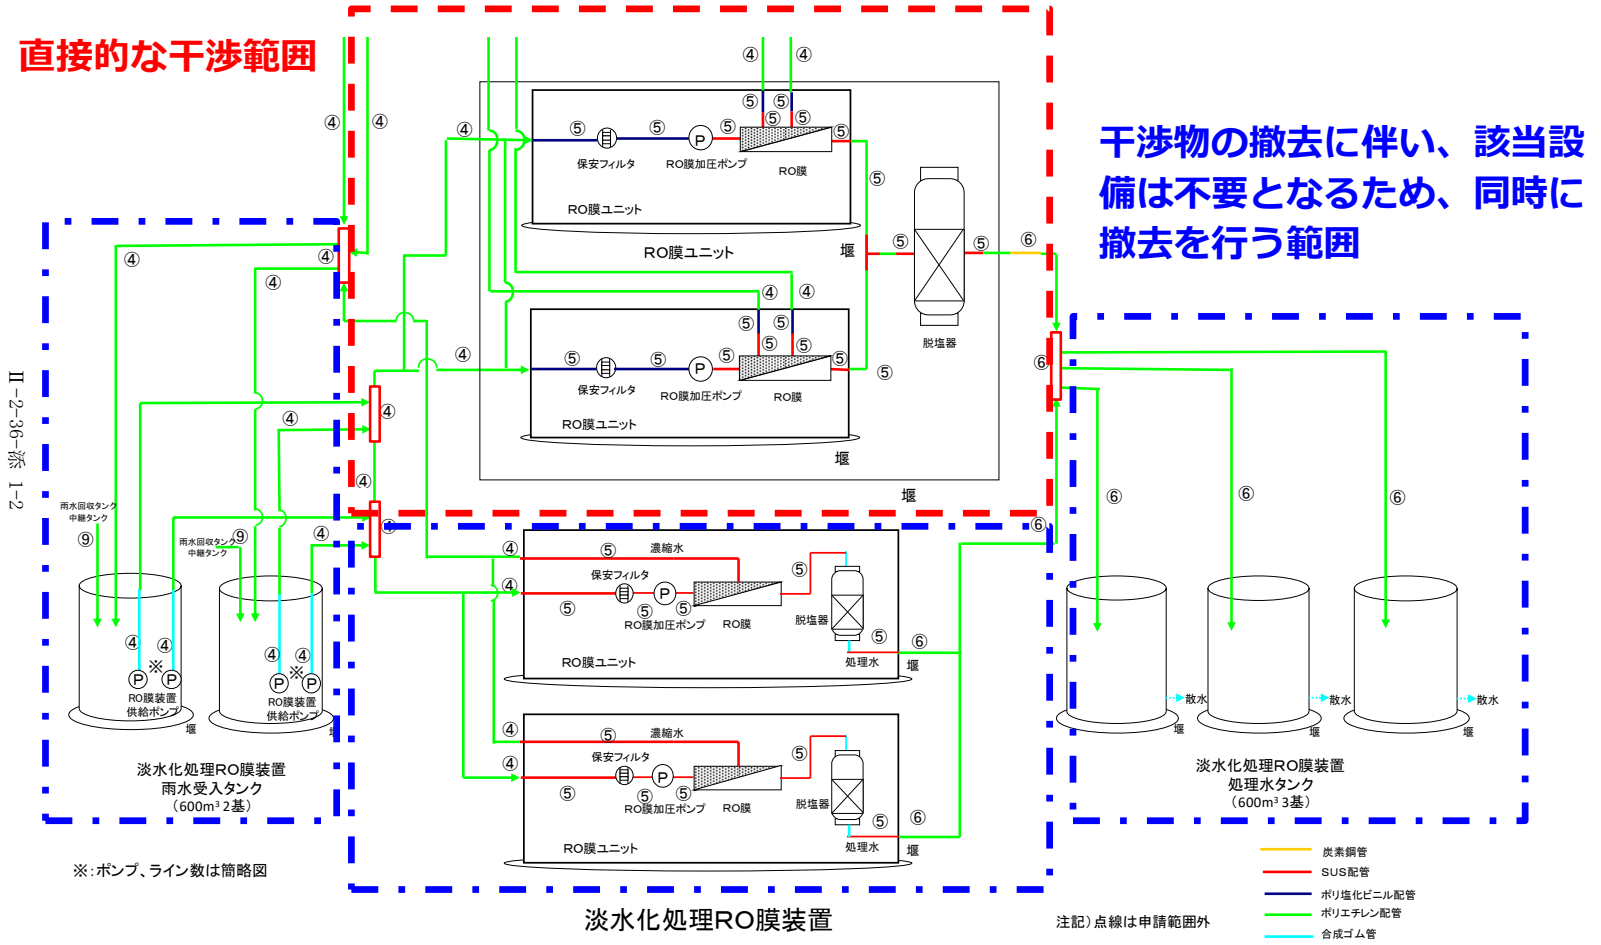

全体概略図（２／４）

雨水設備の全体系統図と撤去設備の位置づけ（2/2）

- P.2を踏まえて、最終的な撤去範囲は下記とすることで計画

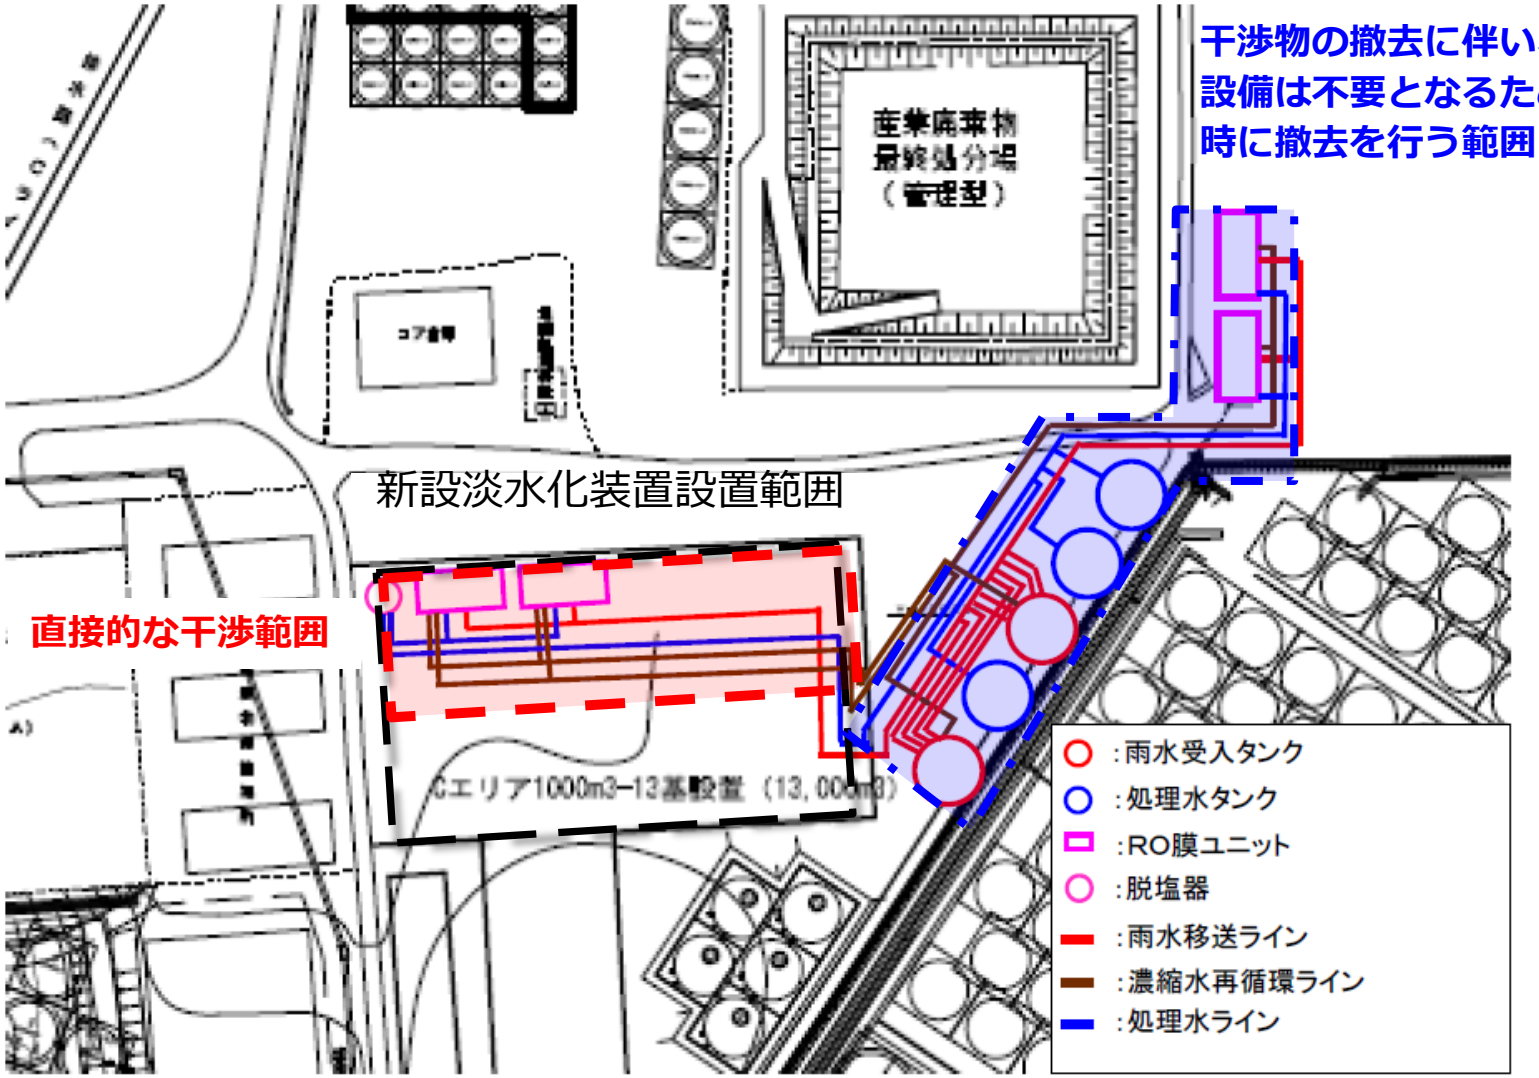

雨水処理設備等概略配置図
（淡水化処理ＲＯ膜装置周り）

当該設備撤去時の構内雨水処理への影響

- 2020/ 3：モバイルRO膜装置（溶接型）の運用開始
- 2020/10：淡水化RO膜装置（フランジ型）及びモバイルRO膜装置（フランジ型）の運用休止※
- 2020/11：モバイルRO膜装置（溶接型）のみの運用開始

※堰内雨水想定量より、モバイルRO膜装置（溶接型）のみの運転で処理が可能と判断したため、運用を休止。

- 堰内雨水想定量
  - 実施計画認可時（約41,200m³／年）に比べて、最新の実績では、約21,600m³となっており、必要処理量は減少している。

	2018年度 (淡水化装置設置時)	2021年度 （淡水化RO膜装置他休止後）	2024年度実績※
①RO処理が必要な堰内雨水量（m³/年）	41,200（設計値）	29,400（想定値）	**約21,600（実績値）**
②モバイルRO膜装置の処理容量※2	10,800×2	14,540×3	14,540×3
③淡水化処理RO膜装置の処理容量※2	21,600	**（休止）**	**（今回撤去を計画）**
差分（(②+③)-①）	**+2,000m³**	**+14,220m³**	**+22,020m³**

※1：堰内雨水の実績量は，下記降水量より，タンクエリア毎の堰内有効面積，雨樋，堰カバー状況を考慮し算出
※2： RO膜装置想定処理量は、８時間／日、15日／月で算出

- 淡水化RO膜装置を撤去した場合の雨水処理量の充足性
  - 2024年度実績21,600m³に比べて、現状の処理容量は43,620m³を確保しており、**休止中の淡水化処理RO膜装置の撤去による影響はないと判断**。
  - なお、台風等により、堰内雨水量が増加した場合は運転時間を延長し、対応する。

解体/撤去の方法

- 解体/撤去の方法は**実施計画Ⅲ章　第3編-6　添付資料20「雨水処理設備等の解体・撤去の方法について」に基づき実施**する。
  - タンク
    - ✓ 必要に応じて汚染拡大防止を図った上で解体・切断し、表面線量率を測定した上で適切な一時保管エリアで保管する。
  - ポンプ
    - ✓ 内包する堰内雨水を水抜きし、雨水処理設備により処理した後に、汚染拡大防止を図った上でポンプとケーブルを解体・分別し、ポンプ全体を養生し、表面線量率を測定した上で適切な一時保管エリアで保管する。
  - 配管
    - ✓ 移送配管を取り外す前には、配管内部の水抜きを実施し、雨水処理設備による処理を行う。また、残水がある場合に備えて、配管取り外し部には受け養生を実施し、汚染拡大防止を図った上で取り外し・切断し、端部養生を行い、表面線量率を測定した上で適切な一時保管エリアで保管する。
  - 汚染拡大防止対策
    - ✓ 解体作業時における汚染拡大防止対策の可否については、解体前にタンク内部のダスト濃度測定を行い、閾値（5×10^{-5}Bq/cm^3）を超過する場合は、汚染拡大防止を図った上で作業を実施する。
  - 被ばく低減対策
    - ✓ タンクの解体においては必要に応じてゴムマット等の養生を行い、被ばく低減を図る。
    - ✓ タンク切断では、可能な限り遠隔作業により、被ばく低減を図る。
    - ✓ 解体作業中にダスト濃度が万が一上昇した場合に備えて全面マスクを着用する。ポンプおよび配管の開放作業時においても、全面マスクを着用して作業を実施する。なお、開放作業時におけるダストの舞い上がりは少ないと考えるものの、適宜、空気中の放射性物質濃度を測定し、必要に応じて遮蔽、局所排風機、ハウスを設置する。また、機器の取り外しまたは切断時においては、開放端部をゴム質のキャップ等で養生し、作業時の被ばく低減を図る。

資料8

１Ｆ－2号機　ＳＦＰオペフロ循環冷却設備設置について

2025.6.6

TEPCO


面談目的：

2号SFPスキマサージタンクの漏洩事象の恒久的対策として，既設配管を使用しない代替冷却設備を西側構台に設置することから設備の概要について報告する。

また，現在冷却に使用している系統の一部を含む配管がオペフロ床面のコンクリートに埋設されており、健全性の確認ができない状況である。健全性の確認が不可となる箇所から漏洩した場合，周囲へ与える影響が大きいことから，漏洩リスクを速やかに低減するため早期に運用を開始したい。


背景

- ２号機使用済燃料プール循環冷却設備については，一次系配管にバイパスラインを設置して冷却運転を継続している。
- 漏えいの原因は異材継手部近傍でのガルバニック腐食が考えられることから，類似箇所の調査および予防保全対策を実施したが，一部アクセスができない箇所があり，予防保全対策や漏えいの際に対応が実施できないことが確認された。
- 恒久的な対策として，これまで既設配管を使用しない代替冷却設備の検討を進めてきた。

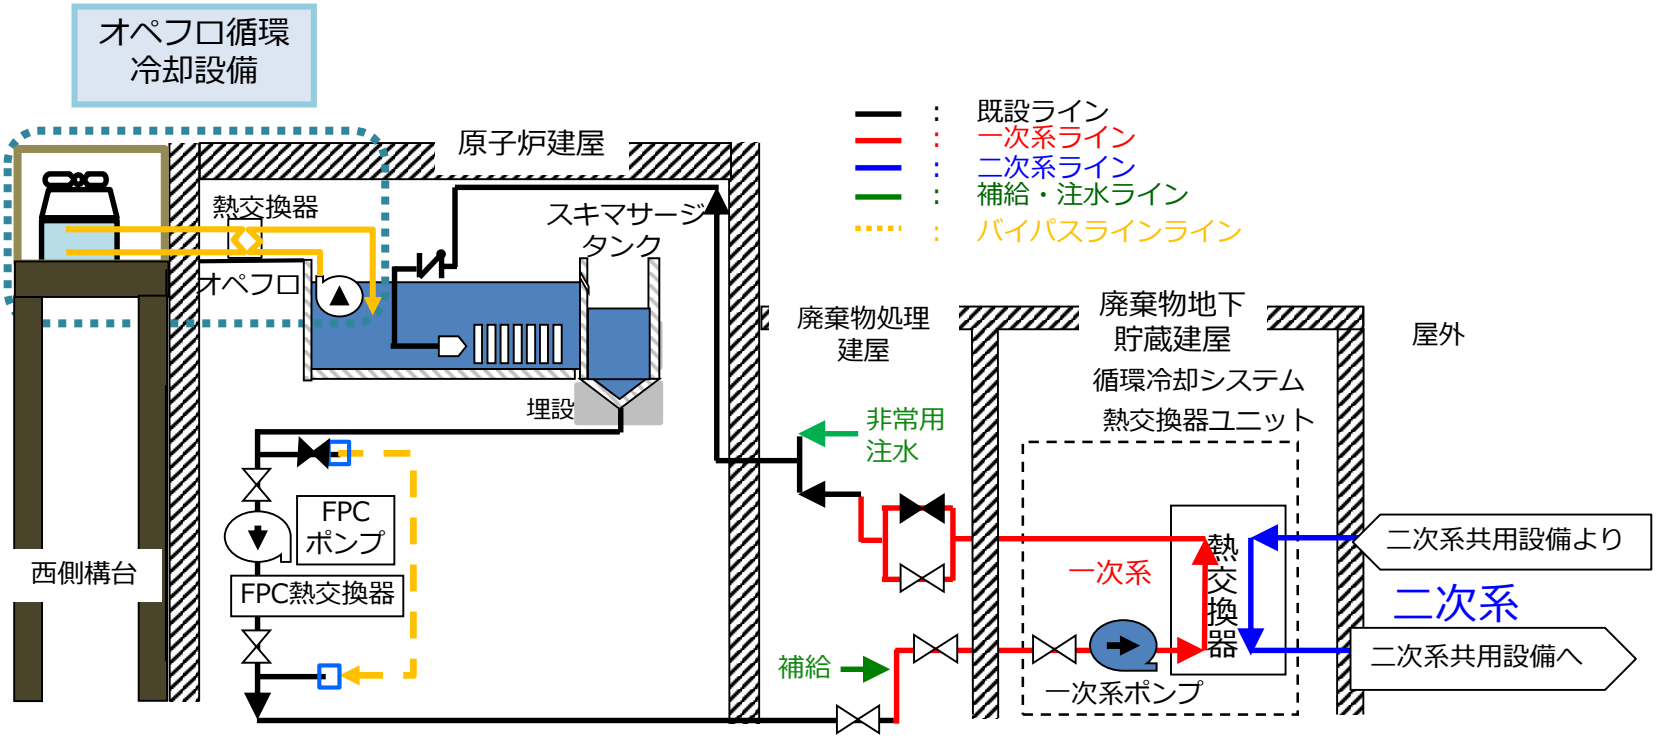


代替冷却設備（恒久的対策）の概要

- 既設配管を使用しない代替冷却設備として１次系配管および熱交換器については原子炉建屋オペフロに設置し、２次系配管およびチラーは西側構台搭載エリアに設置する。
- 本設備は，１ 次冷却設備が水中ポンプ１台，熱交換器１基，配管類，電気・計装設備，２次冷却設備がチラー１基，サージタンク１基，配管類，電気・計装設備から構成される。

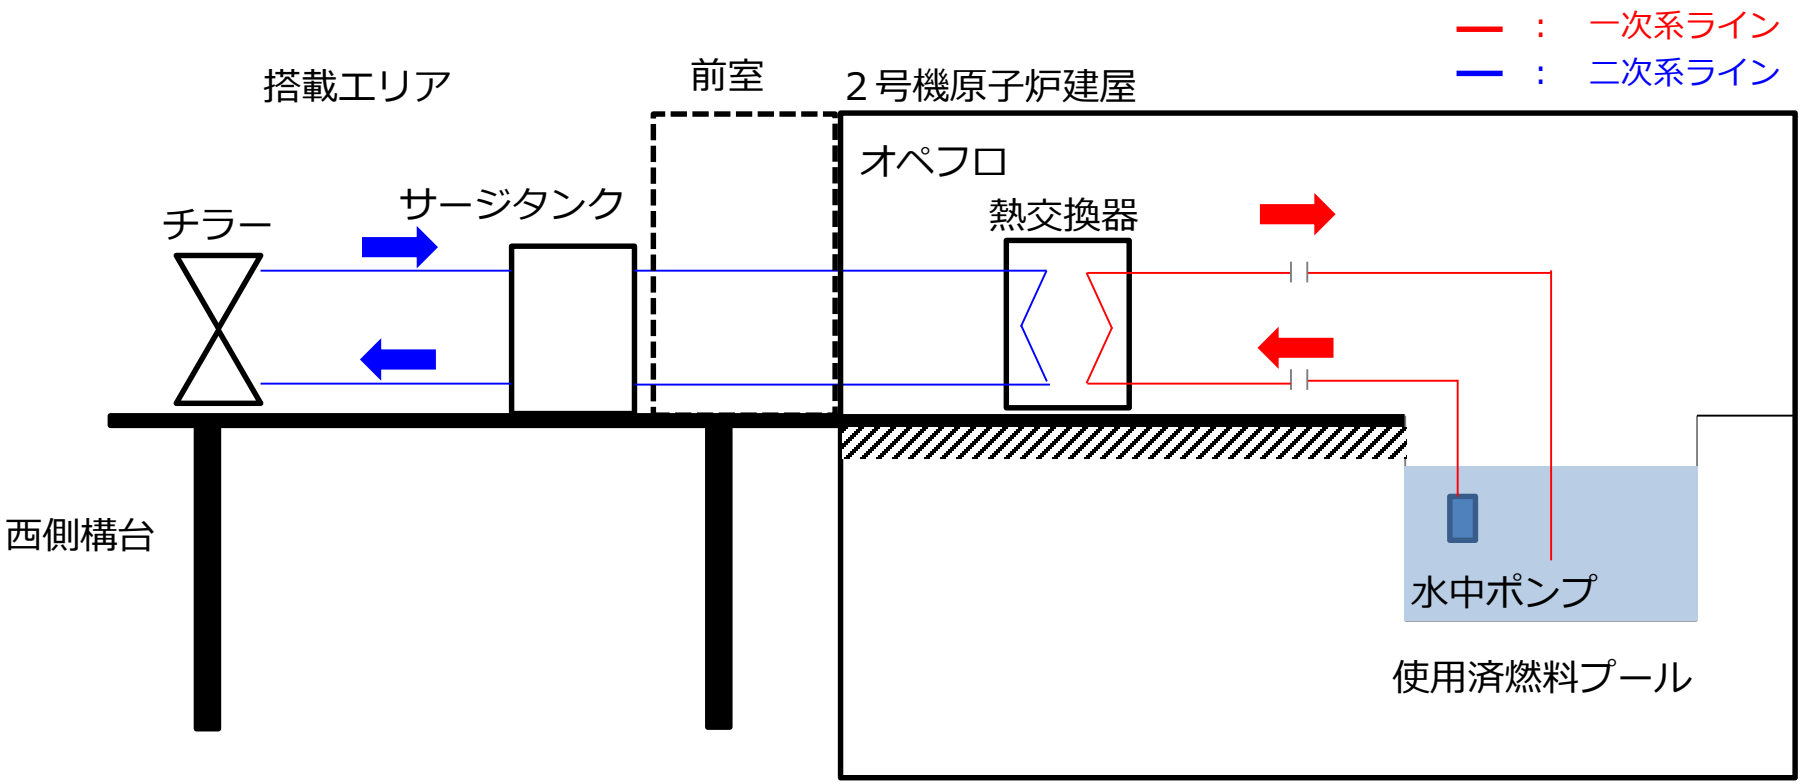

類似配管の調査結果

- 漏えいが確認された配管の類似箇所(異材継手)は今回の漏えい箇所を含め12箇所確認。
- 下図赤枠で示す部分がオペフロ床面コンクリート埋設箇所のため，アクセスができない箇所となっている。

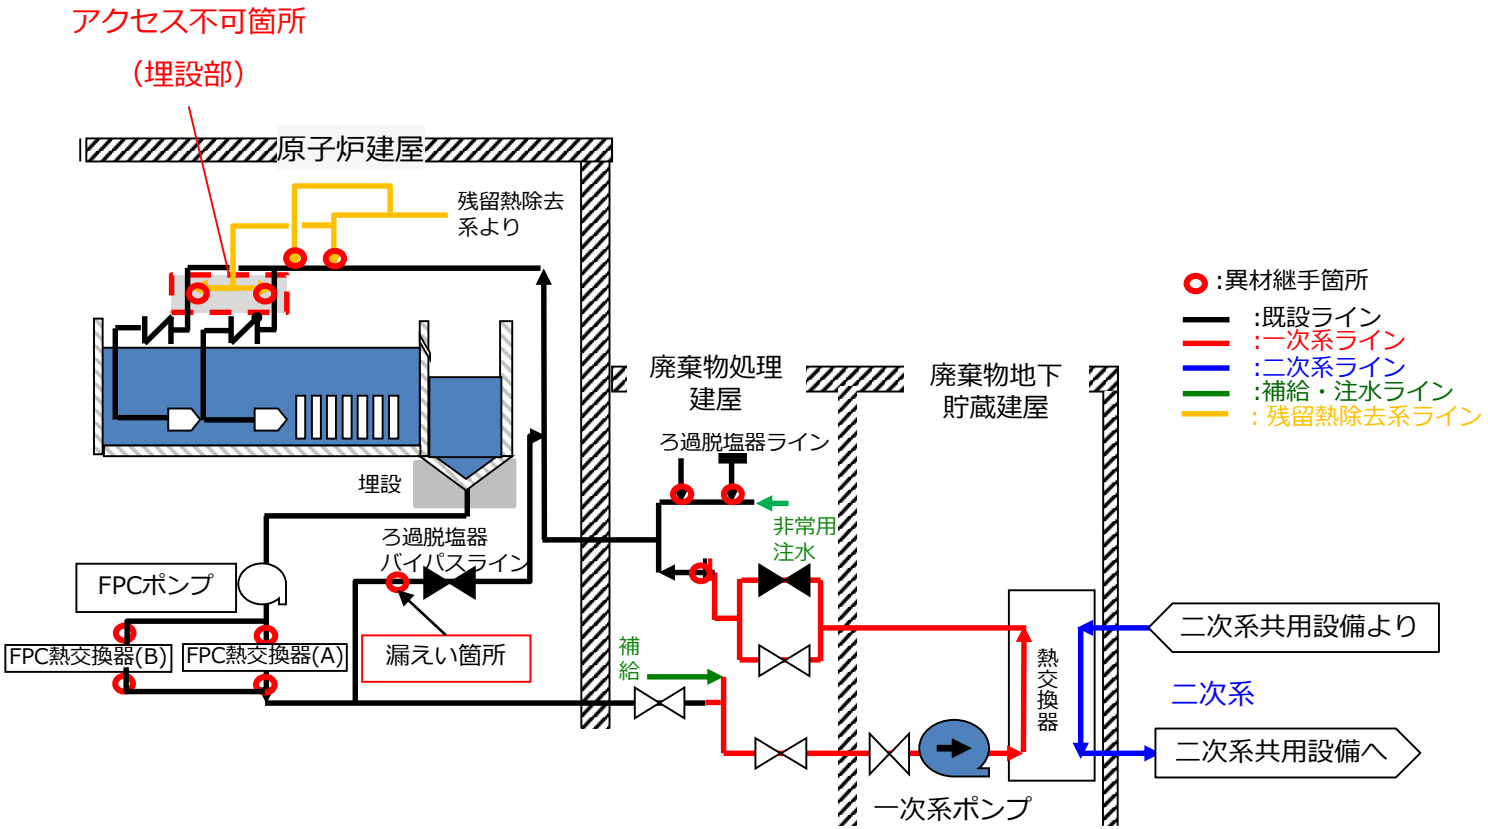

スケジュール（案）

- 現在、冷却に使用している系統の一部を含む配管がオペフロ床面のコンクリートに埋設されており、健全性の確認ができない状況。当該箇所からの漏洩した場合、周囲へ与える影響が大きいことから、漏洩リスクを速やかに低減するため早期に運用を開始したい。



【参考】本装置の冷却能力について

- 使用済燃料プールオペフロ循環冷却設備の必要容量は夏場（2024年）におけるプール水温上昇評価におけるプール水温上昇を考慮した容量とする。
  - ✓ プール水温上昇評価は燃料プール壁体からの放熱を考慮し，水温が高くなるにつれて水温上昇がなだらかとなることから，保守的な条件とするため水温上昇率が大きいプール水温が低い側の5 日間の平均値を用いる。
- 上記の設計条件より，プール水温が最も高くなる夏においても40℃以下に保つことができる設計とする。


下表より，（必要冷却機器容量）＝67 [kW]

（冷却必要量）=A×B×C×T÷ t ÷D÷E≒55.5 [kW] × 余裕率20%

記号	意味	数値	単位
A	プール保有水量	1192	ton
B	密度	10^6	g/ton
C	比熱	1	cal/g・℃
T	プール水温上昇	4.8	℃
t	時間	120	h
D	変換係数	1000	cal/kcal
E	変換係数	860	kcal/kW

【参考】運転上の制限温度について

- 2025年度以降の温度上昇評価では夏場（８月を想定）に一次冷却系が全停となった場合でも運転上の制限である65℃（コンクリートの温度制限値）を大きく下回り50℃以下で推移することを確認している。
- 制限温度が60℃の機器（水中ポンプにおけるモーター部分）を使用することから，２号機の運転上の制限温度（65℃）について１号機と同様の60℃（使用済燃料プール循環冷却設備における最高使用温度）に変更する。

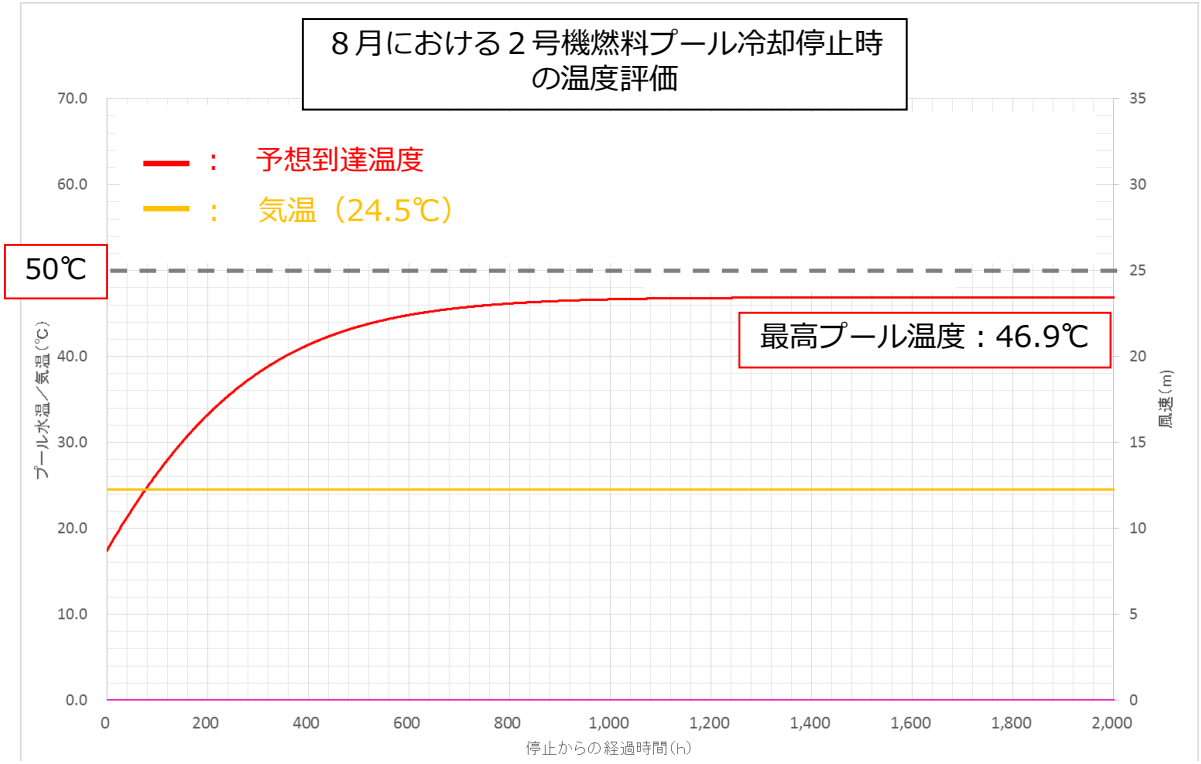

評価条件

停止時プール水温	17.4℃
気温	24.5℃

【参考】方針（耐震クラスについて）


- 耐震クラスは設備が内包するインベントリ量が小さいことを踏まえＣクラスとする。
（線量評価については別途実施する。）
- 波及的影響により他の設備に影響が出ないことを確認する。

使用済燃料プール　インベントリ（２０１８年１０月以降の最大値）

項目	単位	数値
Cs-134	Bq/L	2.675E+04
Cs-137	Bq/L	7.238E+05
Co-60	Bq/L	7.451E+02

【参考】耐震フロー

資料４－３

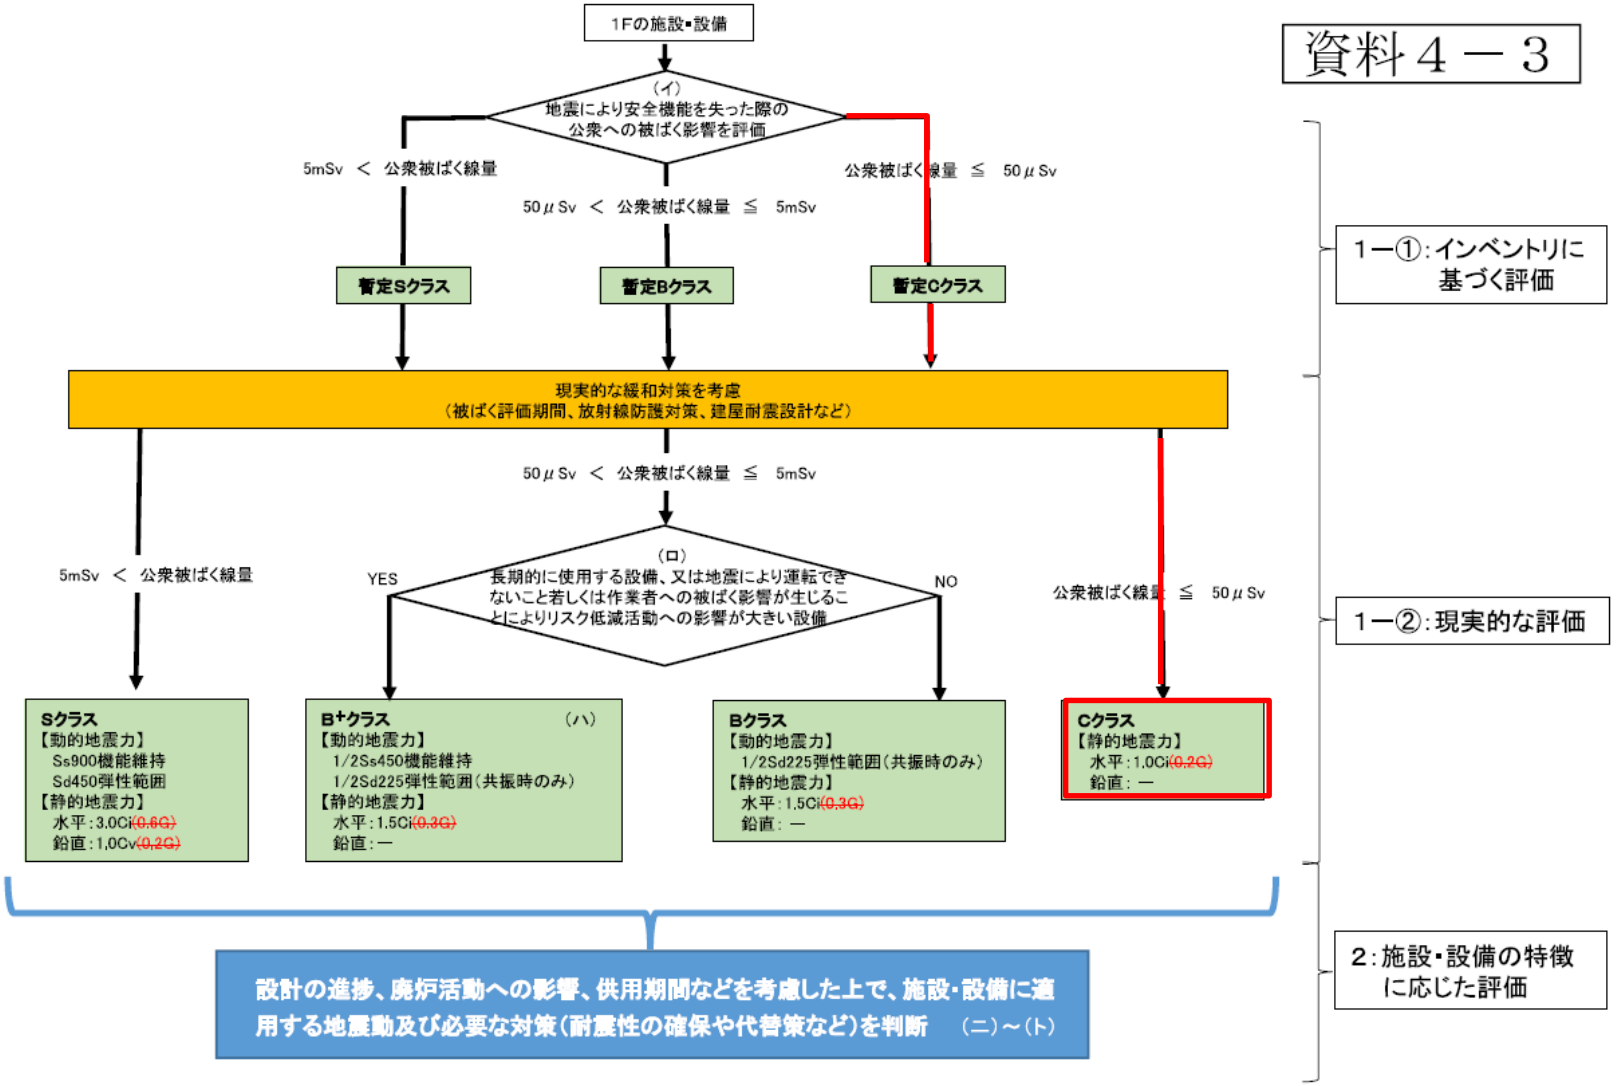


令和４年度第51回原子力規制委員会資料３別紙「東京電力福島第一原子力発電所における耐震クラス分類と地震動の適用の考え方」から一部抜粋・追記

【参考】新規設備運用後の既設設備の廃止について

- オペフロ循環冷却設備を設置・運用した後は，最終的に既設の循環冷却ラインについてはスキマサージタンク下流のバルブを閉とし系統水を抜き取り，使用済燃料プールの水位を適切な水位にまで低下させスキマサージタンクにプール水がオーバーフローしないようにすることで運用を停止する。なお，水位の監視方法については今後検討する。
- 既設循環冷却ラインは運用停止とした上で実施計画から削除する。（別途実施）

冷却ユニット

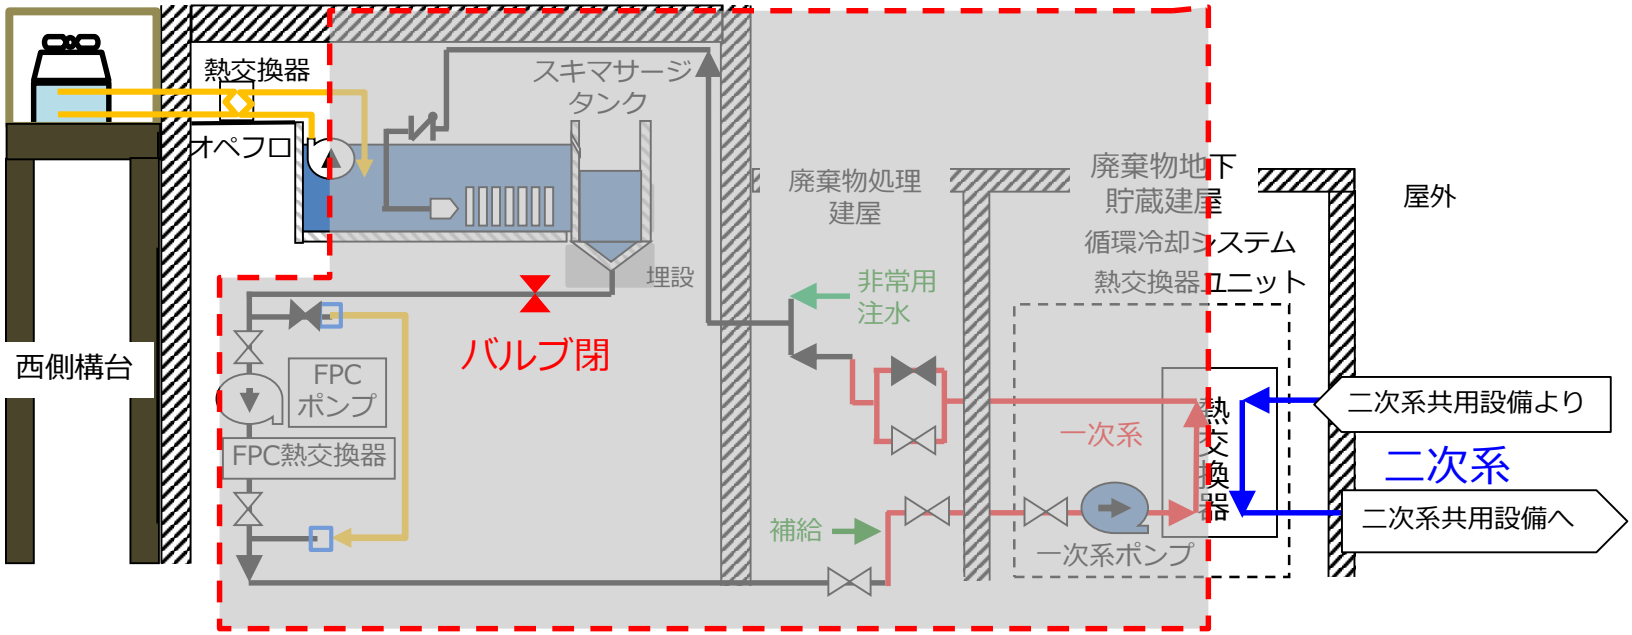


新規設備運用後，運用停止および実施計画から削除する範囲

【参考】線量低減対策について①

- 本設備の１次系配管および熱交換器については，設備をオペフロ内の遮蔽ボックス近傍および衝立遮蔽近傍に設置することで作業員の被ばく低減を図る。


１次系配管および熱交換器設置予定位置

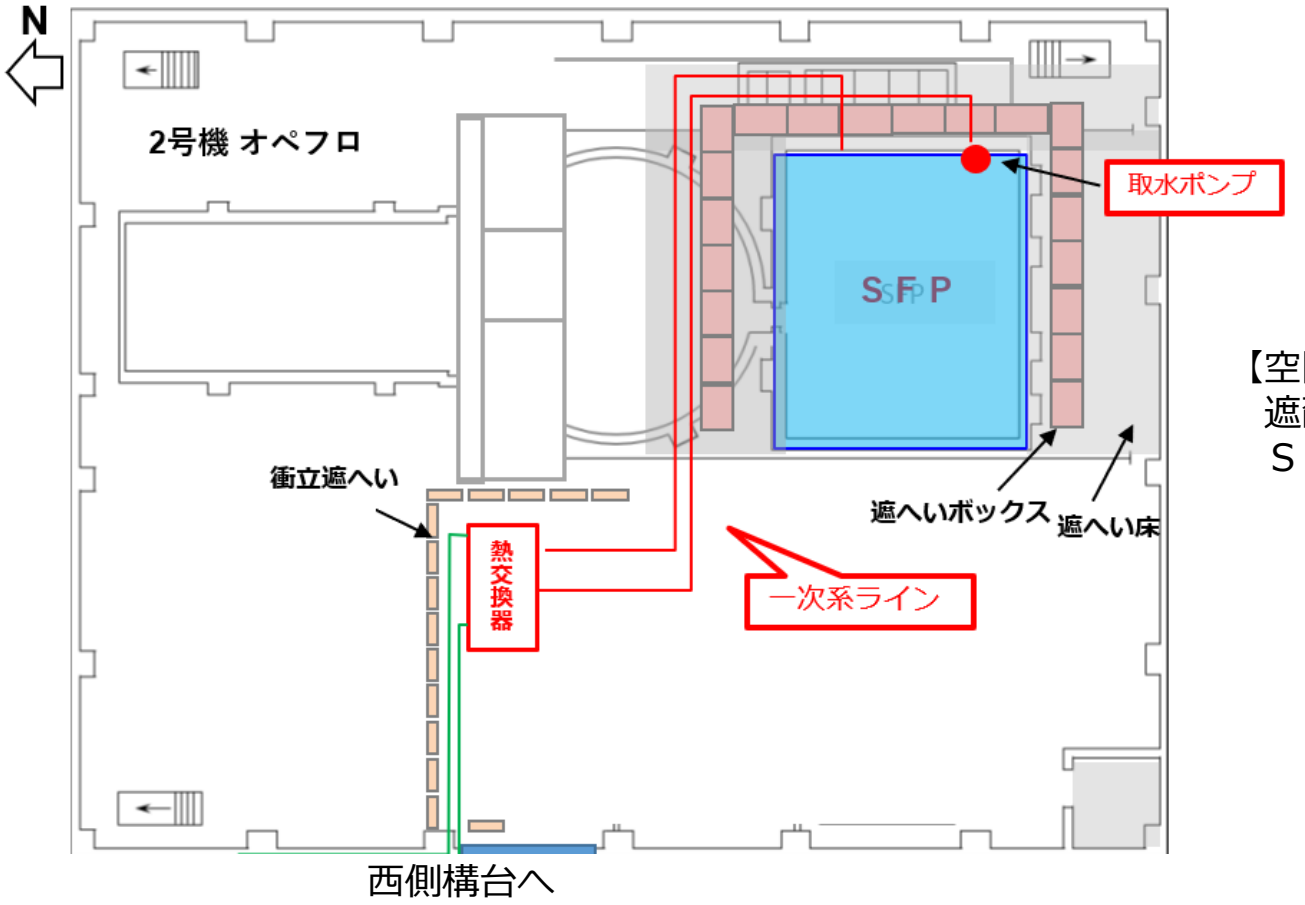

【空間線量（単位：mSv/h ）】
遮蔽ボックス内：0.4～0.8
ＳＦＰ廻り：4.0～13.0

【参考】線量低減対策について②

- 西側構台における２次系配管については，西側構台前室の外通路を活用して布設することで被ばく低減を図る方針。

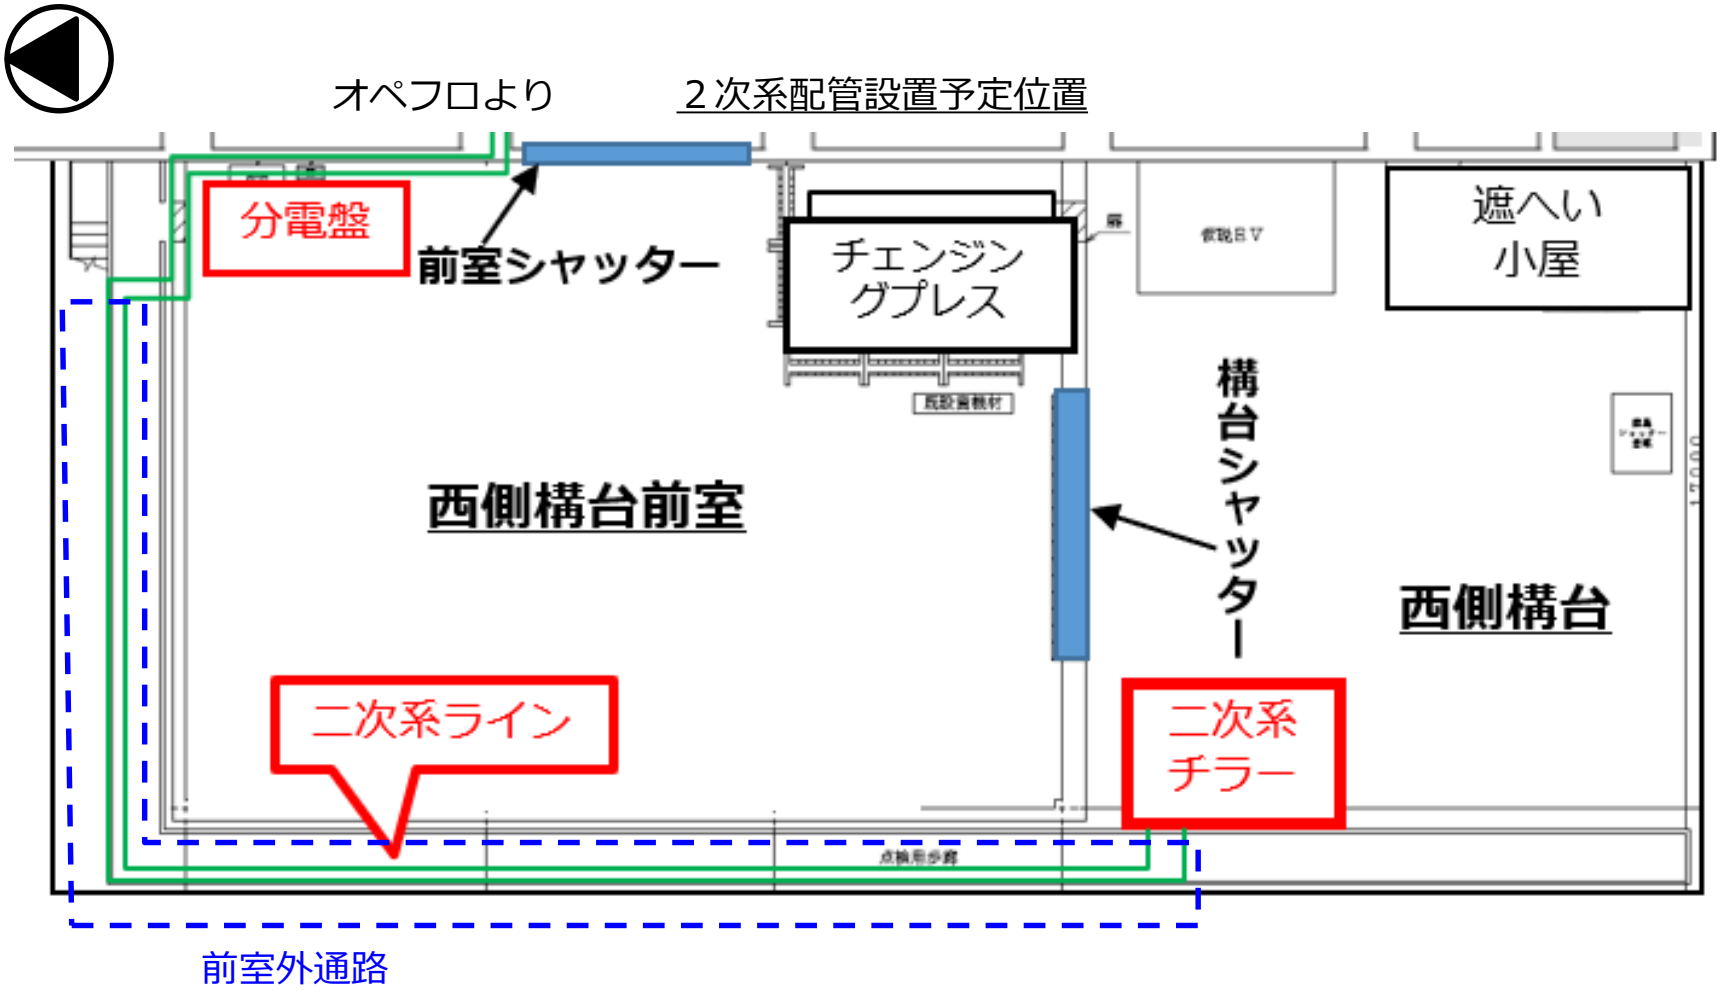

資料9

3/4号機排気筒解体について

2025.6.6

東京電力ホールディングス株式会社

1．背景・ご報告事項

TEPCO

＜背景＞

■2023年8月の規制庁面談にて３/４号機排気筒解体について説明し，以下2点のコメントを頂いている。

①今後、具体的な作業手順や詳細なダスト対策等が定まり次第、報告すること。

②今回説明した実施計画で定めている以外の特殊な工法や対策等を実施する場合についても速やかに報告すること。

■2024年6月に3/4号機排気筒の筒身切断作業時における線量影響及びダスト飛散防止対策の詳細検討のため，筒身の内部線量調査を実施したところ， 3/4号機排気筒周辺の雰囲気線量よりも低い値であることを確認した。

また，周辺の環境整備が進み，雰囲気線量が低減されていることを確認した。

＜ご報告事項＞

■2023年8月のコメント回答として、以下、2点についてご報告する。

①3/4号機排気筒解体における工法の作業方針とダスト対策について

②解体の工法は，実施計画で定める工法を適用すること

2．経緯

2023.8

- **規制庁面談（前回）**
  - 「実施計画の変更申請は不要。工法確定後再度報告するように。」

2024.6

- **3/4号排気筒雰囲気線量調査**
  - 筒身内部線量および雰囲気線量は，1/2号機排気筒と比較して低いため有人による切断で解体が可能と判断

2025.2

- **工法確定**
  - 具体的な作業方針や詳細なダスト対策方針が確定
  - 解体の工法は，実施計画で定める工法を適用する


3－1．3/4号機排気筒解体計画の概要

■燃料デブリ取出設備等の敷地確保のため，3/4号機排気筒の解体・撤去を行う。


■解体工事のスコープ

- 3/4号機排気筒の地上部及び内部のSGTS配管
- 3/4号機排気筒から4号T/Bまでの間の主排気ダクト及び地上部のSGTS配管

1. 3/4号機主排気ダクト：3号機側は除却済のため，4号機側のみ
2. SGTS配管：4号機R/B－3/4号機排気筒間
3. 3/4号機排気筒：上部，下部

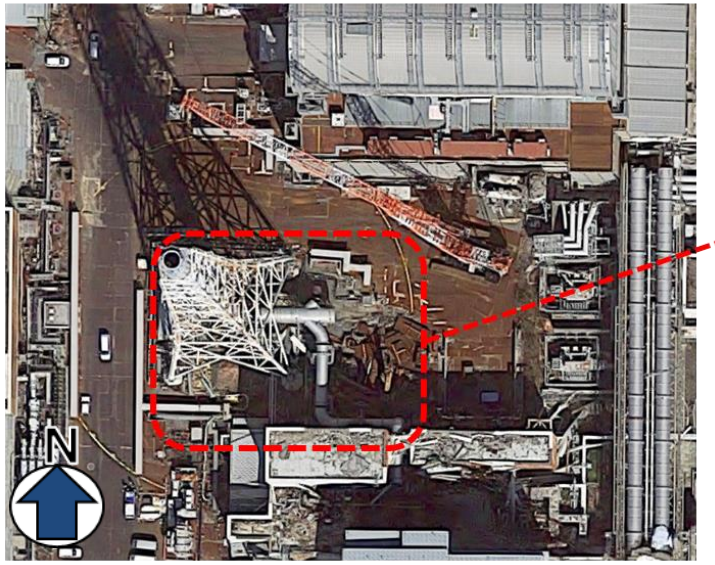


対象エリア

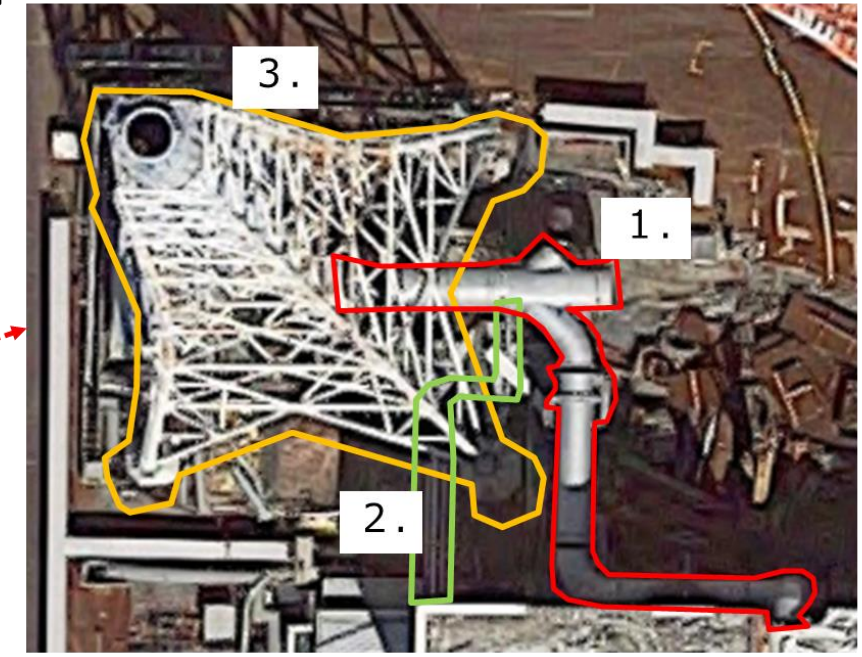


除却対象

3－2．3/4号機排気筒解体計画の概要

- 3/4号機排気筒は1/2号機排気筒とほぼ同じ構造である。（ただし，3/4号機排気筒は筒身内にSGTS配管が存在）
- 筒身内部線量および雰囲気線量は，1/2号機排気筒と比較して低いため有人による切断で解体が可能と判断。
- 排気筒高さ：GL+120.00m
- クライミングするマストに設置したステージ上で切断を実施し，作業進捗に合わせてステージをジャッキダウンする**ワークステーション工法**による解体を実施する。

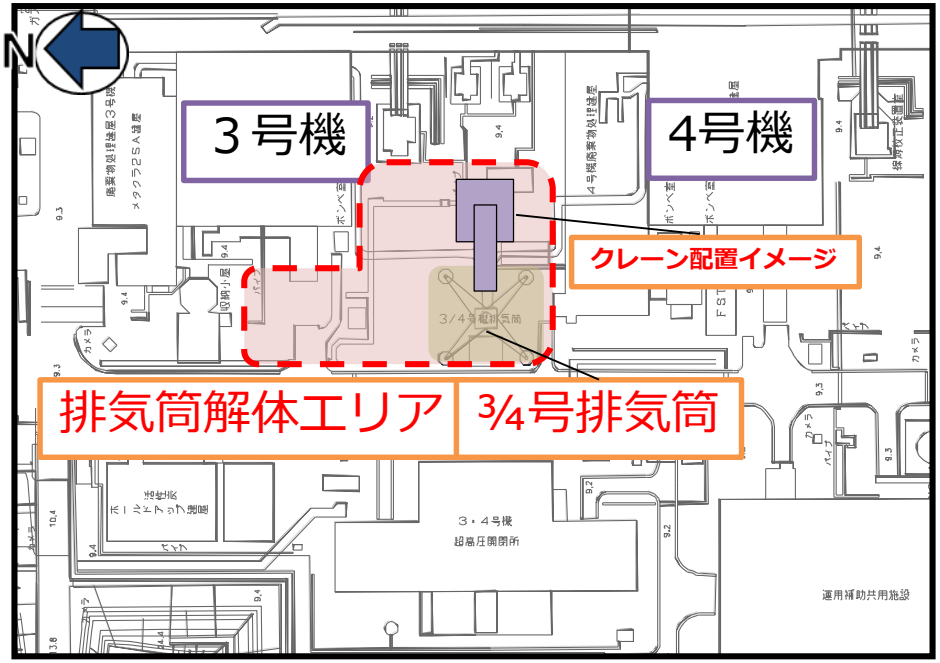

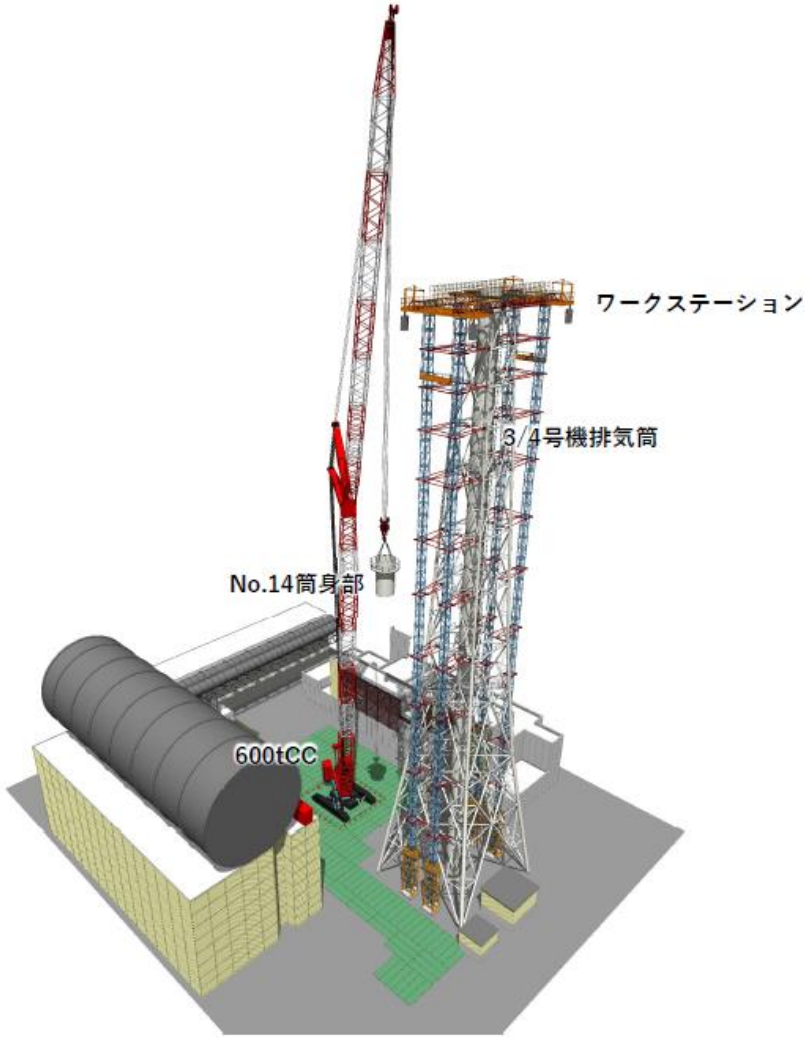


排気筒解体イメージ


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

4．採用する工法

■3/4号機排気筒はクライミングするマストに設置したステージ上で**切断**し，作業進捗に合わせてステージをジャッキダウンする**ワークステーション工法**による解体を実施する。

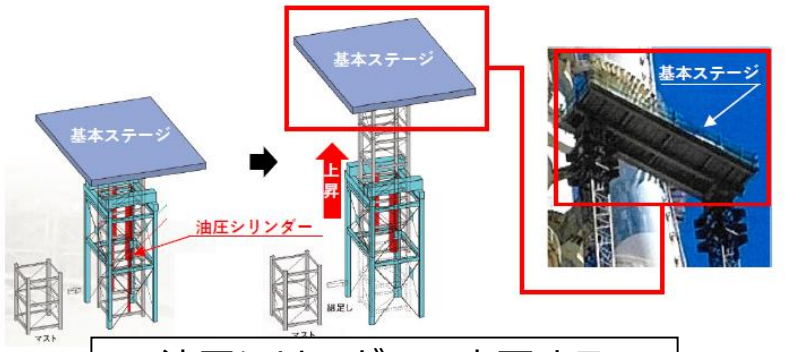


油圧シリンダーで上下する
基本ステージを筒身周辺に設置

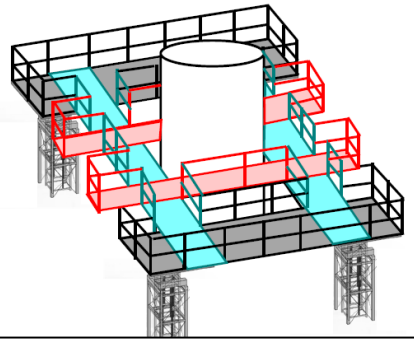

切断位置に合わせて基本ステージの上にワークステーション（足場）を設置

作業進捗に合わせてステージをジャッキダウンさせる
最下部については地上重機での解体を実施する

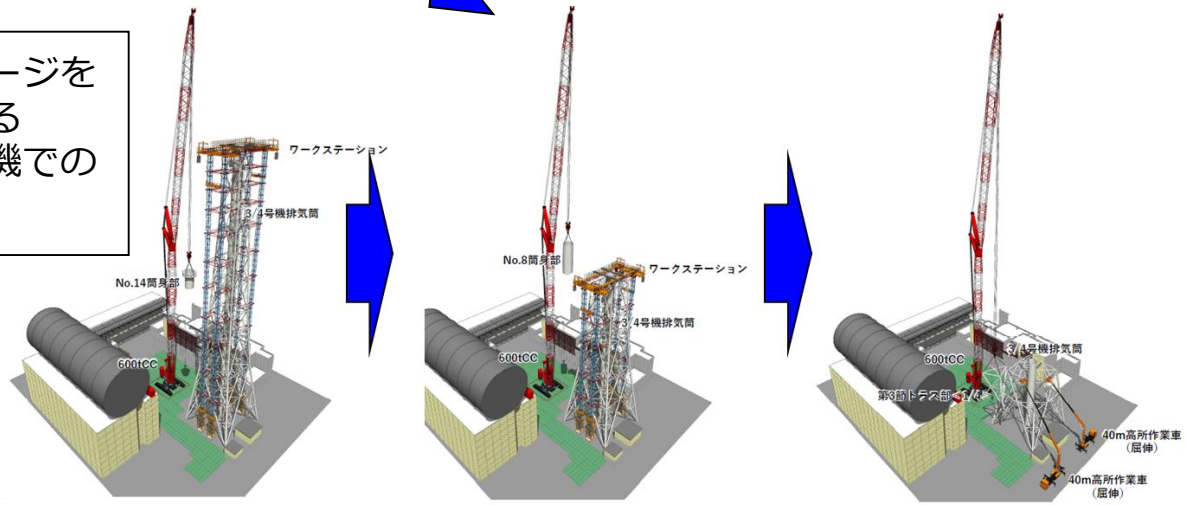

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

5．ダスト飛散対策

■ ダスト飛散防止対策

筒身内に飛散防止剤の散布，吸引装置による吸引，仮設ダストモニタによりダストの飛散状況を測定する。

（画像はイメージ。実際に使用する機器や飛散防止剤，噴霧箇所や範囲については今後の詳細検討にて決定する。）



噴霧器（イメージ）




ダスト飛散防止剤
（アスベスト飛散防止剤）
※製品イメージ



仮設ダストモニタ（イメージ）

6．スケジュール概案

■ 工事スケジュールは以下の通り。

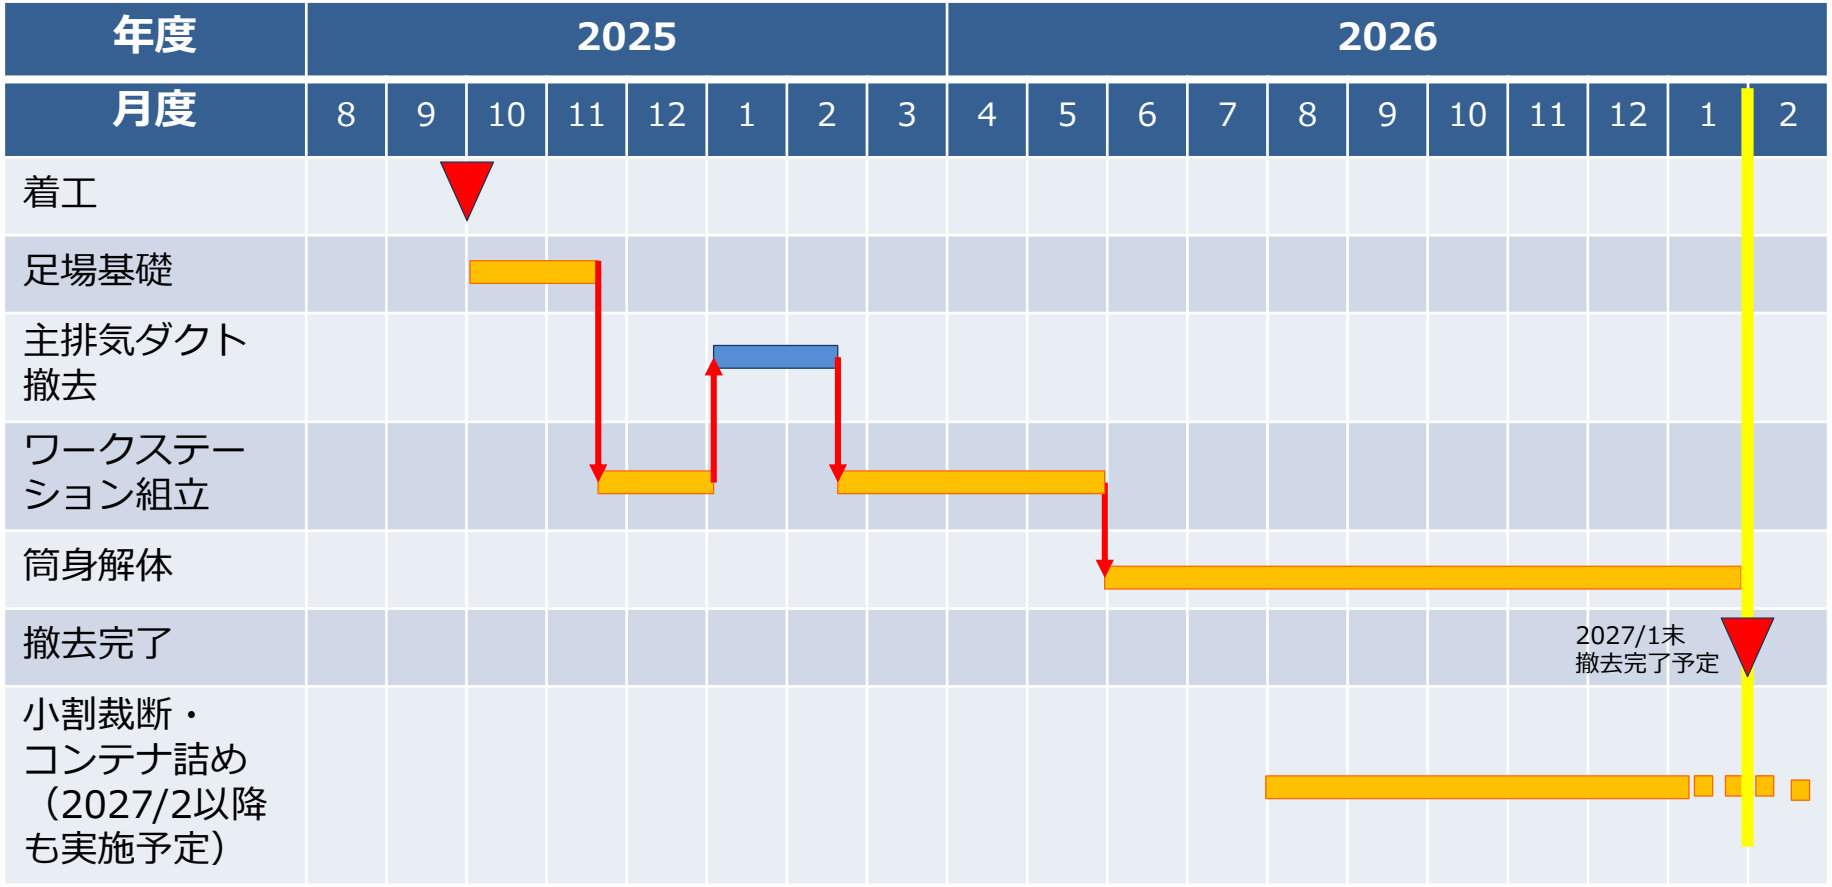

※ 工程については今後変更の可能性があります。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.


参考資料

【参考】１．解体施設の実施計画変更認可申請の要否判断

TEPCO

＜判断フロー＞

3/4号機排気筒は，実施計画上の機能を有する施設に**該当しない**

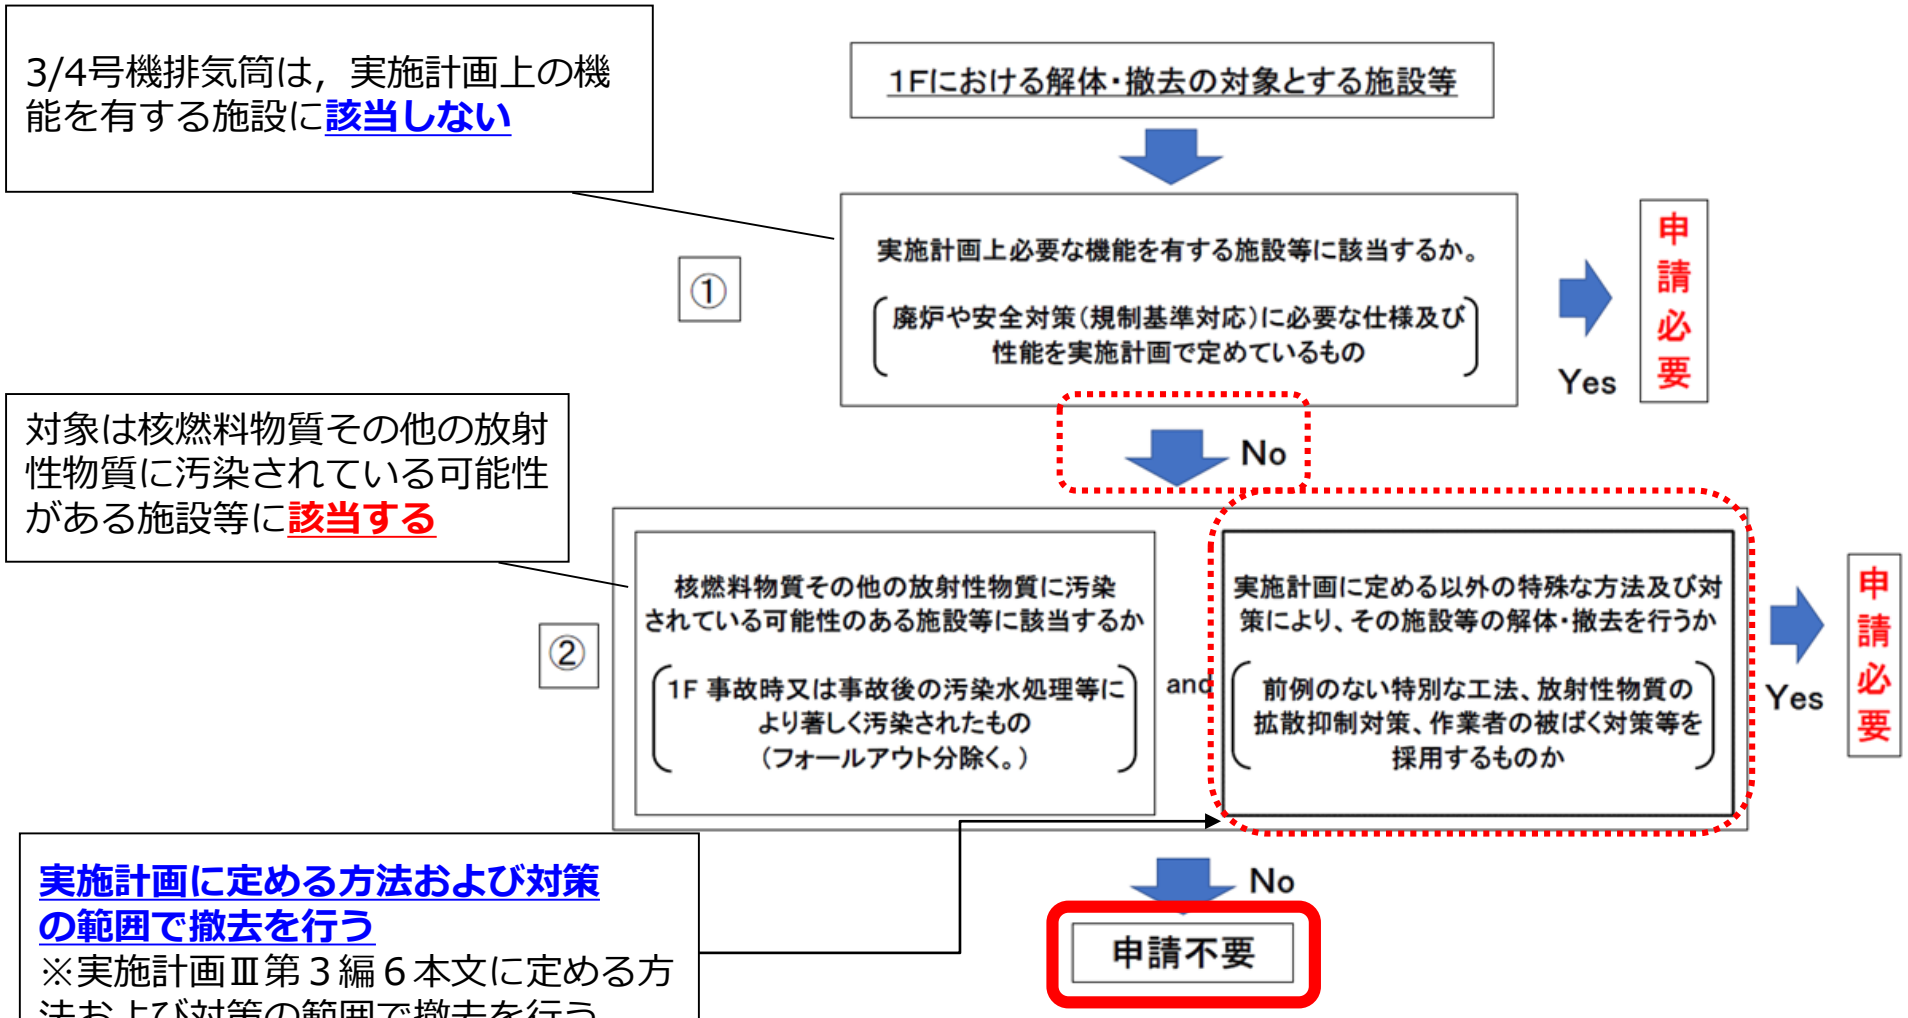

実施計画に定める方法および対策の範囲で撤去を行う

※実施計画Ⅲ第３編６本文に定める方法および対策の範囲で撤去を行う。

【参考】２．既認可に準じた方法について①

■ 3/4号機排気筒解体については，下記の通り実施計画実施計画Ⅲ 第３編６本文の解体方法に準じて実施する。

項目	今回
解体撤去に伴う事前調査及び事前確認	稼働中の周辺設備に影響を与えないことを図面および現場調査にて確認し，現場状況に応じた設備の移設や物的防護等の適切な措置を計画する。 • 事前調査及び事前確認を踏まえ，作業計画を立てるとともに，現場環境及び対象設備等の材質に適した工具・装置・工法を採用する。 • 現場状況に応じて，火気を使用する工法を選定する場合は，十分な火災防護対策を講じたうえで使用する。 • 現場状況に応じて，現場状況をできる限り再現したモックアップ・トレーニングを実施し，作業上で想定されるリスクの事前抽出とその対策を行い，作業員の安全確保，漏えい及び汚染拡大防止に努めるとともに，作業の成立性の確認を行う。
漏えい防止対策，汚染拡大防止対策	残水回収・移送作業 • ホース（仮設ホース含む）を使用する場合は，ホースの継手が脱落しないようロッ ク機構を有するものを使用し，確実にロックされていることを確認する。さらに番線等で固縛して，継手の外れ防止を行う。また，ホースの継手は，養生もしくは水 受け・堰等を設け,漏えい時に残水を受けられるようにし，現場状況（狭隘等）に 応じて可能な範囲で漏えい検知器を設置する。ホースは設置環境（耐紫外線性等） に応じて，二重構造型を使用し，漏えいの拡大防止を図る。 • 残水回収作業にバキュームカーを使用する場合は，バキュームカーとホース（仮設 ホース含む）の継手が脱落しないようロック機構を有するものを使用し，確実に口 ックされていることを確認する。さらに番線等で固縛して，継手の外れ防止を行う。 また，バキュームカーとホースの継手に水受けを設け，漏えい時に残水を受けられ るようにする。 • 残水回収・移送作業中は，作業員による常時監視を行う。 • 万が一，漏えいが発生した場合は，速やかに作業を中断し，漏えい水の回収を行う。

【参考】２．既認可に準じた方法について②

■ 3/4号機排気筒解体については，下記の通り実施計画実施計画Ⅲ 第３編６本文の解体方法に準じて実施する。

項目	今回
漏えい防止対策， 汚染拡大防止対策	配管の開放・切断作業 • 配管の開放・配管切断前に，系統の隔離措置及び水抜きを行う。 • 配管の開放・配管切断箇所の下部に水受け，養生を設ける。 • 配管の開放端部は閉止措置を行う。
	解体撤去作業 • 解体物は，線量，種類，形状，性状等に応じて，周辺の汚染レベルを上昇させないよう養生または保管容器へ収容を行い保管等を実施する。（再利用・再使用可能な解体物を除く） • 屋外での解体撤去作業においては，降雨により汚染を拡大させないためにハウスの設置等の汚染拡大防止の措置を講じる。
落下防止対策	解体撤去作業 • 解体物は，線量，種類，形状，性状等に応じて，周辺の汚染レベルを上昇させないよう養生または保管容器へ収容を行い保管等を実施する。（再利用・再使用可能な解体物を除く） • 屋外での解体撤去作業においては，降雨により汚染を拡大させないためにハウス の設置等の汚染拡大防止の措置を講じる。

【参考】２．既認可に準じた方法について③

■ 3/4号機排気筒解体については，下記の通り実施計画実施計画Ⅲ 第３編６本文の解体方法に準じて実施する。

項目	今回
放射性物質の飛散抑制策	• 切断・解体作業においては，必要に応じて，局所排風機，吸引装置等を設置する。 • 屋外作業となる場合は，強風時は作業を中断する。 • タンク等の内部を洗浄する場合は，タンク等の内表面を散水し，表面の汚染を可能な限り洗い流す。 • 切断・解体作業においては，必要に応じて，ハウス，飛散防止カバー等を設置する。 • ハウス等の側面に物品搬出入口を設ける場合は，搬出入口は作業計画上で必要となる最小サイズとし，開閉可能かつ，閉止時にダストが通過しない構造のカバーを取付け，人が出入りする際，物品搬出入する際以外はカバーを閉止する。また，物品搬出入する際は作業を中断する。 • ダスト飛散が想定される作業中は，放射性ダストモニタを設置しダスト濃度を定期的に確認する。また，飛散防止剤の散布または散水等を定期的に実施し，ダストの飛散を抑制する。 • 作業中にダスト濃度の異常を検知した場合は，速やかに作業を中断し，ダスト飛散元の養生や飛散防止剤の散布または散水等を実施し，測定値が通常時に戻ったことを確認してから再開する。測定値が通常時に戻らない場合には，作業を中止する。その後， 原因を調査し，必要な対策を講じたうえで再開する。 • 高線量配管を切断する場合は，配管切断箇所及び小割箇所へ発泡ウレタンを注入し，ウレタン注入箇所を切断する等の配管内部のダストを気中に飛散させないための措置を講じる。 • 解体開口部からの放射性物質の飛散により，周辺に汚染を拡大させないように養生を実施する。 • 解体物を仮置きする場合は，転倒防止が起きないよう確実に固縛する。

【参考】２．既認可に準じた方法について④

■ 3/4号機排気筒解体については，下記の通り実施計画実施計画Ⅲ 第３編６本文の解体方法に準じて実施する。

項目	今回
被ばく低減対策	• 作業エリアの区画を実施する。 • 作業エリアの空間線量率を測定し表示する。 • 可能な限り遠隔操作を利用する。 • 作業前に除染作業もしくは適切な遮蔽を設置する。 • 遮へいベスト，遮へいスーツ，全面マスク等の作業に応じた適切な装備を着用する。 • 作業エリア近傍に遮へい効果のある退避場所を設置し，被ばく低減を図る。 • 作業時間管理・作業員ローテーションによる被ばく低減を図る。 • 工事期間中作業実施の都度，現状の放射線防護措置の計画が最適であるかを確認し，必要に応じて，放射線防護措置の計画及び計画線量の見直しの必要性を検討する。 • 解体物を仮置きする場合は，仮置きに伴ってエリア周辺における作業員の被ばく線量が増加するのを防止するために，設置可能な範囲で最大限の距離を取って区画をするとともに，線量率表示による注意喚起を通して被ばく低減を図る。
放射性固体廃棄物等の管理	解体撤去に伴い発生する放射性固体廃棄物等は，その性状に応じて適切に処理することを含む作業計画が決まり次第，速やかに，十分な保管容量を確保できることを評価する。 また，「Ⅲ 第 3 編 2.1.1 放射性固体廃棄物等の管理」に従い，線量，種類で分類しできるだけ減容した上で，屋内保管施設（又は一時保管エリア）で保管する。
緊急時の安全避難	緊急時の避難指示は，「Ⅱ 1.13 緊急時対策」規定のもと，緊急放送等により施設内に周知することになっているが，緊急放送等が聞こえないエリアでの作業が存在することも考えられる為，作業前の現場調査にて緊急時の退避通路を確認する。
自然現象への考慮	解体撤去は，実施計画上必要な機能を有しない設備・機器の解体撤去であり，設計における自然現象への考慮事項はない。ただし，解体撤去の作業期間において，自然現象（地震， 津波，豪雨，台風，竜巻等）がもたらす影響として，解体物，工具・装置・重機等の飛散や転倒が考えられる為，解体物の速やかな保管（仮置き時は確実な固縛措置等），作業終了後 の現場の整理整頓を行うことで，自然現象がもたらす影響を可能な限り低減するよう努める。

前回面談資料

3/4号機排気筒解体について

2023.8.4

東京電力ホールディングス株式会社

1．背景・ご相談事項

前回面談資料

TEPCO

＜背景＞

■ 3/4号機排気筒解体については，周辺の環境整備が進み，雰囲気線量が低減されていることが確認できたことから，世間一般的に行われている筒身近傍に近接しての切断工法が実施可能と判断した。

■ 筒身切断作業時の線量影響及びダスト飛散防止対策の詳細検討のため，3/4号機排気筒の筒身及びSGTS配管を穿孔して内部線量調査を実施したところ，3/4号機排気筒周辺の雰囲気線量よりも低い値であることを確認した。

＜ご相談事項＞


■ 本件実施に伴う実施計画変更について，判断フローに沿って確認したところ，**「解体工法が『排気筒近傍での切断』という既認可に準じた切断工法であり，特殊な方法及び対策ではないこと」**から，実施計画変更申請は不要と考えているが，申請要否を規制庁殿にご判断いただきたい。

※切断工法の詳細については現在検討中であることから，詳細工法が決定次第改めてご報告させていただく。

2－1．線量測定結果（3/4号機排気筒 筒身外側）

前回面談資料

- 筒身表面から水平距離7m,9mの位置で，高さ方向約10m毎に線量を測定した。
- 水平距離による線量の有意な変動がないことから，**筒身が線源の可能性は低い。**
- **上記より筒身近傍での線量は今回測定と同程度と低く，汚染度も低い**と推定される。

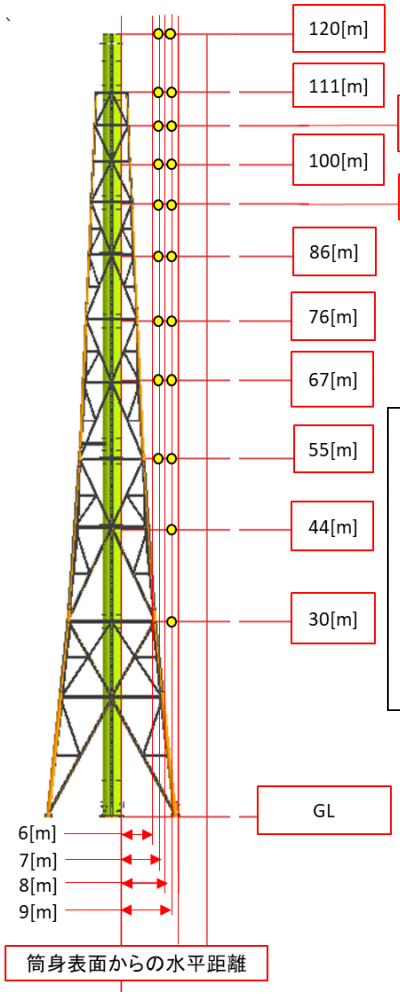


測定位置（立面）

※1/2号機排気筒線量測定：
2016年9月23～24日実施

：1/2号の値の変化率を基に算出した推定値

推定線量＝
1/2号測定実績の変化率×今回の測定値

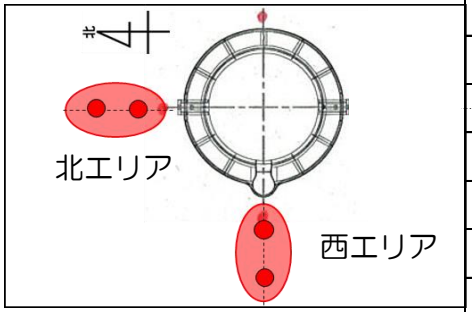

測定位置（平面）

測定高度（m）	西エリア 線量率（mSv/h） 筒身表面からの距離			北エリア 線量率（mSv/h） 筒身表面からの距離		
	7m	9m	参考：1/2号 10～11m	7m	9m	参考：1/2号 10～11m
120	0.04	0.04	0.22	0.05	0.06	0.39
111	0.05	0.05	0.23	0.06	0.07	0.44
106	0.05	0.05	0.24	0.06	0.07	0.45
100	0.05	0.05	0.25	0.07	0.08	0.53
94	0.05	0.05	0.25	0.07	0.08	0.55
86	0.05	0.05	0.26	0.09	0.10	0.64
76	0.06	0.06	0.30	0.09	0.10	0.67
67	0.07	0.07	0.30	0.10	0.11	0.68
55	0.09	0.09	0.39	0.12	0.13	0.88
44	0.09	0.11	0.40	0.12	0.16	0.87
30	0.12	0.15	0.51	0.12	0.19	0.90
平均	0.07	0.07	0.30	0.09	0.10	0.64


・線量測定日：2022年10月9日 ※測定機器：電離箱サーベイメータ（ICW）
・線量測定方法：線量測定装置を600tCCに吊って測定。
・前提条件：600tCCの性能や鉄塔の干渉により，高さ86m以上かつ筒身付近は測定不可。
・測定結果考察：
‣ 1/2号機排気筒と同様に**上部になるにつれて線量が低くなる傾向がある**。
➢ **筒身表面からの距離を変えて線量測定を実施したが結果に有意な変動がない**ことから，**排気筒の筒身が線源となっている可能性は低い**と考える。
➢ 推定値部分の測定については，今後測定する方向で計画中。

2－2．線量測定結果（3/4号機排気筒 周辺地上部）

前回面談資料

- 排気筒周辺地上部の線量は，約0.01～1.50mSv/h（15箇所）という状況である。
- 線量分布は排気筒の筒身を中心に放射状に低くなっているわけではなく，排気筒南東部に比較的線量の高い箇所が偏っていることから，**排気筒からではなく地上部からの線量影響と推定される**。

<3/4号機排気筒周辺線量測定箇所>

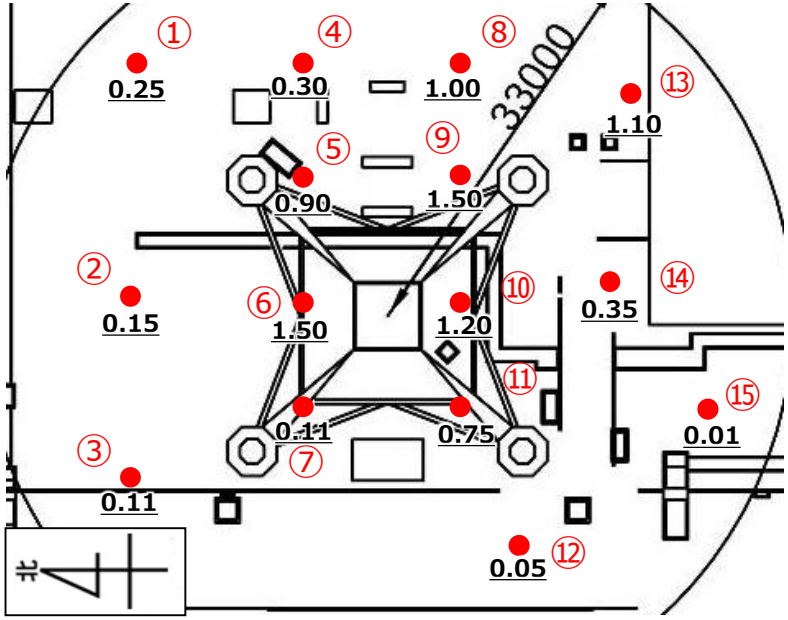

測定箇所	線量率（mSv/h）	測定箇所	線量率（mSv/h）
①	0.25	⑨	1.50
②	0.15	⑩	1.20
③	0.11	⑪	0.75
④	0.30	⑫	0.05
⑤	0.90	⑬	1.10
⑥	1.50	⑭	0.35
⑦	0.60	⑮	0.01
⑧	1.00	平均	0.65

・線量測定日：2022年10月12日


・測定器：電離箱サーベイメータ低線量用（ICWBL）

2－3．線量測定結果（3/4号機排気筒 筒身内部）

前回面談資料

■ 筒身内部の線量測定を実施したところ，約0.165～0.352mSv/h（5箇所）という結果であった。

＜線量測定結果＞

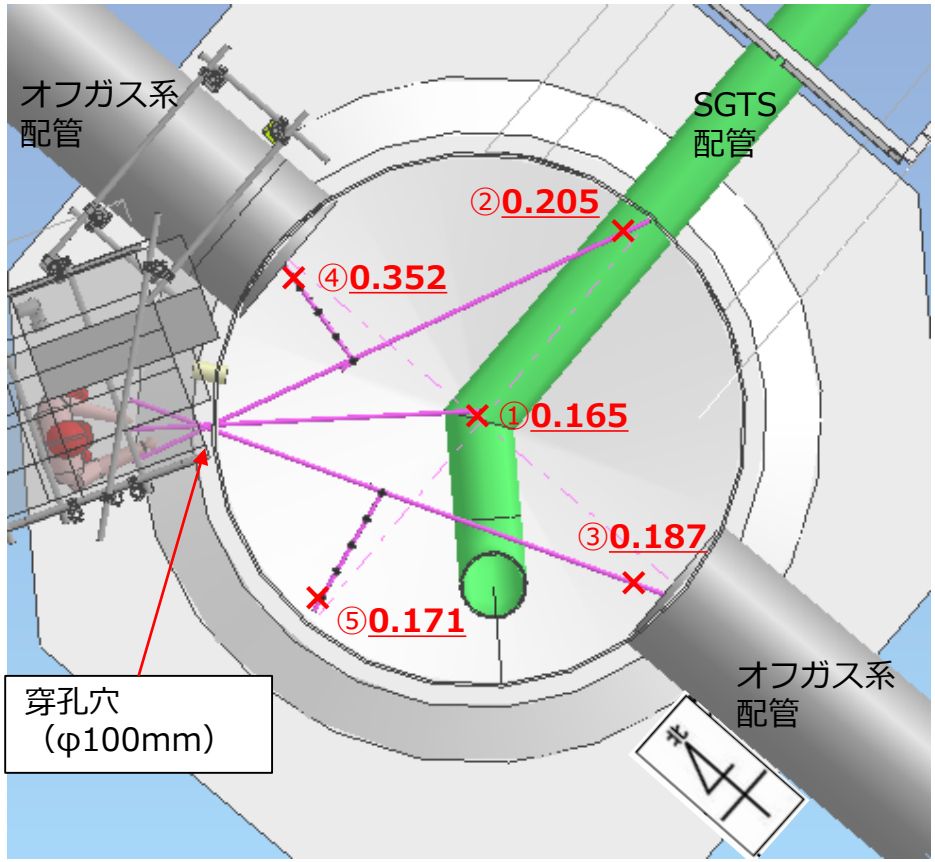

①筒身中央	0.165mSv/h
②筒身内側面から200mm	0.205mSv/h
③筒身内側面から200mm	0.187mSv/h
④筒身内側面から200mm	0.352mSv/h
⑤筒身内側面から200mm	0.171mSv/h

・線量測定日：2023年6月14日


・測定器：水中サーベイメータ（GMWS）

2－4．線量測定結果（3/4号機排気筒 筒身内部）


前回面談資料

■ SGTS配管内部の線量測定を実施したところ，約0.336～0.650mSv/h（4箇所）という結果であった。

＜線量測定結果＞

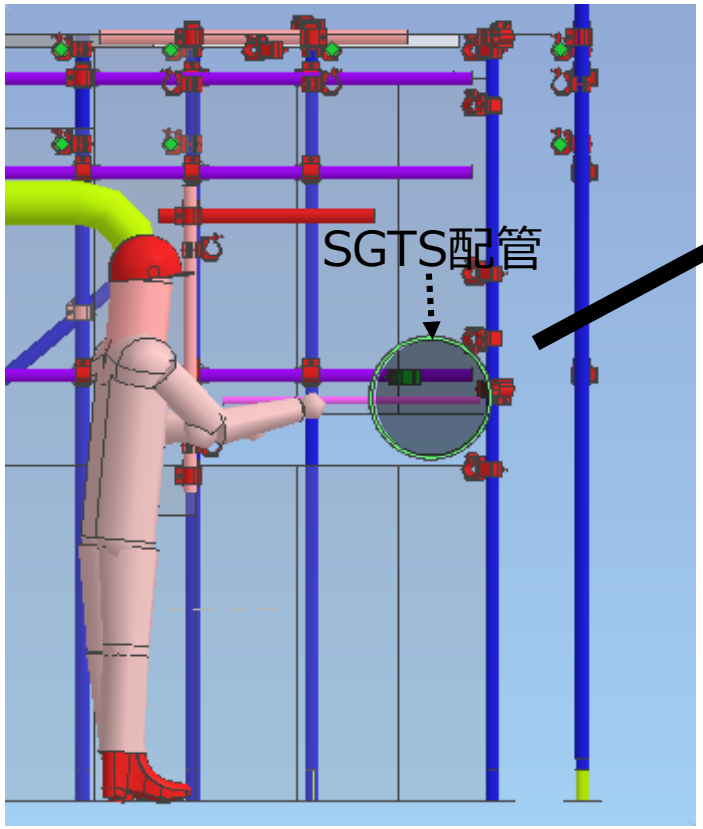

＜断面拡大図＞

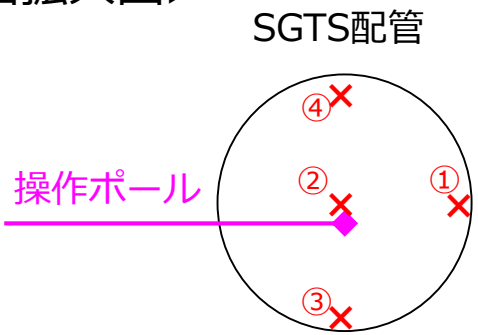

①SGTS配管内面穿孔位置正面壁面	0.425mSv/h
②SGTS配管内中央	0.425mSv/h
③SGTS配管内面下部	0.650mSv/h
④SGTS配管内面上部	0.336mSv/h

・線量測定日：2023年6月23日

・測定器：水中サーベイメータ（GMWS）

3．3/4号機排気筒解体計画の概要

前回面談資料


TEPCO

■燃料デブリ取出設備等の敷地確保のため，3/4号機排気筒の解体・撤去を行う。

■解体工事のスコープ

- 3/4号機排気筒の地上部及び内部のSGTS配管
- 3/4号機排気筒から4号T/B建屋までの間の主排気ダクト及び地上部のSGTS配管

1. 3/4号機主排気ダクト：3号機側は除却済のため、4号機側のみ
2. SGTS配管：4号機R/B－3/4号機排気筒間
3. 3/4号機排気筒：上部、下部

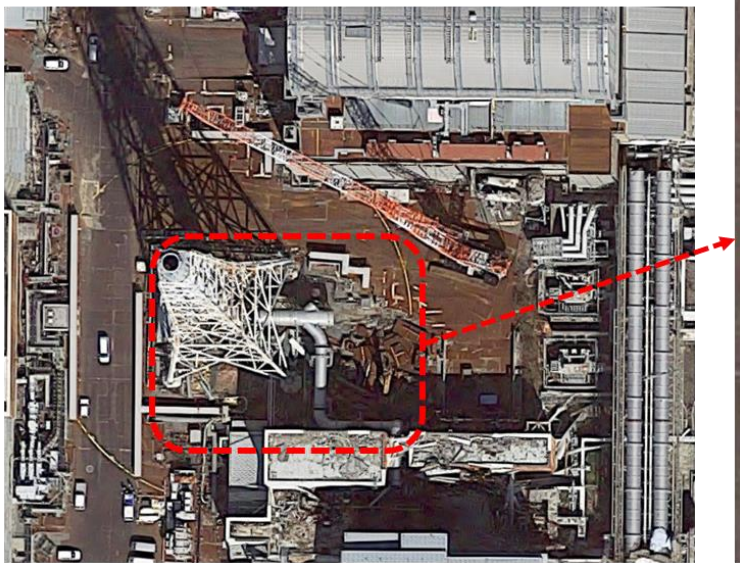

対象エリア




除却対象

4．3/4号機排気筒の構造


前回面談資料

TEPCO

- 3/4号機排気筒は1/2号機排気筒とほぼ同じ構造である。
  （ただし，3/4号機排気筒は筒身内にSGTS配管が存在）
- 筒身内部線量及び雰囲気線量は1/2号機排気筒と比較して低いため筒身近傍での切断が可能と判断。
- 排気筒高さ：GL+120.00m
- 総重量：約415t

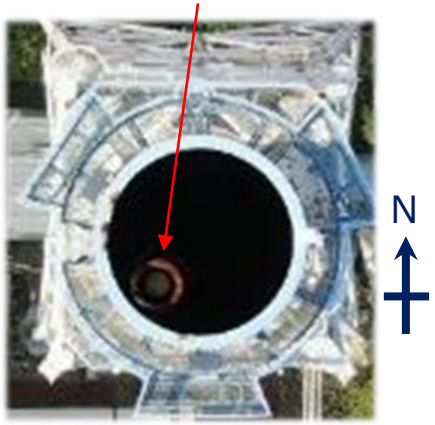

※排気筒上部から筒身内部を撮影

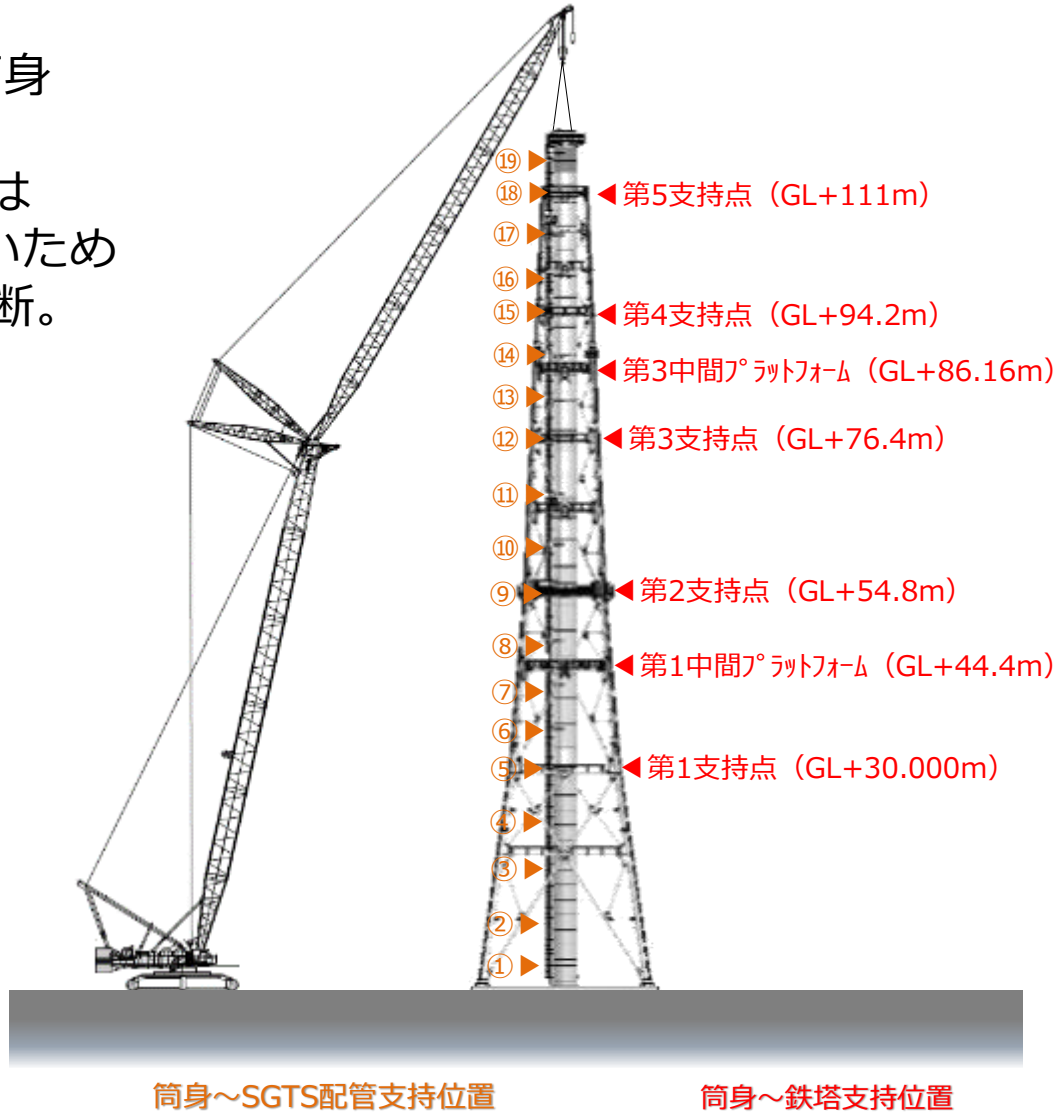

5．水素滞留の可能性について


前回面談資料

TEPCO

- 3/4号機主排気ダクト及びSGTS配管については，震災直後に3号機原子炉建屋カバー設置の干渉物として一部撤去しており，開放されている。
- 開放箇所があることから，排気筒内部及びSGTS配管内部に水素が滞留している可能性はないと考えている。

<3/4号機主排気ダクト・SGTS配管撤去箇所>



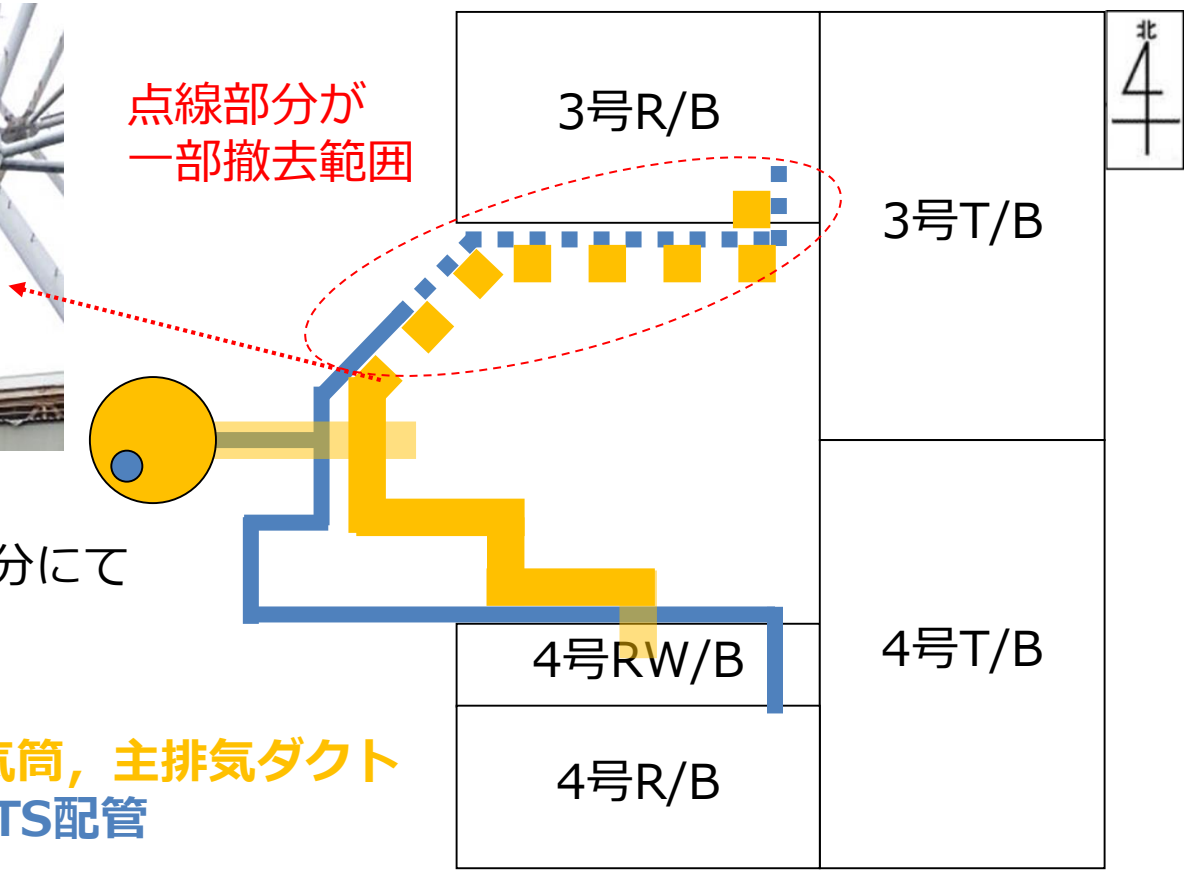

※3号機側SGTS配管は埋設部分にて切断・撤去されている。

6．切断工法（ダスト飛散対策）

前回面談資料

■ ダスト飛散防止対策

1/2号機排気筒上部解体同様，筒身内に飛散防止剤の散布，吸引装置による吸引，仮設ダストモニタによりダストの飛散状況を測定する。



飛散防止散布装置



仮設ダストモニタ

7．解体施設の実施計画変更認可申請の要否判断

前回面談資料

＜判断フロー＞

1Fにおける解体・撤去の対象とする施設等

①

実施計画上必要な機能を有する施設等に該当するか。

（廃炉や安全対策（規制基準対応）に必要な仕様及び性能を実施計画で定めているもの）

Yes → 申請必要

No

判断理由：撤去対象となる3/4号機排気筒に実施計画上必要な機能要求がないため

②

核燃料物質その他の放射性物質に汚染されている可能性のある施設等に該当するか

（1F 事故時又は事故後の汚染水処理等により著しく汚染されたもの（フォールアウト分除く。））

and

実施計画に定める以外の特殊な方法及び対策により、その施設等の解体・撤去を行うか

（前例のない特別な工法、放射性物質の拡散抑制対策、作業者の被ばく対策等を採用するものか）

Yes → 申請必要

No → 申請不要

判断理由：筒身近傍での切断による解体工法は火力発電所や鉄塔全般で採用された実績があり，既認可に準じた切断工法であることから，「特殊な方法及び対策」ではないため

8－1．既認可に準じた方法について①

前回面談資料

TEPCO

■ 3/4号機排気筒解体については，下記の通り実施計画Ⅲ章.3.1.3 添付資料-8の解体方法に準じて実施する。

項目	実施計画Ⅲ章.3.1.3 添付資料-8 （1/2号機排気筒上部解体）	今回
解体方法	・大型クレーンに吊り下げた遠隔解体装置により，頂部から順番に筒身や鉄塔をブロック単位で解体する。 ・排気筒周辺の線量が高いことから上部作業は無人化し，下部の準備作業・小割解体作業は有人作業とする。	・排気筒先端に大型クレーンでの吊り上げ用治具を設置し，設定したブロック毎に足場を設置した後，筒身近傍にて切断する。大型クレーンにて切断片を地上まで吊り下げ，地上で細断する。
解体作業における留意事項	・解体作業中に周辺の稼働設備を損傷させないよう，図面及び現場調査にて状況確認し，必要に応じて設備の防護を施す。 ・解体作業においては，火災リスクを低減するため，原則，火気を使用する装置は使用しない。また，切断時の火花は可能な限りで養生する。	・3/4号機排気筒周辺にて稼働中のサブドレン集水設備については，設備停止または設備防護処置を施すこととする。 ・筒身近傍にて切断するため，作業エリア近傍に消火器を配置することが可能であることから，消火器配置により火災発生リスク低減を図る。
放射性物質の飛散抑制策	・解体作業前に筒身内面に飛散防止剤を散布することで，筒身内面の遊離性ダストを固着する。 ・筒身切断時には切断装置(チップソー)をカバーで覆い，カバー内ダストを可能な限り吸引し，飛散量低減を図る。 ・遠隔解体装置にダストモニタを設置し，作業中の空気中放射性物質濃度を監視する。作業中，万が一遠隔解体装置に設置したダストモニタ及び構内モニタ類の異常を検知した場合は，解体対象物が安全な状態にあることを確認した後に作業を中断する。	・解体作業前に筒身内面にダスト飛散防止のため飛散防止剤を散布する。 ・切断作業近傍にダストモニタを設置し，作業中の空気中放射性物質濃度を連続的に監視する。作業中，万が一ダストモニタ及び構内モニタ類の異常を検知した場合は，解体対象物が安全な状態にあることを確認した後に作業を中断する。 ※今後詳細なダスト管理対策を検討

8－2．既認可に準じた方法について②


前回面談資料

TEPCO

項目	実施計画Ⅲ章.3.1.3 添付資料-8 （1/2号機排気筒上部解体）	今回
放射性物質の環境影響	・排気筒周辺の雰囲気線量率の調査結果から保守的に筒身の表面線量率を推定し，表面積から気中へ放出される放射性物質放出量の評価を行った。評価結果より，本作業に伴う放射性物質の放出による敷地境界での線量影響が，「特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について」で求められている敷地境界線量１mSv/年未満と比較して，十分小さな値であることを確認した。 ・また，本作業に伴う放射性物質の放出量と解体作業時間から想定した放射性物質の放出率は，敷地境界の近傍に設置されたダストモニタの警報設定値を超えない範囲であることを確認した。	・具体的な作業手順が確定していないことから，現時点で本作業に伴う放射性物質の環境影響を算出することは困難ではあるが，1/2号機に比べ雰囲気線量が低いことから，敷地境界線量1mSv/h未満及び敷地境界に設置されたダストモニタの警報設定値を超えない範囲であると考えられる。
解体部材の落下防止対策	・解体作業中の部材落下防止を図るため，遠隔解体装置には多重の把持機構を設け，把持状態はカメラにより監視する。	・解体作業中の部材落下防止を図るため，クレーンフックへの玉掛けを確実に行い，クレーンブーム先端にカメラを取付け，カメラにより玉掛け状況の監視を行う。
廃棄物の保管	・「Ⅲ章第3編2.1.1 放射性固体廃棄物等の管理」に従い，線量区分に応じて保管・管理する。	・「Ⅲ章第3編2.1.1 放射性固体廃棄物等の管理」に従い，線量区分に応じて保管・管理する。
作業者の被ばく線量管理	・放射線業務従事者が立ち入る場所では，外部放射線に係わる線量率を把握し，放射線業務従事者の立入頻度や滞在時間等を管理することで，作業時の被ばく線量が法令に定められた線量限度を超えないようにする。	・作業エリアへの関係者以外の立ち入りを禁止する。また，専任監視員を配置し，作業エリアへの立入頻度，滞在時間を管理し，作業者の線量管理を行う。（Y装備での作業を想定している）

9－1．3/4号機排気筒解体全体工程（案）

前回面談資料

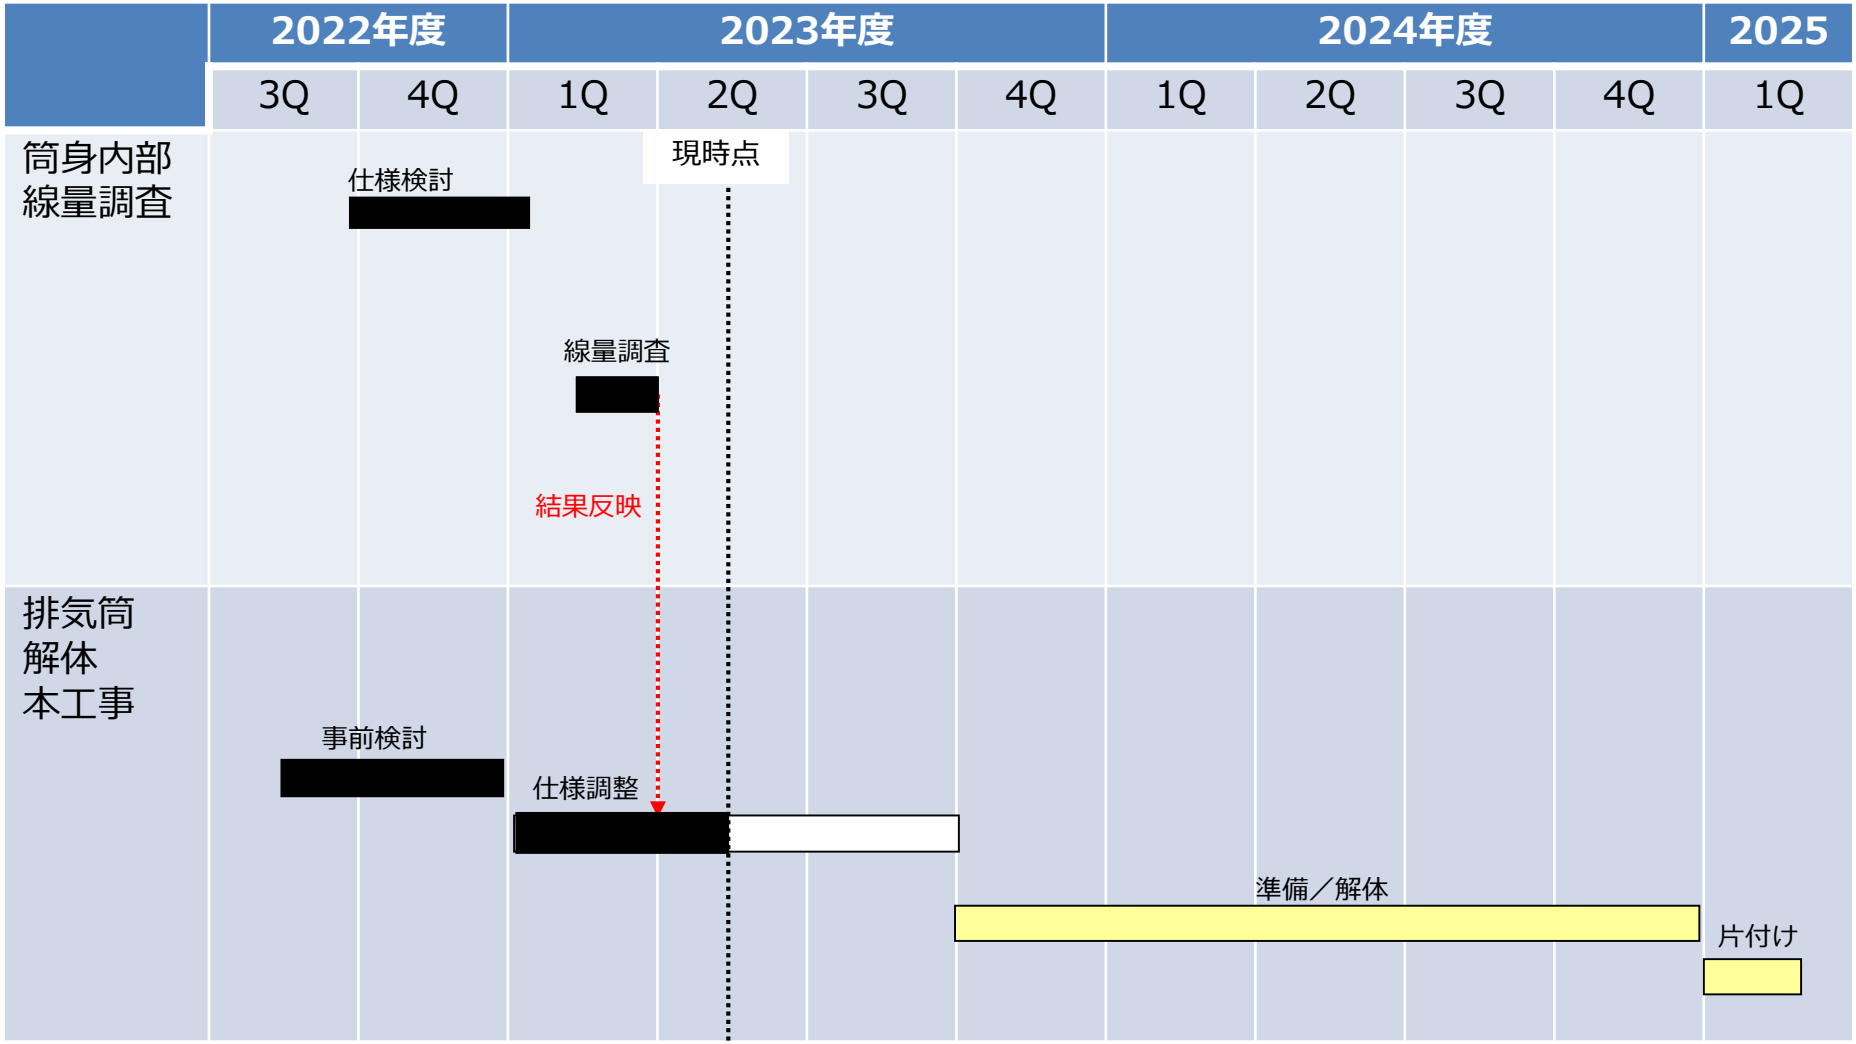

9－2．中長期計画

前回面談資料

TEPCO

燃料デブリ取り出し
－今後の主要な作業プロセス（4/4）



※2023年3月30日公表資料　廃炉中長期実行プラン2023より抜粋
